



# رئاسة الوزراء

التقرير السنوي الأول

عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي 2018-2022

لغاية 31 كانون الأول 2019

وَاللَّهُ أَكْبَرُ



# رئاسة الوزراء

التقرير السنوي الأول

عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي 2018-2022

لغاية 31 كانون الأول 2019

# المحتويات

1.....	المحتويات
2.....	المقدمة
3.....	المنهجية
4.....	متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي
4.....	1. مخطط لسير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي
5.....	2. نسب الإنجاز والحيود الكلي للبرنامج الحكومي - الفصل الرابع 2019
6.....	3. نسب الإنجاز والحيود للوزارات والجهات - الفصل الرابع 2019
7-6.....	جدول بيانات الوزارات والجهات لتنفيذ البرنامج الحكومي للفصل الرابع 2019
8.....	بيانات واحصائيات
63-9.....	الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
64.....	ملحق تفصيلي لمشاريع الوزارات

## المقدمة

تسعى الحكومة العراقية الى بناء اقتصاد سليم وتقديم أفضل الخدمات لرفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال برنامج حكومي متوازن يدعم مجموعة من القطاعات الخدمية والاقتصادية والأمنية عبر مشاريع طموحة واجراءات وانشطة من شأنها رفع العبء عن كاهل العراقيين، فبعد تكليف السيد رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي برئاسة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي على المنهاج الوزاري والتصويت على الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الأول 2018، وفقا للمادة (76 / رابعاً) من دستور العراق، أطلقت الحكومة العراقية برنامجها الحكومي في 5 شباط 2019 والذي تضمن (5) محاور بـ (1065) مشروع تعمل تحت (154) فقرة، تمثل ما حددته الوزارات من التزامات لفترة (4) سنوات قادمة، مع العرض ان العمل قد جرى خلال الفترة المنصرمة ولغاية اعداد هذا التقرير.

يعكس هذا التقرير، تنفيذ خطط ومشاريع الوزارات والجهات ضمن التزامها في البرنامج الحكومي لغاية نهاية تشرين الأول من عام 2019، حيث تم تحقيق معدل إنجاز يصل الى (73%) من مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات والجهات في البرنامج الحكومي للفصل الرابع من عمر الحكومة، مازال العمل مستمر لتحقيق كل مستهدفات البرنامج الحكومي.

يشكل هذا التقرير وثيقة مهمة لصانعي السياسات ومتخذي القرار الحكومي، تُمكنهم من الوقوف على واقع الحال، بغية دعم وتعزيز الإنجازات المتحققة والعمل على معالجة الأسباب التي اعاققت تنفيذ قسم من البرامج والمشاريع، بوضع خيارات وحلول بديلة وأخذ القرارات المناسبة التي تضمن الاستمرار في تنفيذ البرنامج الحكومي وإيفاء الحكومة بالتزاماتها امام المواطنين.

يتألف هذا التقرير من :

1. المقدمة ومنهجية العمل.
2. متابعة تنفيذ مجمل البرنامج الحكومي (حجم ما تم تنفيذه من البرنامج).
3. انجاز وحيود الوزارات والجهات مع تحديد أسباب الحيود وتحليل لبياناتها.
4. ملحق تفصيلي لمشاريع الوزارات.


## المنهجية

1. يعرض هذا التقرير السنوي الأول نسب الإنجاز التراكمية للبرنامج الحكومي، وكذلك نسب الإنجاز والحيود الفصلية (الفصل الرابع) اعتباراً من 2019/8/1 ولغاية 2019/12/31، أي لفترة (5) أشهر وذلك لتوثيق انجاز وحيود المشاريع التي تعمل عليها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. ضمن التزامها في البرنامج الحكومي لعام 2019 ولتكون فصول البرنامج الحكومي مطابقة مع فصول السنة وكذلك الموازنة العامة الاتحادية "السنوية"، كما ويقارن التقرير، نسب الإنجاز مع الفصول السابقة ويضع تحليل واستنتاج لتغير هذه النسب.
2. اعتمد تاريخ 2018/11/1، اساس ونقطة شروع لقياس التحسن أو التقدم في نسب الإنجاز للبرنامج الحكومي.
3. عملت الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ تكليف السيد رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي برئاسة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي على المنهاج الوزاري والتصويت على الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الأول 2018، وفقا للمادة (76 / رابعاً) من دستور العراق. على إعداد منهجية لكي تبني الوزارات خططها للسنوات 2018 – 2022 استناداً الى المنهاج الوزاري وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، لإعداد البرنامج الحكومي خلال (100) يوم.
4. تمت المصادقة على البرنامج الحكومي من قبل مجلس الوزراء واعلانه في 2019/2/5، حيث تم اعداد انموذج الكتروني لجمع البيانات الخاصة بمشاريع واجراءات وانشطة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ضمن التزامها بالبرنامج الحكومي، لغرض اعداد التقارير الفصلية الدورية لمتابعة عملية التنفيذ وتحديد نسب الانجاز والحيود.
5. عقدت جملة من ورشات العمل خلال الفترة المنصرمة للفريق المعني بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي في الوزارات، لإيضاح آلية العمل وطريقة إملاء الانموذج الالكتروني المذكور والتأكيد على ارسال البيانات وفق الانموذج، إضافة الى ورشة العمل التي عقدت برئاسة السيد الامين العام لمجلس الوزراء في 2019/4/24، للمدراء العاميين ومدراء التخطيط والمتابعة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولنفس الغرض.
6. تم استلام البيانات من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفقاً للأنموذج المشار اليه بعد عقد مجموعة من الاجتماعات المنفصلة والمتكررة مع الوزارات، عن طريق البريد الالكتروني وكذلك البريد الرسمي، وجرى الاتصال بالوزارات التي لم ترسل بياناتها أو تلك التي بياناتها غير مطابقة لغرض اجراء التعديلات اللازمة عليها ومن ثم ارسالها من جديد حيث جرت عملية تدقيق ومطابقة وتصنيف وتحليل للبيانات، وتحديد المهمة منها وغير الدقيقة، وقد وضع اخر موعد الاستلام للبيانات من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتاريخ 2020/1/30،

# متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي

2022-2018


1. مخطط لسير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي

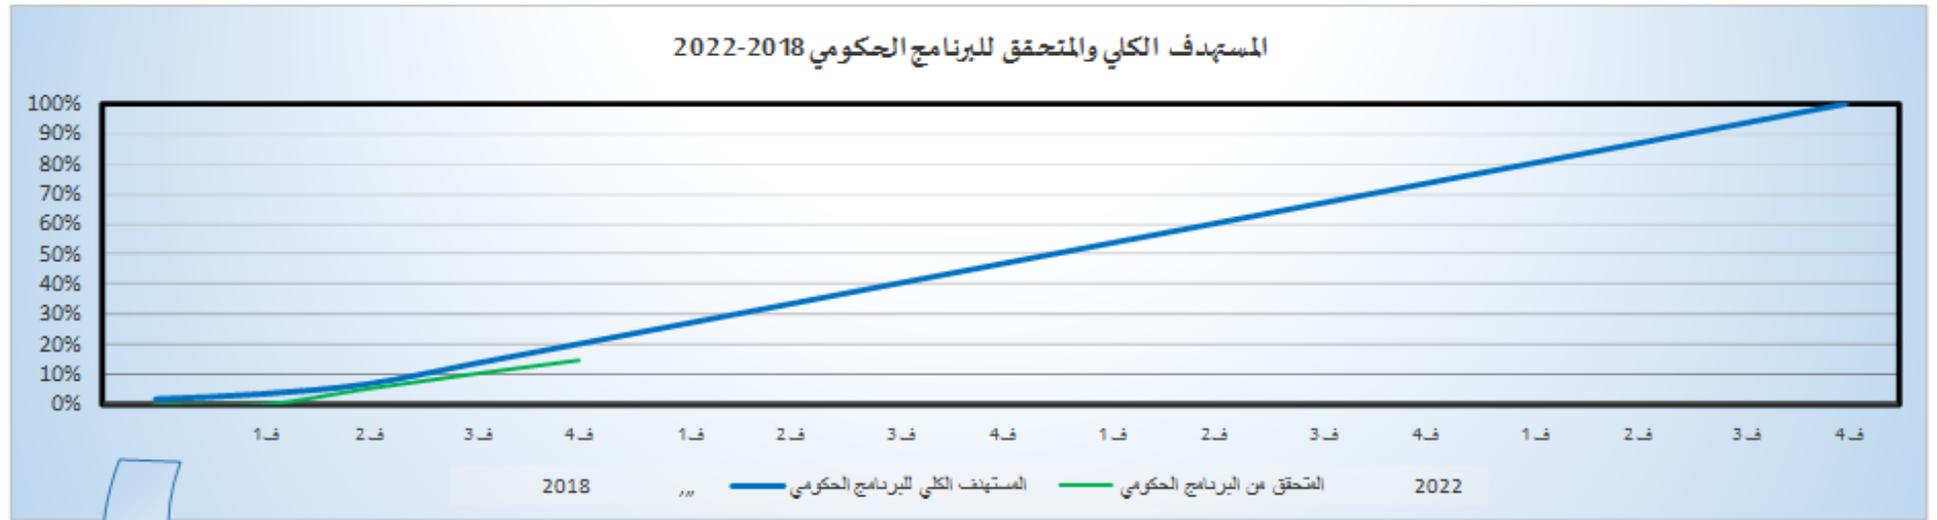


## مخطط سير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي

يوضح المخطط في أعلاه، سير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي لفترة الأربع سنوات 2022-2018 (عمر الحكومة)، أما المخطط على جهة اليسار فيمثل سير تنفيذ البرنامج الحكومي خلال فصول عام 2019، حيث يظهر وبشكل واضح الفرق في التنفيذ بين الخط الأزرق والذي يمثل مستهدف البرنامج الحكومي، والخط الأخضر والذي يمثل متحقق البرنامج الحكومي، والبالغ قيمته (16.3%) من عمر البرنامج (4 سنوات).

## 2. نسب الإنجاز والحيود الكلي للبرنامج الحكومي - الفصل الرابع 2019

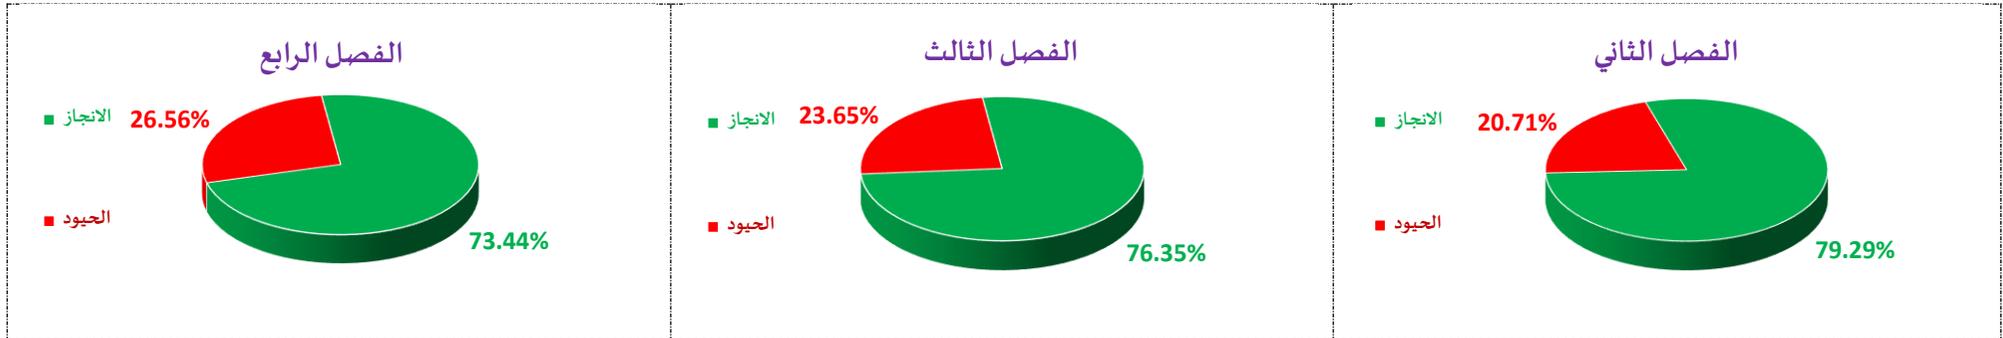

### نسبة الإنجاز الكلية للفصل الثاني و الثالث و الرابع من عام 2019

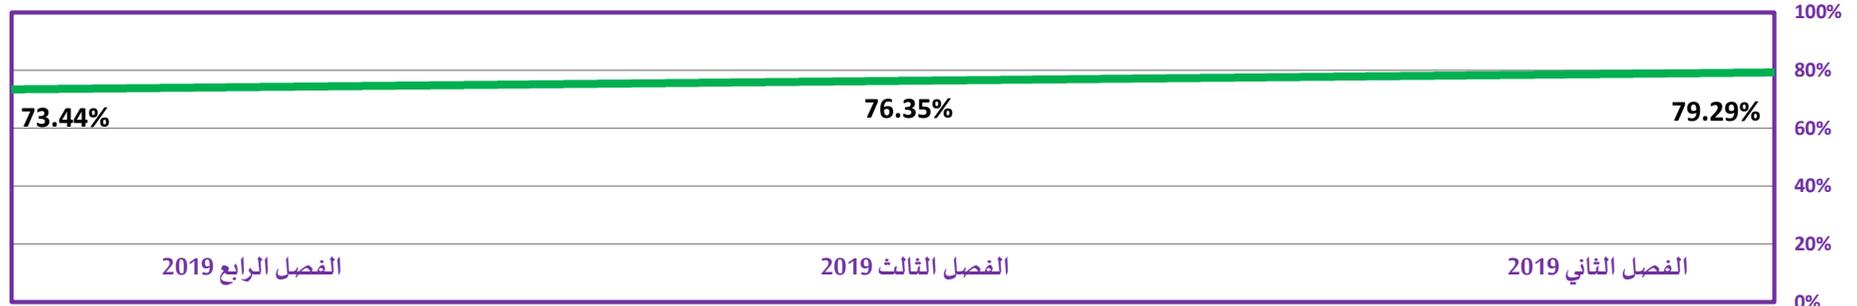

نسبة إنجاز البرنامج الحكومي للفصل الثاني من عام 2019 كانت (79.29%) وبنسبة حيود (20.71%)، ونسبة إنجاز الفصل الثالث فهي (76.35%) وبنسبة حيود (23.65%)، أما نسبة الإنجاز للفصل الرابع فهي (73.44%) وبنسبة حيود (26.56%) على مستوى الفقرات والمشاريع والاجراءات والأنشطة، والانخفاض في نسبة إنجاز الفصل الثالث عن الفصل الثاني وبمقدار (2.94%)، قد جاءت نتيجة المباشرة بالعمل في (120) مشروع من أصل (320) مشروع كانت بدون مستهدفات في الفصل الثاني وبذلك فقد دخلت المعادلة الحسابية لنسبة الإنجاز والذي أدى الى هذا الحيود، أما الانخفاض في نسبة إنجاز الفصل الرابع عن الثالث بمقدار (2.91%) وارتفاع نسبة الحيود، قد جاءت نتيجة المباشرة بالعمل في (52) مشروع من أصل (200) مشروع كانت بدون مستهدفات في الفصل الثالث وبذلك فقد دخلت المعادلة الحسابية لنسبة الإنجاز والذي أدى الى هذا الحيود والذي كان ممكن ان يكون اكبر لولا ظهور نسب إنجاز عالية جداً تجاوزت سقف (100%)، قد اظهرتها بعض الوزارات من خلال وضع مستهدفات ذات مقدار ضئيل (لا يتناسب مع إمكانيات الوزارات وقدراتها المتاحة) أو المحاولة لتخفيض بعض المستهدفات لضمان تقليل نسب الحيود في بعض المشاريع، وهذا ما حصل في الفصل الثالث أيضاً والذي يجب على الوزارات تجاوزه عند التخطيط مستقبلاً للوصول الى مستهدفات حقيقية ودقيقة تعكس القدرات والإمكانيات المتاحة للوزارات وصولاً الى برنامج حكومي متكامل وعملي.

جدول بيانات الوزارات والجهات لإنجاز وحيود البرنامج الحكومي للفصل الرابع 2019

يوضح الجدول في أعلاه، معدل نسبة إنجاز وحيود كل وزارة وجهة في البرنامج الحكومي والمحور الذي تعمل عليه الوزارة، وكذلك العدد الكلي لمشاريعها ومقدار ما انجز منها بشكل كامل خلال الفصل الثاني والثالث والرابع وما انجز مستهدفه خلال هذا الفصل وعدد المشاريع التي أصابها حيود خلال التنفيذ، وايضاً المشاريع التي لم تضع الوزارة او الجهة، مستهدف لها خلال هذا الفصل أي لا يوجد فيها أي إنجاز أو حيود وكما يلي:

إنجاز المحور الأول: يحوي المحور الأول على (31) اجراء أو نشاط تحت (12) فقرة تحت (6) أولويات، (5) إجراءات منجزة و(24) اجراء قيد الإنجاز و(2) اجراء غير منجز، ومن الجدير بالذكر ان الجهات المسؤولة عن تنفيذ إجراءات ونشاطات هذا المحور لم تقم بتحديث بيانات التنفيذ ولغاية اعداد هذا التقرير.

ت	المفردة	تعريفها
1	الكلي	هو مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي.
2	الإنجاز الكلي	مشاريع وأنشطة الوزارة في البرنامج الحكومي، والتي انجزتها بشكل كامل وبنسبة (100%) خلال عام 2019
3		مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي التي حققت المخطط لها خلال الفصل الرابع من عام 2019 بنسبة 100%
4	فيها حيود	مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي والتي حققت أقل من المخطط لها خلال الفصل الرابع من عام 2019
		مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي والتي لم تحقق مستهدفاتها خلال الفصل الرابع من عام 2019

مجاور البرنامج الحكومي:

1. المحور الأول "استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي"
2. المحور الثاني "سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي"
3. المحور الثالث "الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية"
4. المحور الرابع "تقوية الاقتصاد"
5. المحور الخامس "الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية"

بيانات الوزارات لتنفيذ البرنامج الحكومي (ف2) ولغاية نهاية كانون الأول 2019

اعداد مشاريع الوزارات						فقرات الوزارة	اعداد مشاريع محاور البرنامج الحكومي					الوزارة	ت
بدون مستهدف	فيها حيود		أنجزت مستهدفها	المنج زة	الكلي		الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس		
	متوقف	مستمرة											
1	1	1	12	0	15	6				15	المحور الأول عبارة عن مجموعة من الإجراءات داخل فقرات وهي ليس من التزام الوزارات حيث يظهر منجزه في الصفحة اللاحقة	الخارجية	1
6	9	4	0	0	19	5				19		الدفاع	2
0	1	10	13	2	26	11				26		النفط	3
19	39	6	16	11	91	12				91		الداخلية	4
1	8	1	7	0	17	11				17		الكهرباء	5
8	22	27	32	1	90	10			90			المالية	6
0	1	3	14	4	22	5	21			1		التخطيط	7
5	6	3	2	4	20	3		20				التجارة	8
0	0	5	5	0	10	3	10					التربية	9
5	9	26	38	4	82	5	82					التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا	10
1	1	0	8	0	10	2						العدل	11
5	6	8	25	12	56	9	56					الصحة والبيئة	12
2	7	3	8	1	21	4		21				العمل والشؤون الاجتماعية	13
6	3	25	16	7	57	6		55		2		الصناعة والمعادن	14
4	11	2	6	0	23	5		20	3			الزراعة	15
4	12	14	13	4	47	4	47					النقل	16
1	2	2	0	2	7	6	7					الاتصالات	17
64	47	51	47	6	215	6	215					الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	18
2	30	22	26	8	88	7	88					الشباب والرياضة	19
1	11	46	15	2	75	6				75		الموارد المائية	20
11	11	2	16	2	41	8	41					الثقافة	21
2	3	4	2	10	21	5	21					البحر والمهجرين	22
0	0	2	1	1	4	2	4					أمانة بغداد	23
0	0	1	5	2	8	3		8				البنك المركزي العراقي	24
148	240	268	326	83	1065		592	214	121	138	اعداد مشاريع البرنامج الحكومي		
27	50	11	37	13	138		تفاصيل مشاريع المحور الثاني						
2	22	58	35	4	121		تفاصيل مشاريع المحور الثالث						
25	47	60	69	13	214		تفاصيل مشاريع المحور الرابع						
94	121	139	185	53	592		تفاصيل مشاريع المحور الخامس						

## بيانات واحصائيات

يوضح الجدول (بيانات الوزارات لتنفيذ البرنامج الحكومي (ف4) ولغاية نهاية كانون الأول 2019). مجموعة من المؤشرات والبيانات والتي من خلالها نرى بوضوح سير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي خلال الفصل الرابع من عمر البرنامج ولغاية 31 كانون الأول 2019، وكما يأتي:

1.	معدل نسب انجاز البرنامج الحكومي (الفصل الرابع)	73.44%	8.	العدد الكلي لمشاريع وانشطة الوزارات	1065 مشروع
2.	معدل نسب حيود البرنامج الحكومي (الفصل الرابع)	26.56%	9.	العدد الكلي للمشاريع المنجزة بشكل كامل	83 مشروع
3.	معدل نسب الانجاز التراكمي للبرنامج الحكومي	64.42%	10.	العدد الكلي للمشاريع التي أنجزت مستهدفاتها	326 مشروع
4.	العدد الكلي لمشاريع المحور الثاني	138 مشروع	11.	العدد الكلي للمشاريع التي حصل فيها حيود	508 مشروع
5.	العدد الكلي لمشاريع المحور الثالث	121 مشروع	12.	العدد الكلي للمشاريع التي بدون مستهدفات	148 مشروع
6.	العدد الكلي لمشاريع المحور الرابع	214 مشروع	13.	أعلى عدد للمشاريع المنجزة للوزارات والجهات	12 مشروع - وزارة الصحة
7.	العدد الكلي لمشاريع المحور الخامس	592 مشروع	14.	أعلى عدد للمشاريع التي فيها حيود للوزارات والجهات	98 مشروع - وزارة الاعمار

# وزارة الخارجية

## المحور الثاني

(سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

### مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

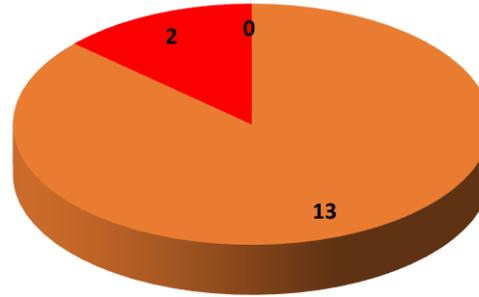


### أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (15) مشروع، (2) منها فيها حيود و(12) حققت مستهدفها، ولم تحدد الوزارة أسباب الحيود.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (1) تعزيز دور العراق كعنصر فاعل في ....



فقرة (2) المساهمة الفعلية في بناء الاقتصاد....



فقرة (3) تحسين ظروف العراقيين في الح....



فقرة (4) تسهيل منح تأشيرة دخول للأجانب....



فقرة (5) إعطاء الاولوية لعلاقتنا الاقليمية....



فقرة (6) تكثيف الجهود الرامية لإستئصال....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثاني من البرنامج الحكومي وضمن (6) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (132.54%) وليس لديها اي حيود يذكر، ولكن هذا الانجاز قد ظهر نتيجة نسب الانجاز في الفقرات (2 و 3 و 4 و 5)، أما الفقرة رقم (1) فنسبة الحيود فيها قد ظهرت نتيجة لنسبة الحيود البالغة (100%) لمشروع (اعادة فتح بعثات جديدة والبعثات التي اغلقت في السنوات السابقة بسبب نتيجة لسياسة التقشف)، بسبب تأخر فتح أي السفارة او القنصلية خلال هذا الفصل حيث ان الوزارة تعمل على استكمال الاجراءات والامور اللوجستية لإعادة فتح البعثات والقنصليات وهي كانت عازمة على فتح أكثر من بعثتين خلال الفصل الرابع (قنصليتين عامتين واحدة في تكساس الأمريكية والأخرى في تورنتو الكندية)، لتغطي مستهدفات هذا العام بشكل كامل.

حققت الوزارة نسب انجاز عالية تفوق الـ (100%) في عدد من انشطتها وذلك من خلال تنفيذ أعلى من ما هو مستهدف لها في هذا الفصل كما هو واضح في النشاط (تكثيف تبادل الزيارات واللجان المشتركة) - الفقرة (2) وكذلك النشاط (الاستمرار بالمفاوضات وتبادل الزيارات مع دول الجوار من خلال مسؤولين رفيعي المستوى) - الفقرة (5).

# وزارة الدفاع

المحور الثاني  
(سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

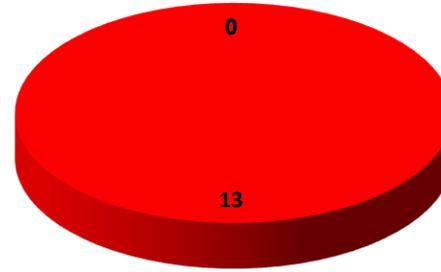

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (19) مشروع، (13) منها فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي :

1. عدم توفر أو تأخر اطلاق التخصيصات مالية من قبل وزارة المالية.

2. عدم توفر السيولة المالية للمشاريع.

3. اجراءات ادارية تتعلق بالاعتمادات المستندية للمشاريع.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (3) التكامل مع وزارة الصناعة....



فقرة (2) تكليف القيادة العليا في وزارة الد....




فقرة (1) تكثيف الجهود الرامية لاستئصال ....



فقرة (5) الاستفادة من الطاقات العظيمة....



فقرة (4) البدء بتطبيق برنامج يشجع ويحفز....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثاني من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (16.59%) ونسبة حيود (83.41%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و2 و3 و5)، مثل مشروع (توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى البلد (عتاد خفيف) اطلاقاً) و(توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى البلد (عتاد متوسط) اطلاقاً) - الفقرة (3)، وسببها عدم ورود اجابة من وزارة الصناعة على طلب وزارة الدفاع والذي تم ارساله في شباط 2019 وكذلك مشروع (اعداد دراسة شاملة للاستفادة من طاقات وامكانيات القوات المسلحة في اعمال الاعمار وخاصة في المناطق المخربة ومساعدة الاهالي في تجاوز أوضاعهم الصعبة تتمثل بإعادة البنى التحتية) - الفقرة (5)، وسببه عدم توفر مبالغ مالية للمشروع.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (6) مشاريع ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، وبالتالي مستهدفا لعام 2019 لن يتحقق، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم توفر التخصيصات المالية لهذه المشاريع مع العرض ان هذه المشاريع ذات لون ازرق.

لدى الوزارة مشروع (تأهيل وتطوير وتأسيس قاعدة الصورة الجوية بأسلوب (التصميم والتنفيذ)) - ضمن الفقرة (1) وهو باللون الازرق (مستمر وليس له تخصيصات مالية) ويعاني من عدم اطلاق التخصيصات المالية، لكن الوزارة اوجدت حلول بديلة لتنفيذه ليصبح نسبة انجازه (72%).

# وزارة النفط

المحور الثالث

(الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود



## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (26) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و(13) حققت مستهدفها و(11) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي:

1. عدم توفر السيولة المالية للمشاريع.
2. تأخر الاجراءات الادارية والتعاقدية للمشاريع.
3. الوضع الأمني لمواقع عمل بعض المشاريع.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي



## تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثالث من البرنامج الحكومي وضمن (11) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (89.8%) وبنسبة حيود (10.2%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و2 و8 و9 و

10) وكما يلي :

الفقرة (1) - مشروع (مشروع استثمار غازين عمر)، حيث قد تم دمجها ضمن مشروع (جنوب العراق المتكامل) والذي سيتم تنفيذه من قبل ائتلاف شركتي (اكسون موبيل ، بتروجينا)،

الفقرة (2) - مشروع (انشاء مستودع الناصرية)، حيث ظهر الحيود نتيجة عدم توفر السيولة المالية.

الفقرة (8) - مشروع (تأهيل مصفى البصرة (وحدة FCC))، حيث ظهر الحيود نتيجة تأخر تقديم العروض من قبل الشركات اليابانية الثلاثة، علماً أن المشروع ممول من القروض.

الفقرة (9) - مشروع (مد منظومات الغاز الى الاحياء والمجمعات السكنية)، حيث ظهر الحيود نتيجة تاخر الاعمال المدنية لشركة هانوا الكورية في مجمع بسماية.

الفقرة (10) - مشروع (تنفيذ السيارات التي تعمل على حرق الغاز)، حيث ظهر الحيود نتيجة عدم تطبيق مديرية المرور العامة لقرار مجلس الوزراء المرقم 360 لعام 2017 - الفقرة 2 منه، والخاصة باستخدام

الوقود الغازي عدم تطبيق مديرية المرور قرار مجلس الوزراء المرقم 360 لعام 2017 الفقرة 2 منه والمتضمنه بالزام اصحاب سيارات

الأجرة، إضافة منظومة الوقود الغازي.

من خلال اجراء تحليل لبيانات الوزارة، نجد ان (مشروع مصفى كربلاء) قد حقق نسبة انجاز (237%) في الفصل الماضي، ونسبة انجاز (190%) لهذا الفصل، والتي جاءت نتيجة كون المتحقق أعلى من المستهدف

وبشكل كبير وبالتالي فقد تجاوزت الوزارة سقف المستهدف لعام 2019 والبالغ (10%) لتحقيق (16.55%) وبالتالي سيتم انجاز العمل في المشروع بفترة زمنية قياسية للتنفيذ.

كذلك نجد ان الفقرة (7) تركز على إيجاد الفرص الاستثمارية لبناء مصافي جديدة وضمن قانون الاستثمار النفطي رقم 64 لسنة 2007، لذلك تعمل الوزارة على (4) مشاريع مصافي استثمارية هي (ميسان، وكركوك،

والفاو، والناصرية) حيث أوضحت الوزارة ان مهمتها تتحدد في انجاز مرحلة توقيع العقد الاستثماري والعقود الملحقه به مع المستثمر مع استمرار الاشراف على مراحل التنفيذ خارج نسب الإنجاز.

من الجدير بالذكر ان الوزارة قد انجزت خلال الفصل الثاني الفقرات (5 و6) ومشاريعها وبشكل كامل، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. تشكيل فريق هندسي استشاري - ضمن الفقرة (5).

2. تقليص المحرمات النفطية والغازية - ضمن الفقرة (6)

علماً أن الوزارة تعمل على (26) مشروع اغلها مشاريع استثمارية ومشاريع تندرج ضمن جولات التراخيص.

# وزارة الداخلية

المحور الثاني (سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود




## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (91) مشروع، (11) منها انجزت بشكل كامل و(16) حققت مستهدفها و(45) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي :

1. عدم وجود تخصيصات مالية.
2. تعرض بعض المشاريع لاضرار جراء العمليات العسكرية، وتوقف بعضها بسبب الأوضاع الأمنية في حينها.
3. القرار 347 لسنة 2015 والذي لم يتم البت به لغاية الان.
4. تخفيض تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارة من (270) مليار الى (122) مليار ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

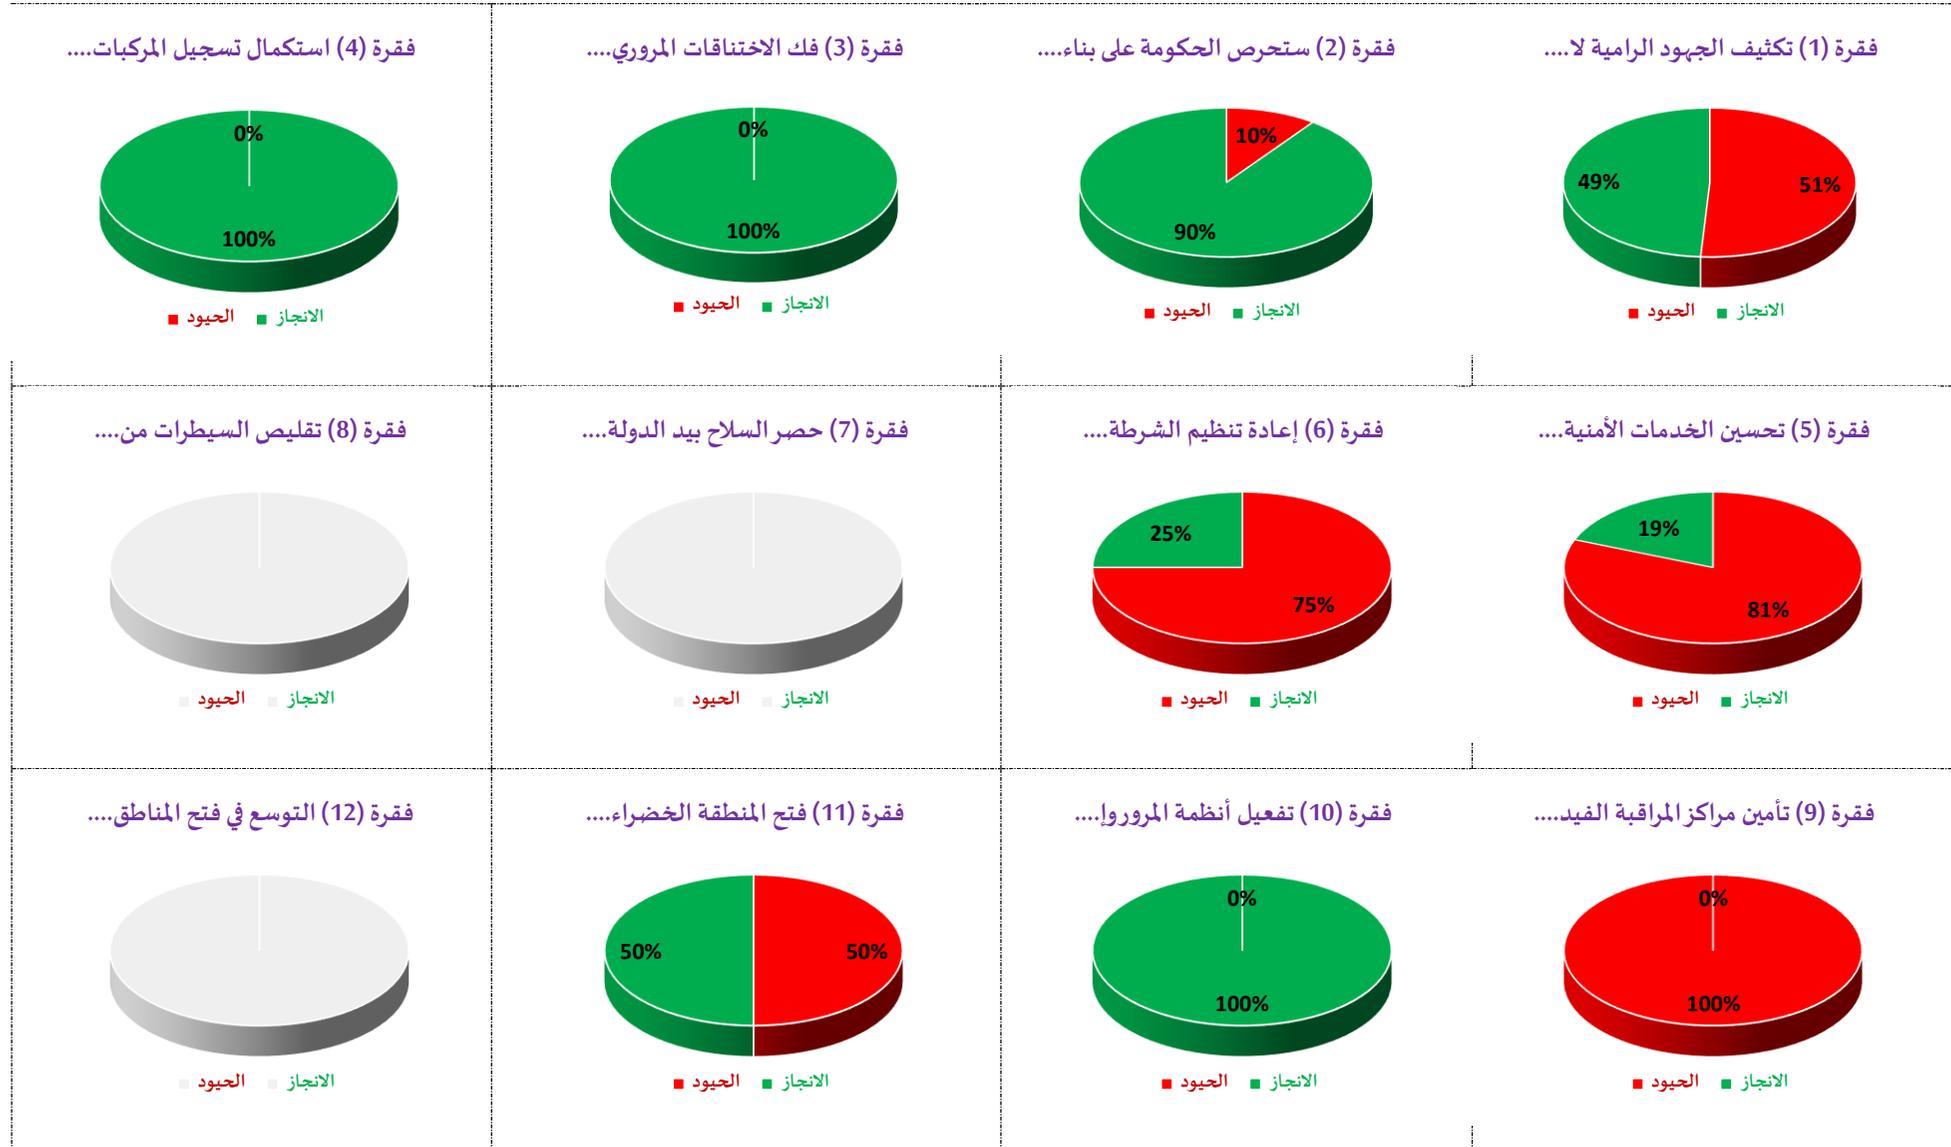

## تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثاني من البرنامج الحكومي وضمن (12) فقرة وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (38.54%) ونسبة حيود (61.46%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (9)- مشروع وضع وتنفيذ خطة لتأمين مراكز المراقبة الفيديوية بكل محافظة وربط كاميرات المحافظات بسيطرة مركزية وربطها بمقر وكالة شؤون الشرطة، وسببه عدم توفر التخصيصات المالية من قبل مجالس المحافظات، وكذلك في الفقرات (1 و5 و6 و11) وبمجموع اجمالي قدره (45) مشروع فيها حيود.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (19) مشروع ضمن الفقرات الـ (12) وعلى وجه الخصوص الفقرات (7 و8 و12)، بدون مستهدفات، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو التخفيض الذي حصل في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 وكذلك سحب العمل وقرار 347 لسنة 2015 والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفترة القادمة.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، (3) مشاريع ضمن الفقرة (2) ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. تجهيز قاعة للتدريب البدني (معهد اعداد المفوضين).
2. تجهيز مختبر انكليزي (معهد اعداد المفوضين).
3. تجهيز ميدان رمي الكتروني (معهد اعداد المفوضين).

ومن الجدير بالذكر، ان الوزارة انجزت خلال الفصل الثاني، وبشكل كامل، مشروعين ضمن الفقرة (1) ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. حفر ابار ارتوازية (الحدود)، حيث تم انجاز هذا المشروع من قبل الهيئة العامة للمياه وبفترة قياسية، وقد كان من المقرر انجاز المشروع بشكل كامل في الفصل الرابع.
2. اعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع مركز الوزارة، علماً ان هذا المشروع باللون الازرق وليس لديه تخصيصات مالية هذا العام.

كذلك انجزت الوزارة خلال الفصل الثاني الفقرات (3 و10 و11)، وكذلك مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. شراء عجلات مدرعة عدد / 350 نوع هامفي لوزارة الداخلية - ضمن الفقرة (1)،
2. شراء الاجهزة اللاسلكية ذات المواصفات العسكرية نوع هارس - ضمن الفقرة (6).

# وزارة الكهرباء

المحور الثالث

(الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

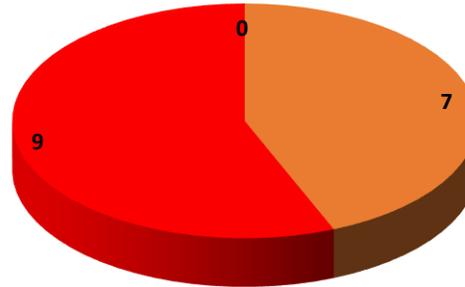


## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (17) مشروع، (7) منها حققت مستهدفها و(9) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي:

1. عدم وجود تخصيصات مالية لمشاريع وتأخر التمويل لمشاريع أخرى.

2. أسباب إدارية متعلقة بجهات أخرى كوزارة الصحة.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

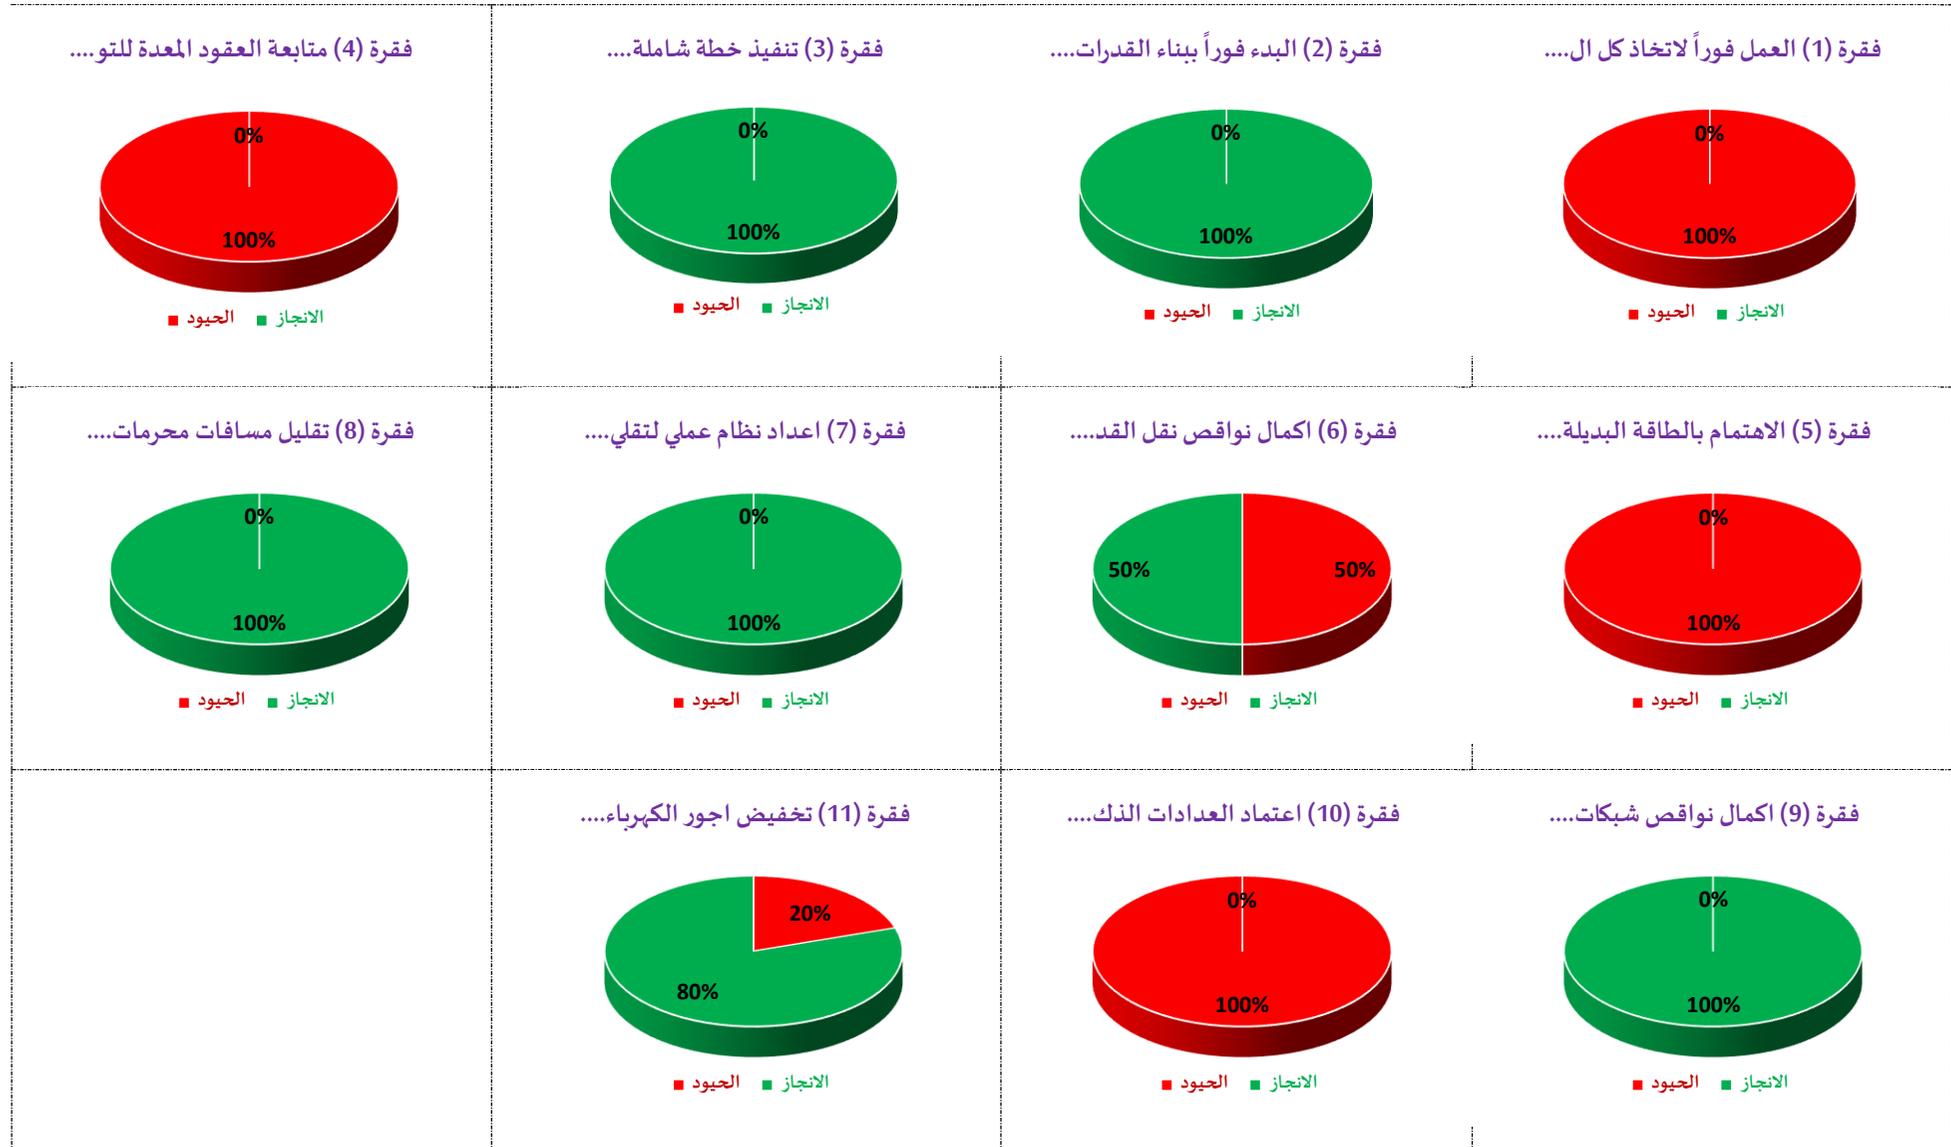

## تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثالث من البرنامج الحكومي وضمن (11) فقرة وكما هو مبين في اعلاه. ونسبة انجاز الوزارة (45.31%) ونسبة حيود (54.69%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و4 و5 و10) كون نسب الحيود فيها (100%)، وكما يلي:

الفقرة (1)- مشروع (مشروع الاستثمار الخاص في قطاع الانتاج (IPP)). حيث لم تبين الوزارة اسباب هذا الحيود وذكرت "من المؤمل ادخال الوحدات المركبة المرحلة الثانية لمحطة بسماية الاستثمارية 500 ميكاواط، في نيسان 2020.

الفقرة (4)- مشروع (مشروع اكمال مشاريع انتاج الوزارة المتوقفة والمقترحة حسب خطة الوزارة (تتضمن وحدات بخارية وغازية))، بسبب تأخر التمويل، وقد ذكرت "من المؤمل دخول وحدتين من محطتي (السماوة المركبة، وذي قار المركبة) نهاية السنة الحالية"، ولم تذكر الوزارة نسب الانجاز والتقدم لهاتين الوحدتين. هذا فيما اذا كان لها علاقة بالمشروع المذكور انفاً اصلاً، علماً ان مقدار المتحقق لهذا المشروع هو (0) للفصل الحالي وكذلك للفصول السابقة.

الفقرة (5) - مشروع (مشروع تنصيب وحدات الطاقة الشمسية في ابنية الوزارة)، ولم تبين الوزارة اسباب هذا الحيود.

الفقرة (10) - المشاريع (مشروع اعتماد العدادات الذكية من خلال خارطة طريق (Simenes) على الامد الطويل) و(مشروع عقود الخدمة والجباية) و(مشروع تجهيز عدادات ذكية من شركة (LSIS)). ولم تبين الوزارة اسباب هذا الحيود علماً بأن خارطة الطريق لم يتم توقيعها لغاية الان.

وكذلك في الفقرات (6 و11) والتي فيها نسب حيود مختلفة حيث لم توضح الوزارة اسباب هذا الحيود ايضاً.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان مشروع (الطاقات المتجددة) ضمن الفقرة (5) قد اكمل اجراءات المناقصة وتخصيص الاراضي وحصل على الموافقات وقد تم تمديد غلق المناقصة لإعلانه كفرصة استثمارية بـ (755) ميكاواط، بناءً على طلب الشركات المؤهلة لغرض استكمال متطلبات العروض التنافسية.

# وزارة المالية

المحور الرابع (تقوية الاقتصاد)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

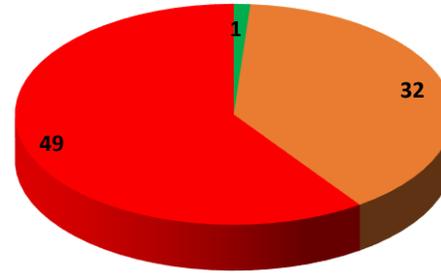


## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (90) مشروع، (1) منها انجزت بشكل كامل و(32) حققت مستهدفها و(49) فيها حيود، حيث ان أسباب الحيود هي:

1. إجراءات إدارية متعلقة بالوزارة نفسها.
2. إجراءات مالية متعلقة بالصرف.
3. إجراءات تعاقدية متعلقة بالمشاريع.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

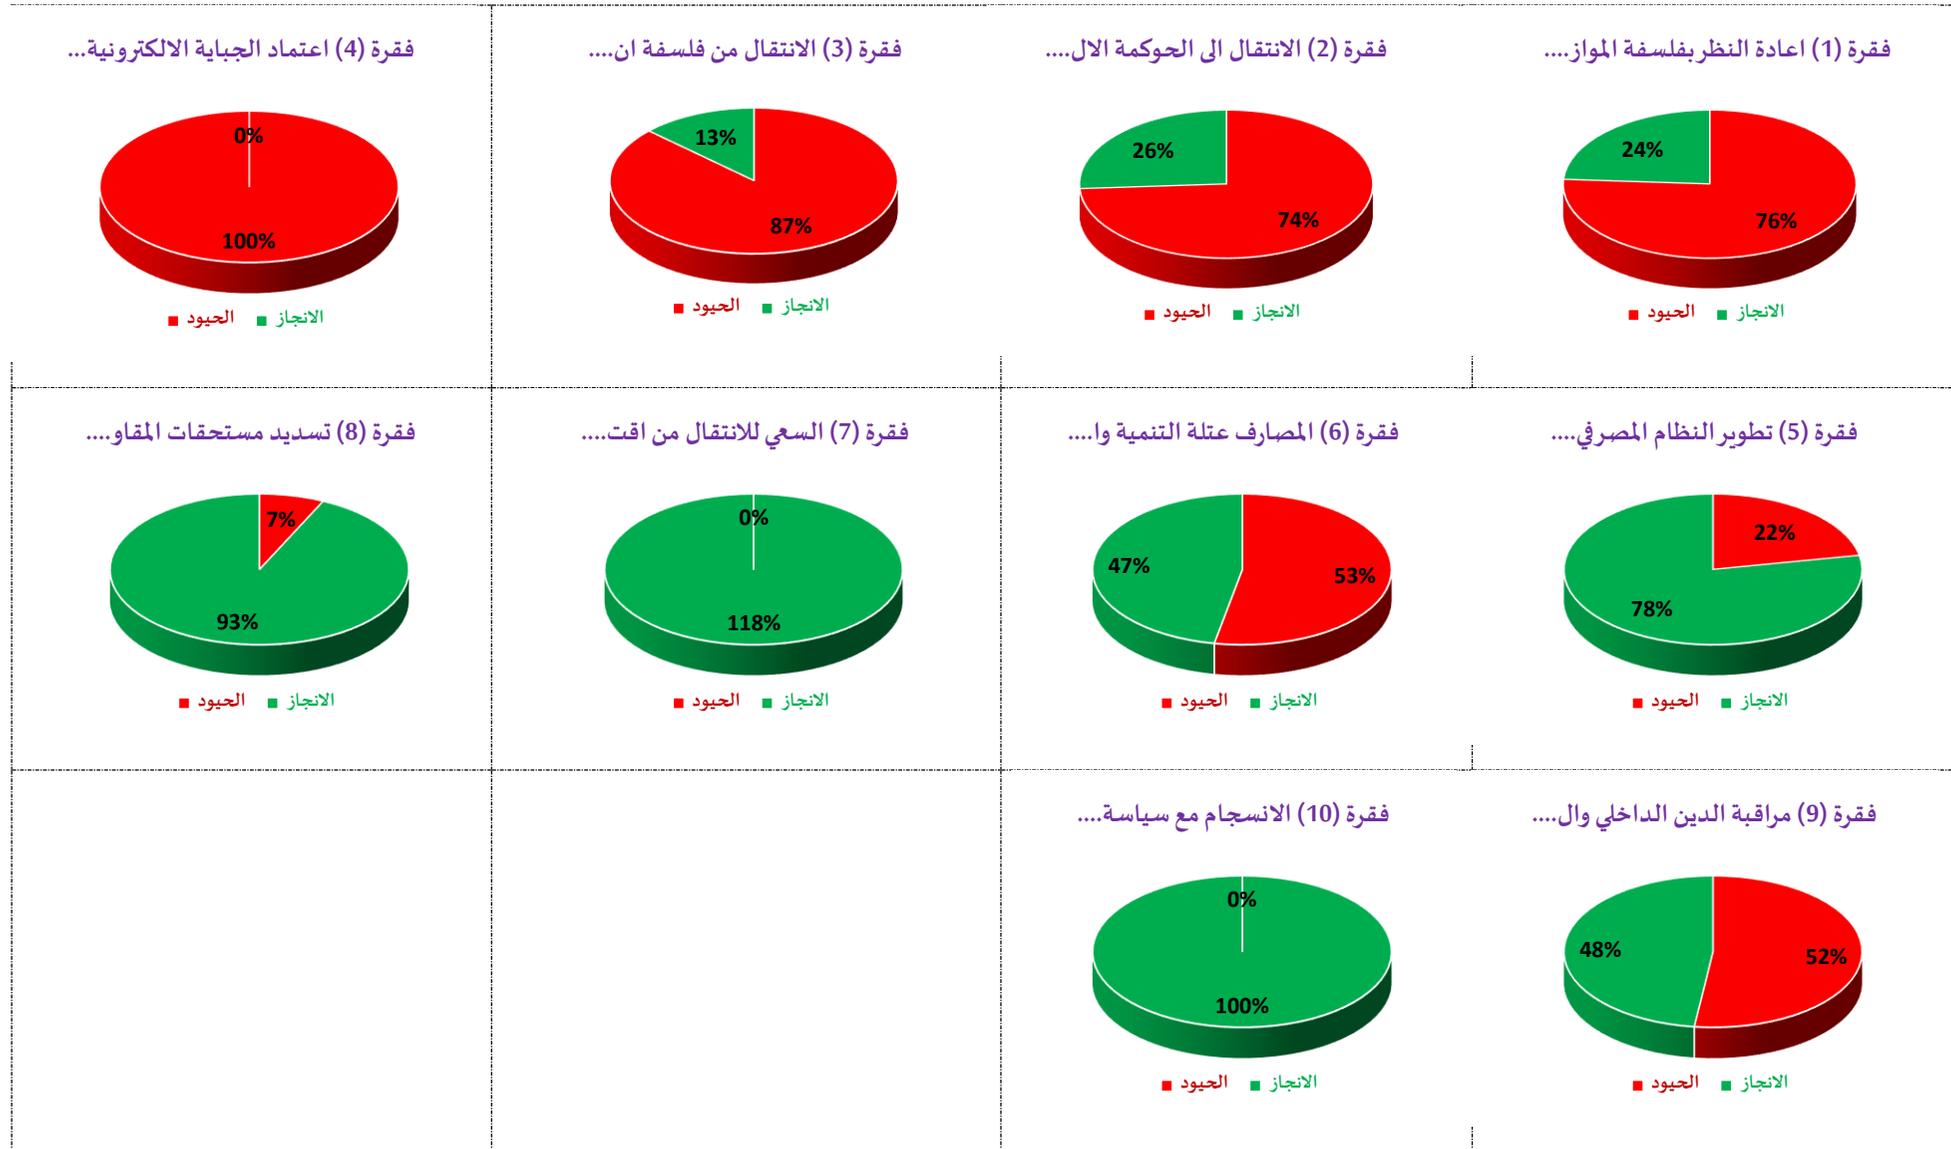

## تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع من البرنامج الحكومي وضمن (10) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (92.32%) ونسبة حيود (7.68%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و2 و3 و4

و5 و6 و8 و9)، ولأسباب مختلفة لم توضحها الوزارة مثل مشروع (النظام الضريبي الالكتروني الشامل) - ضمن الفقرة (4) والذي نسبة انجازه (0%)، وكذلك مشروع (توسيع شبكة المصرف من خلال فتح فروع

ومكاتب في بغداد والمحافظات) - ضمن الفقرة (6) والذي نسبة انجازه (0%) ايضاً علماً ان نسبة انجاز المشروع في الفصل الثاني كانت (100%).

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (8) مشاريع ضمن فقراتها، ليس لديها مستهدفات، ومستهدفاتها سوف تتحقق مستقبلاً.

بلغت مشاريع الوزارة التي معدل انجازها (100%) لهذا الفصل (32) مشروع. مثل مشروع (التسهيلات المصرفية القطاع الخاص) - ضمن الفقرة (5)، وكذلك مشروع (قروض مشروع بسماية) - ضمن الفقرة

(5) حيث يتم منح القروض من خلال (7) فروع محددة، ومشروع (القروض التشغيلية لاصحاب الفنادق) - ضمن الفقرة (5)، بعد ان كان إنجازه (0%) في الفصول السابقة، ومشروع (توزيع اراضي سكنية

للمواطنين) - ضمن الفقرة (10) وفي عدد من المحافظات،

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة قد انجزت خلال الفصل الثاني، وبشكل كامل، مشروع (اعداد السياسات والخطة الاستراتيجية للمصرف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حسب متطلبات البنك المركزي العراقي بموجب

العقد المبرم مع شركة القواسمي وشركاه (KPMG)) - الفقرة (6) ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي،

# وزارة التخطيط

المحور الخامس (الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية)  
المحور الثاني (سيادة النظام والقانون وتعزيز الامن الداخلي والخارجي)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

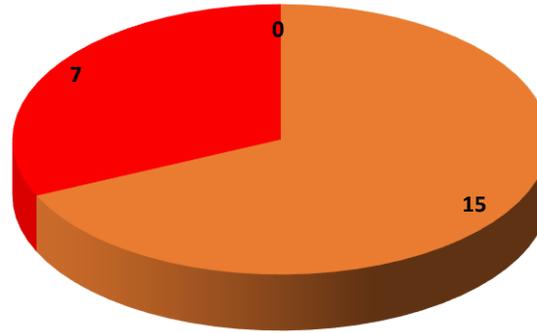

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (22) مشروع، (4) منها انجزت بشكل كامل و(14) حققت مستهدفها و(4) فيها حيود . ولم تبين الوزارة اسباب الحيود حتى بعد الاتصال بها.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (3) حسم موضوع الاف المشاريع ....



فقرة (2) التكامل مع وزارة المالية في تحقيق....



فقرة (1) إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية...



فقرة (5) وضع معايير، و/أو تفعيل قوانين....



فقرة (4) إعادة النظر بشروط احالة المقاولات....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس والثاني من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (85.71%) وبنسبة حيود (14.29%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (3) - مشروع (فحص وتقييم المشاريع التي تزيد كلفتها عن 12 مليار) بنسبة حيود (100%)، لأسباب إدارية، وكذلك في الفقرة (2) مشروع (مشروع ادارة الاستثمارات العامة والمشتريات العامة على المستوى الاتحادي / قرض البنك الدولي) بنسبة حيود (98%)، وذلك لتوقف التعاقدات.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان الوزارة ليس لديها أي مشروع بدون مستهدفات خلال هذا الفصل حيث انجزت مستهدفات مشاريعها وانشطتها للفترتين (4 و5).

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، الفقرة (1)، و(3) مشاريع من الفقرة (2) ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وهي:

1. مشروع (متابعة تشريع قانون التخطيط العمراني وتحديث قانون البلديات والاشغال العامة). 2. مشروع (تحديد أراضي خارج التصميم الأساس لمراكز المحافظات لتكون مدن جديدة مع وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة لغرض توزيعها كأراضي سكنية للمواطنين).
3. مشروع (مسح الفتوة والشباب).

# وزارة التجارة

المحور الرابع  
(تقوية الاقتصاد)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

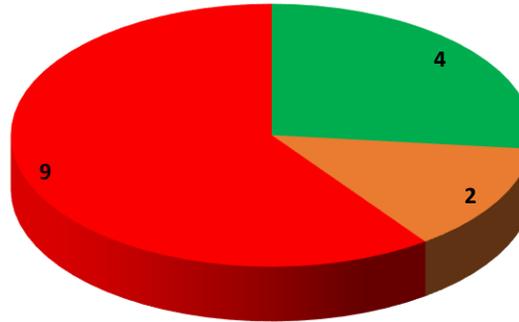

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (20) مشروع، (4) منها انجزت بشكل كامل و (2) حققت مستهدفها و(9) فيها حيود، حيث ان سبب الحيود الرئيسي هو عدم أو تأخر صرف التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة، وكذلك القرار (347)

لسنة 2015.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (3) فتح نافذة الكترونية تخاطب....



فقرة (2) تسهيل اجراءات منح إجازات....



فقرة (1) دراسة وضع البطاقة التموينية....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع من البرنامج الحكومي وضمن (3) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (76.84%) بحيود مقداره (23.16%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في اغلب مشاريع الفقرة (1) مثل مشروع (الاعمال الانشائية لمجرشتي الكوفة والشامية) و(انشاء بناية الرقابة التجارية والمالية في المثنى) و(انشاء مجمع مخزني في ديالى)، ونسبة حيود (100%)، لأسباب تتعلق بوزارة المالية.

بالرغم من قلة التخصيصات المالية للوزارة وتأخر اطلاقها، الا انها أوجدت طرق اخرى لتحقيق نسب انجاز مرتفعة كما في مشروع (اعتماد الارشفة الالكترونية) - الفقرة (2) مع العرض انها حققت نسبة انجاز (100%) من خلال استعانها باجهزة ارشفة من دائرتها الادارية والمالية لانجاز المستهدف وتقليل الحيود على الرغم من كون هذه الاجهزة غير كافية وعملية الارشفة تتطلب اجهزة ارشفة حديثة وسريعة مع كادر مؤهل، وقد استلمت الوزارة اجهزة الارشفة الالكترونية المتعاقد عليها والعمل مستمر في ارشفة الشركات المسجلة، حيث تعاقدت مع احدى الشركات لتحديث النظام.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان عدد من مشاريعها ليس لها مستهدفات مثل مشروع (انشاء مجمع مخزني في الديوانية) ومشروع (الطاقة الخزنوية الاضافية) ومشروع (انشاء سابلو كونكريتي في محافظة واسط) ضمن الفقرة (1) وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم تحويل التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية الى حساب الوزارة وكذلك القرار (347) لسنة 2015 وايضاً موافقة الجهة المانحة للقرض.

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة قد انجزت خلال الفصل الثالث، وبشكل كامل مشروع (تفعيل عمل نقطة تجارة الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص) ضمن الفقرة (3)، بالرغم من عدم اطلاق التخصيصات المالية لهذا المشروع حيث اوجدت الوزارة حلاً بديلاً لتنفيذه من خلال التنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ودائرة تطوير القطاع الخاص لاعداد تصميم الموقع الالكتروني حيث تم اكمال التصميم من قبل الشركة المصممة للموقع وتمت المباشرة بالعمل به.

وكذلك انجزت خلال الفصل الثاني، وبشكل كامل، مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. دراسة عن وضع البطاقة التموينية (مفرداتها والشرائح الاساسية المستفيدة منها)- ضمن الفقرة (1).

2. المنظومة الكترونية لاصدار اجازات وهويات الاستيراد تربط بكل الاقسام (الرقابة، التدقيق المالي، الحاسبة)- ضمن الفقرة (3).

# وزارة التربية

المحور الخامس (الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

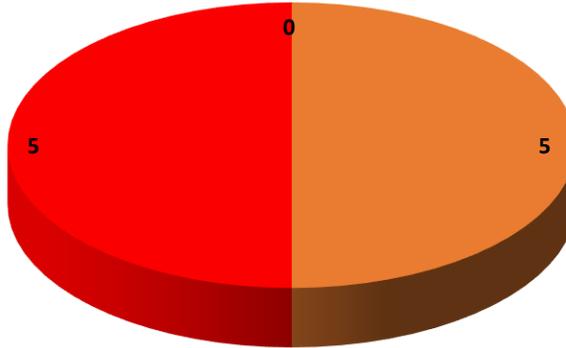


## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (10) مشاريع، (5) منها فيها حيود و(5) حققت مستهدفها، حيث ان هذا الحيود سببه عدم توفر أو صرف التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (3) تستمر الوزارة بإنجاز المدارس....



فقرة (2) القيام بدورات التطوير ضمن مفهوه..



فقرة (1) الاستمرار بتطوير المناهج بما يسهم في....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (3) فقرات وكما هو مبين في اعلاه. ونسبة انجاز الوزارة (99.93%) وحيود اجمالي بلغ (0.07%). وعلى الرغم من نسبة الانجاز العالية لكن هنالك نسبة

حيود في بعض المشاريع. وكما يلي:

الفقرة (1) - مشروع (ادخال الحوسبة في الصفوف الدراسية لعدد (5000) مدرسة). ونسبة حيود (20%). بسبب عدم توفر التخصيص المالي .

الفقرة (3)- مشروع (مشروع الوزارة رقم (1) المشروع باكمال 1626 بنائة) بنسبة حيود (48%). جاءت نتيجة عدم صرف المستحقات المالية. علماً انه قد تم انجاز (19) مدرسة.

مشروع (القرض الكويتي) بنسبة حيود (48%). والوزارة بصدد تخفيض عدد المدارس المستهدفة من (73) مدرسة الى (60) مدرسة بسبب تخفيض قيمة القرض من (100) مليون دولار الى (80) مليون دولار.

# وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا

المحور الخامس (الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها


■ فيها حيود

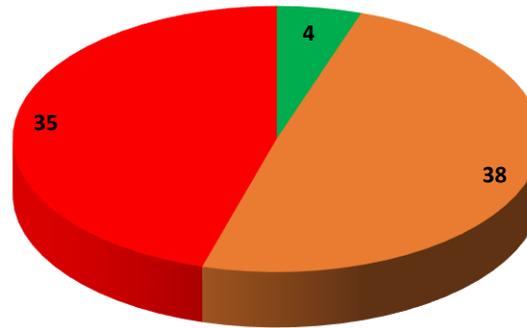


## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (82) مشروع، (4) منها انجز بشكل كامل و(38) حققت مستهدفها و(35) فيها حيود، حيث ان السبب الرئيسي للحيود هذا هو عدم ورود أو تأخر التمويل المالي لمشاريع الوزارة وكذلك نسب الانجاز المتقدمة في الفصل الماضي.


فقرة (1) دخول الجامعات في التصنيفات....



فقرة (2) اعتماد توأمة حقيقية للجامعات....




فقرة (3) خطط لخفض الترهل واشاعة....



فقرة (4) التشجيع على تأسيس الجامعات الاهل..



فقرة (5) تشجيع الاستثمار في الكليات....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (81.6%) بحيود مقداره (18.4%)، والذي يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و2 و3 و4 و5) لأسباب متعددة مثل مشروع (برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم العالي اللبنانية) بنسبة حيود (47%)، و(برنامج الزمالات الروسية والصينية) بنسبة حيود (80%)، ضمن الفقرة (2)، لأسباب تتعلق بالجانب اللبناني والصيني حيث لم تصل موافقة الجانبين الى الوزارة.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان عدد المشاريع التي ليس لديها مستهدفات، تبلغ (5) مشاريع مثل (تفعيل الاتفاقية مع منظمة DAAD) و(اتفاقية الاطار الاستراتيجي الأمريكي) و(مشروع اتفاقية بين العراق والبرازيل) ضمن الفقرة (2)، علماً ان عدد المشاريع بدون المستهدفات خلال الفصل الماضي كان (3) مشاريع حيث ان هنالك مشاريع كانت بدون مستهدفات خلال الفصل الثاني وتمت المباشرة بها مثل مشروع (توأمة الدراسات العليا) ضمن الفقرة (2) قد تم مباشرة العمل به وحقق نسبة انجاز (100%) كون الوزارة لم تضع له أي مستهدف سابقاً.

لدى الوزارة الكثير من المشاريع التي نسبة الحيود فيه كانت بسبب التخصيصات المالية ولكن هنالك (3) مشاريع سبب الحيود فيها هو (عدم ورود التمويل)، وبعد الاتصال بالوزارات (التخطيط، المالية، التعليم العالي) من قبل الموظف المسؤول عن الوزارة لمعرفة السبب الحقيقي وتحديد الجهة المسؤولة عن الحيود، تبين ضعف التنسيق بين التعليم العالي من جهة والتخطيط والمالية من جهة اخرى حيث لم ترسل التعليم العالي خطة المشاريع الاستثمارية التكميلية لل (120) مليار دينار (أضيفت من قبل مجلس النواب) الى التخطيط وتأخرت بارسال خطة المشاريع الاستثمارية الأساسية علماً ان الأخيرة قد خصصت (115) مليار دينار تقريباً لكنها تأخرت في اقرار الخطة.

أنجزت الوزارة خلال الفصل الثالث، وبشكل كامل، مشروع (تعديل ضوابط اصدار المجلات) ومشروع (مشروع التعديل الثالث لتعليمات صندوق التعليم العالي) ضمن الفقرة رقم (3) حيث نجحت في تمويل (92) مشروعاً فرعياً بكلفة (52) مليار من الصندوق باعتباره مصدراً بديلاً عن التمويل المركزي، وكذلك أنجزت خلال الفصل الثاني مشروع (تعظيم الموارد المالية في التعليم العالي) ضمن الفقرة رقم (5) المحددة بالسرعة ضمن المنهج الوزاري.

# وزارة العدل

## المحور الثاني

(سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

### مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

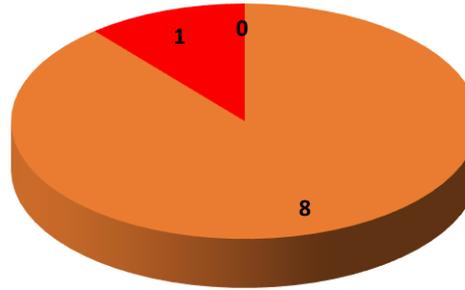

### أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (10) مشاريع، (8) منها حققت مستهدفها و(1) فيه حيود، حيث ان السبب الرئيسي للحيود هذا هو عدم تمويل مشاريع الوزارة من قبل وزارة المالية وكذلك الوضع الأمني في المحافظات التي يعمل فيها المشروع.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (2) اصلاح نظام السجون العراقية ...



فقرة (1) ربط جميع دوائر التسجيل العقاري ...



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثاني من البرنامج الحكومي وضمن (2) فقرة وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (89.61%) وبنسبة حيود (10.39%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (1)- مشروع (انشاء مجتمعات عدلية ذات مواصفات عالية يمكن من خلالها تطبيق مكننة دوائر التسجيل العقاري)، وبنسبة حيود (100%)، بسبب عدم تمويل المشروع من قبل وزارة المالية وكذلك الوضع الأمني في المحافظات التي يعمل فيها المشروع.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل مستهدفاتها للفقرة (2)، وبشكل كامل وبمعدل انجاز (100%) من مشاريع وانشطة، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، بإستثناء مشروع واحد حيث تم انجاز مستهدفه لعام 2019 في الفصل الثاني.

ومن الجدير بالذكر ان لدى الوزارة (10) مشاريع ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، مشروع واحد ضمن الفقرة (1) و(9) مشاريع ضمن الفقرة (2)، وهذا يوضح نسبة الانجاز العالية للوزارة.

# وزارة الصحة والبيئة

المحور الخامس (الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

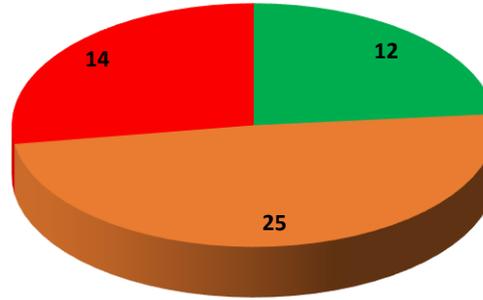

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (56) مشروع، (12) منها انجزت بشكل كامل و(25) حققت مستهدفها و(14) فيه حيود. حيث ظهرت هذه النسبة نتيجة عدم التزام الشركات المنفذة للمشاريع بجداول تقدم العمل والاندثارات الحاصلة فيها وتلك الوزارة في بعض الاحيان.

فقرة (1) المباشرة فوراً بتقييم الوضع الصحي....



فقرة (2) تعزيز النظام الصحي العراقي عن....




فقرة (3) الاسراع بتقييم الوضع الصحي....




فقرة (4) تعزيز قدرات وزارة الصحة والقطاع....




فقرة (5) اعتماد انظمة واساليب وضوابط....



فقرة (6) المباشرة فوراً لاكمال بناء وتجه....




فقرة (7) العمل مع كل القطاعات الحكومية....



فقرة (8) العمل بتنسيق متكامل مع وزارة....



فقرة (9) استخدام وحدات المعالجة البايو....



## تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (9) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (81.07%) وبنسبة حيود (18.93%) وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (6) - مشروع (انشاء مستشفى عام سعة (400) سرير في محافظة ميسان) وبنسبة حيود (80%)، وسببه عدم التزام الشركة المنفذة للمشروع بجدول تقدم العمل وكذلك الاندثارات الحاصلة في المشروع ومشاكل مالية أخرى بالرغم من كونه مشروع باللون الاخضر (مستمروله تخصيصات مالية)، وكذلك مشروع (وضع خطة شاملة لتطوير الخدمات الطارئة المقدمة في المؤسسات الصحية) ضمن الفقرة (7) وبنسبة حيود (40%) ولم تبين الوزارة اسباب هذا الحيود.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان للوزارة (5) مشاريع بدون مستهدفات حيث سيتم تحقيق المستهدفات في الفصول اللاحقة مثل مشروع (مرحلة الاشراف على انشاء مستشفى الشرطة العام) - الفقرة (6) (بسبب عدم المباشرة بتنفيذ المستشفى لحد الآن).

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروعين هما مشروع (تطبيق مشروع الحوكمة الالكترونية الشامل لجميع الانظمة الادارة الالكترونية في دوائر مقر الوزارة والمحافظات) - ضمن الفقرة (4) ومشروع (اعداد خطة تاهيل المؤسسات الصحية لعموم العراق (عدا اقليم كردستان) خلال مدة سنة بالتنسيق مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات) - ضمن الفقرة (6).

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة قد انجزت خلال الفصل الماضي، وبشكل كامل، الفقرة (1) بمشاريعها الـ (7) علماً أن الفقرة ضمن الأمد السريع، وكذلك مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. تجهيز عيادات طبية متنقلة وسيارات اسعاف في محافظتي (ديالى، صلاح الدين)/قرض البنك الدولي (اعادة اعمار المناطق المحررة) - ضمن الفقرة (3)،

2. برنامج تجسير الملاكات الصحية والتمريضية - ضمن الفقرة (4).

3. إصدار ضوابط واليات جديدة بتوفير الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والخدمية - ضمن الفقرة (5).

4. مشروع انشاء مستشفى عام سعة (400) سرير في محافظة بابل مع مركز لمعالجة الاورام السرطانية - ضمن الفقرة (6).

# وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

المحور الرابع (تقوية الاقتصاد)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود

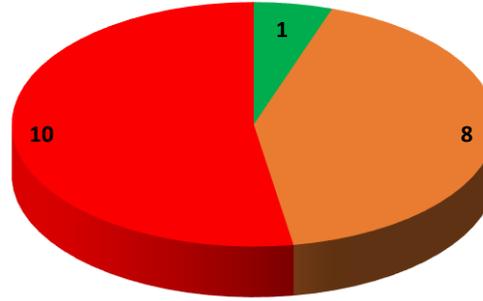

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (21) مشروع، (1) منها انجز بشكل كامل و(8) حققت مستهدفها و(10) فيه حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي :


1. إجراءات إدارية.
2. تأخر ادراج المشاريع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط.
3. قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008، حيث تم فك ارتباط دور التأهيل الاحداث (المشردين والمشردات) ودار ضحايا الاتجار بالبشر من الوزارة وربطها بمحافظة بغداد.
4. عدم توقيع اتفاقية من الجانب العراقي/وزارة المالية مع الجانب البنك الدولي/الجهة المقرضة.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (4) شمول جميع المواطنين....




فقرة (3) مراكز التدريب المهني....



فقرة (2) مشروع تشغيل الشباب....



فقرة (1) قاعدة بيانات عن العراقيين..



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع من البرنامج الحكومي وضمن (4) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (58.28%) وبنسبة حيود (41.73%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (4) وكما يلي:

1. مشروع تخصيص قطع اراضي لشريحة المتقاعدين والعمال في القطاع الخاص والذي يتطلب (صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر لتخصيص قطع اراضي في بغداد والمحافظات)) وبنسبة حيود (100%). كون المشروع اصبح ضمن اعمال وزارة الاعمار والسكان والبلديات والاشغال العامة لذا يتطلب رفعه عن دائرة الضمان.
2. مشروع (معالجة المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذي يتطلب قرار من مجلس الوزراء يلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشمول العقود او الاجور اليومية بالضمان الاجتماعي وفق الحد الادنى للاجر (350) الف دينار) وبنسبة حيود (100%)، حيث تم استلام بيانات (184) دائرة حكومية والعمل مستمر باستلام البيانات.

وكذلك الفقرة (3)- مشاريع البنك الدولي :

1. تطوير خارطة الطريق استراتيجية الحماية الاجتماعية/سببه عدم توقيع اتفاقية من الجانب العراقي/وزارة المالية مع الجانب البنك الدولي/الجهة المقرضة.
2. ادارة المشروع الطارئ/سببه عدم ادراج المشاريع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط.

أنجزت الوزارة في هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروع (تطوير اليات عمل البحث الاجتماعي لخلق استهداف اكثر فاعلية للوصول الى الاسرة المهمشة الحقيقية ولخلق قاعدة رصينة ودقيقة) – ضمن الفقرة (1) وكذلك انجزت مستهدفات (8) مشاريع ضمن الفقرتين (1 و3) وبنسبة انجاز (100%).

# وزارة الصناعة والمعادن

المحور الرابع (تقوية الاقتصاد)  
المحور الثاني (سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

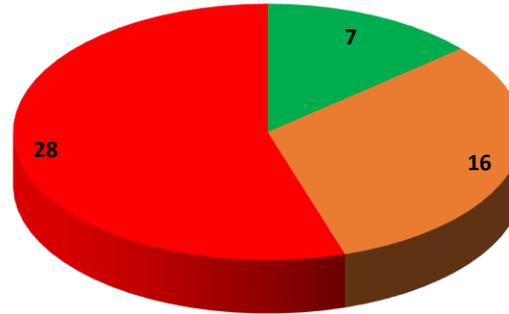


## أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (57) مشروع، (7) منها انجزت بشكل كامل و(16) حققت مستهدفها و(28) فيها حيود، حيث ان الحيود قد ظهر نتيجة عدم أو تأخر صرف التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة من قبل وزارتي التخطيط والمالية، وعدم الحصول على فرص استثمارية للمشاريع.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (1) تحويل الاصول الجامدة الى اصول....




فقرة (2) تقديم دراسة لعدد المصانع الصغ....



فقرة (3) توحيد شروط وامتيازات مدير....



فقرة (4) منح الأراضي للأغراض الصناعية....



فقرة (5) فتح الباب للاستثمار الخارجي في مج....



فقرة (6) التكامل مع وزارة الصناعة العراقي....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع والثاني من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (72.37%) وبنسبة حيود (27.63%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و2) مثل

مشروع (مشروع السلاسل/القولاذية (مشاركة)) بنسبة حيود (50%) ومشروع (انتاج وتعبئة مياه الشرب/المنصور الزوراء(استثمار)) بنسبة حيود (70%) ومشروع (معمل تصليح محركات الجهد المتوسط/ الزوراء

(توسيع طاقات) (استثمار)) وبنسبة حيود (83%) ضمن الفقرة (1) ومشاريع اخرى، لأسباب تتعلق بعدم الحصول على فرص استثمارية مناسبة ولا يزال الإعلان عنها مستمر.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان (6) مشاريع، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ولم تقدم الوزارة أسباب موضوعية لتوقف هذه المشاريع ومنها مشروع (تخصيص الاراضي الصناعية للقطاع الخاص بموجب دراسات الجدوى الاقتصادية المقررة) ضمن الفقرة (4)، حيث كان نسبة إنجازها في الفصل الثاني (67%) واكتفت الوزارة بمخاطبة المحافظات لتسهيل منح قطع الاراضي للمشاريع الصناعية، وان عدد من طالبي الاجازات لديهم قطع اراضي خاصة بهم ولا يحتاجون الى تخصيص.

هنالك (3) مشاريع للوزارة مصنفة باللون الازرق (ليس لها تخصيص مالي) ضمن الفقرات (1 و2)، الا ان الوزارة قد حققت فيما مستهدفاتها لهذا الفصل بنسبة انجاز (100%).

أنجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروع (مشروع تصنيع وتجميع معدات تخصصية خدمية / الهيدروليكيكية (استثمار)) - ضمن الفقرة (1)، ومن الجدير بالذكر ان الوزارة انجزت خلال الفصل الثاني، وبشكل كامل، مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. تاهيل مصانع الشركة العامة للزيوت النباتية / المرحلة الثانية (مشاركة) - ضمن الفقرة (1).
2. تاهيل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية (المرحلة الاولى) - ضمن الفقرة (2).
3. اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة / قطاع خاص- ضمن الفقرة (2).
4. مشروع تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 للقطاعات الخاص والمختلط- ضمن الفقرة (3).
5. تصنيع الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمقاتلة- ضمن الفقرة (5).
6. انتاج العربات المدرعة- ضمن الفقرة (5).

وبالتالي فقد انجزت الوزارة، وبشكل كامل، الفقرات (3 و6) ضمن التزامها في البرنامج الحكومي.

# وزارة الزراعة

المحور الرابع (تقوية الاقتصاد)

المحور الثالث (الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

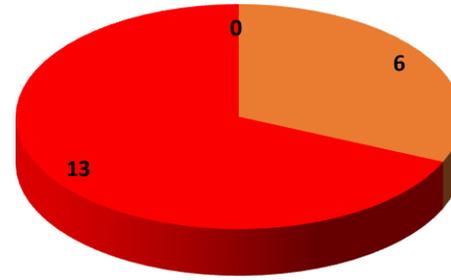

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (23) مشروع، (6) منها حققت مستهدفها و(13) فيها حيود، وهذا الحيود قد جاء نتيجة جملة من الأسباب، قد أوضحت الوزارة عدداً منها ولم توضح العدد الآخر، ومنها عدم توفر أو تأخر صرف

التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة، وإجراءات إدارية متعلقة بالمشاريع، ومن قبل وزارتي التخطيط والمالية.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لمقررات البرنامج الحكومي

فقرة (1) التخلص من مفهوم الأراضي الأميرية....



فقرة (2) توسيع تجربة القرى العصرية....



فقرة (3) تشجيع الاستثمار الزراعي والح....



فقرة (4) تشجيع الزراعة الحديثة وتطويرها و....



فقرة (5) وضع خطة بالأرقام لشمول الاراض....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع والثالث من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (73.77%) وبنسبة حيود (26.23%)، ونسبة الحيود هذه تظهر بشكل واضح في الفقرة (1) - مشروع (تفعيل قانون (117) لسنة 1970)، وسببه عدم وجود تمويل مالي لمتابعة اللجان العاملة على الموضوع، وكذلك الفقرة (4) - مشروع (مشروع اقراض المزارعين لشراء منظومة ري حديثة لاعادة تأهيل بساتين النخيل والفاكية والنيتون)، وسببه عدم توفر تخصيص مالي للبرنامج، ايضاً الفقرة (5) - مشروع (تطوير وتأهيل الطيران الزراعي في العراق)، وسببه عدم موافقة وزارة التخطيط على الفقرات المدرجة لعام 2019.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان الفقرة (3) لديها (4) مشاريع بدون مستهدفات لهذا الفصل، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو لأسباب تتعلق بالتوقيتات والرزنامة الزراعية لعدد من المحاصيل وكذلك لأسباب مالية.

حققت الوزارة خلال هذا الفصل، مستهدفات (6) مشاريع وبنسبة انجاز (100%)، بعد ان كانت (4) مشاريع في الفصل الماضي.

# وزارة النقل

المحور الخامس

(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود

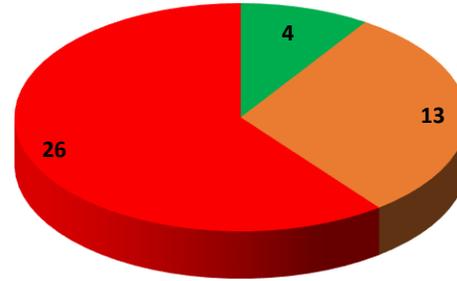

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (47) مشروع، (4) منها انجزت بشكل كامل و(13) حققت مستهدفها و(26) فيها حيود، نتيجة لجملة من الأسباب، قد أوضحت الوزارة عدداً منها ولم توضح العدد الآخر، ومنها التجاوزات والمعوقات على ارضية الموائن وكذلك غلقها بسبب التظاهرات، وعدم وجود امكانية للحصول على الكفالة السيادية.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (1) انجاز ميناء العراق الكبير....




فقرة (2) زيادة الاعتماد على السكك....



فقرة (3) تحويل شركة الخطوط....



فقرة (4) رفع طاقة الموانئ الحالية....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (4) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (54%) وبنسبة حيود (46%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (3) - مشروع (توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن) بنسبة حيود (96%)، لم تبين الوزارة اسباب هذا الحيود، ومشروع (شراء طائرات كندية) بنسبة حيود (100%)، بسبب التأخر في تسديد مستحقات الشركة الكندية مما سبب تاخير تسليم الطائرات، وكذلك الفقرة (4) - مشروع (مشروع بناء 8 بواخر متعددة الاغراض مختلفة الحمولة) وبنسبة حيود (100%)، بسبب عدم امكانية الحصول على الكفالة السيادية.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان (4) مشاريع ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، مثل مشروع (مسبب كربلاء المقدسة) ضمن الفقرة (2).

أنجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، (3) مشاريع ضمن الفقرة (4) وهي مشروع (نقل اشخاص من رصيف العشار الى جزيرة كيش وموانئ الخليج العربي وبالعكس) ومشروع (شراء وحدات بحرية) ومشروع (شراء معدات مناولة للموانئ) ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، ومن الجدير بالذكر ان الوزارة في الفصل الماضي، قد أنجزت وبشكل كامل، مشروع (كاسر الامواج الغربي) لميناء الفاو الكبير - ضمن الفقرة (1).

كما وحققت الوزارة نسب عالية بمعدلات الانجاز لمشاريع مهمة كمشروع (مشروع (يوسفية - حلة - سماوة) للخطين الجديد الملاصق والقديم) و(مشروع (بغداد - بيجي) للخطين الجديد الملاصق والقديم) - الفقرة (2) وبنسبة انجاز (100%) حيث وضعت الوزارة رؤية لمشاريع السكك الحالية والمستقبلية لتحديث النقل السككي وانشاء شبكة سكك متطورة.

# وزارة الاتصالات

المحور الخامس  
(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

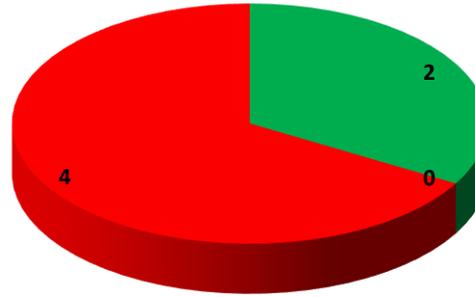

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (7) مشاريع، (2) منها انجز بشكل كامل و(4) فيها حيود، حيث ظهرت هذه النسبة نتيجة عدم استكمال إجراءات مناقلة التخصيصات المالية لأحد المشاريع ولم تبين الوزارة اسباب الحيود الأخرى.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (3) إكمال متطلبات مشروع الكيبل....



فقرة (2) طرح الجيل الرابع من الهاتف ....



فقرة (1) تشريع قانون للرقابة الالكترونية....



فقرة (6) تقديم الاستشارة الخدمية لكافة ....



فقرة (5) اعادة خدمة الهاتف الأرضي....



فقرة (4) مضاعفة سعة وسرعة شبكة الانترنت....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (6) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (61.66%) وبنسبة حيود (38.34%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (3) - مشروع مشروع الكابل الضوئي (بالمشاركة) بنسبة حيود (100%)، ولم تبين الوزارة اسباب هذا الحيود، والفقرة (6) - مشروع تطوير وتوسيع الشبكات الضوئية بنسبة حيود (100%)، بسبب عدم استكمال إجراءات مناقلة التخصيصات المالية.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان الفقرة (2) - مشروع (الهاتف النقال G4) ليس لديه مستهدف لهذا الفصل، بسبب عدم حسم عائدية المشروع.

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة وخلال الفصل الثالث قد أنجزت، وبشكل كامل، الفقرة (1) والمتضمنة مسودة مشروع (قانون للرقابة الالكترونية)، كما وانجزت خلال الفصل الثاني مشروع (ربط الدوائر في بغداد والمحافظات لاسلكياً (LTE)) - ضمن الفقرة (6).

# وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة

المحور الخامس (الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود



## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (215) مشروع، (6) منها انجزت بشكل كامل و(47) حققت مستهدفها و(98) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة، لم تبين الوزارة معظم هذه الاسباب ولكنها ذكرت ما يلي :

1. تأخر اطلاق التخصيص المالي لعدد كبير من المشاريع ولغاية منتصف حزيران 2019.

2. عدم وجود التخصيص المالي او عدم ورود التمويل لبعض المشاريع.


3. الأوضاع الأمنية لمواقع بعض المشاريع.

4. قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 والذي لم يتم البت به لحد الآن.

5. إجراءات حسم كشوفات الاضرار والاندثارات.

6. دعاوى قضائية وسحب عمل في بعض المشاريع.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لمقرات البرنامج الحكومي

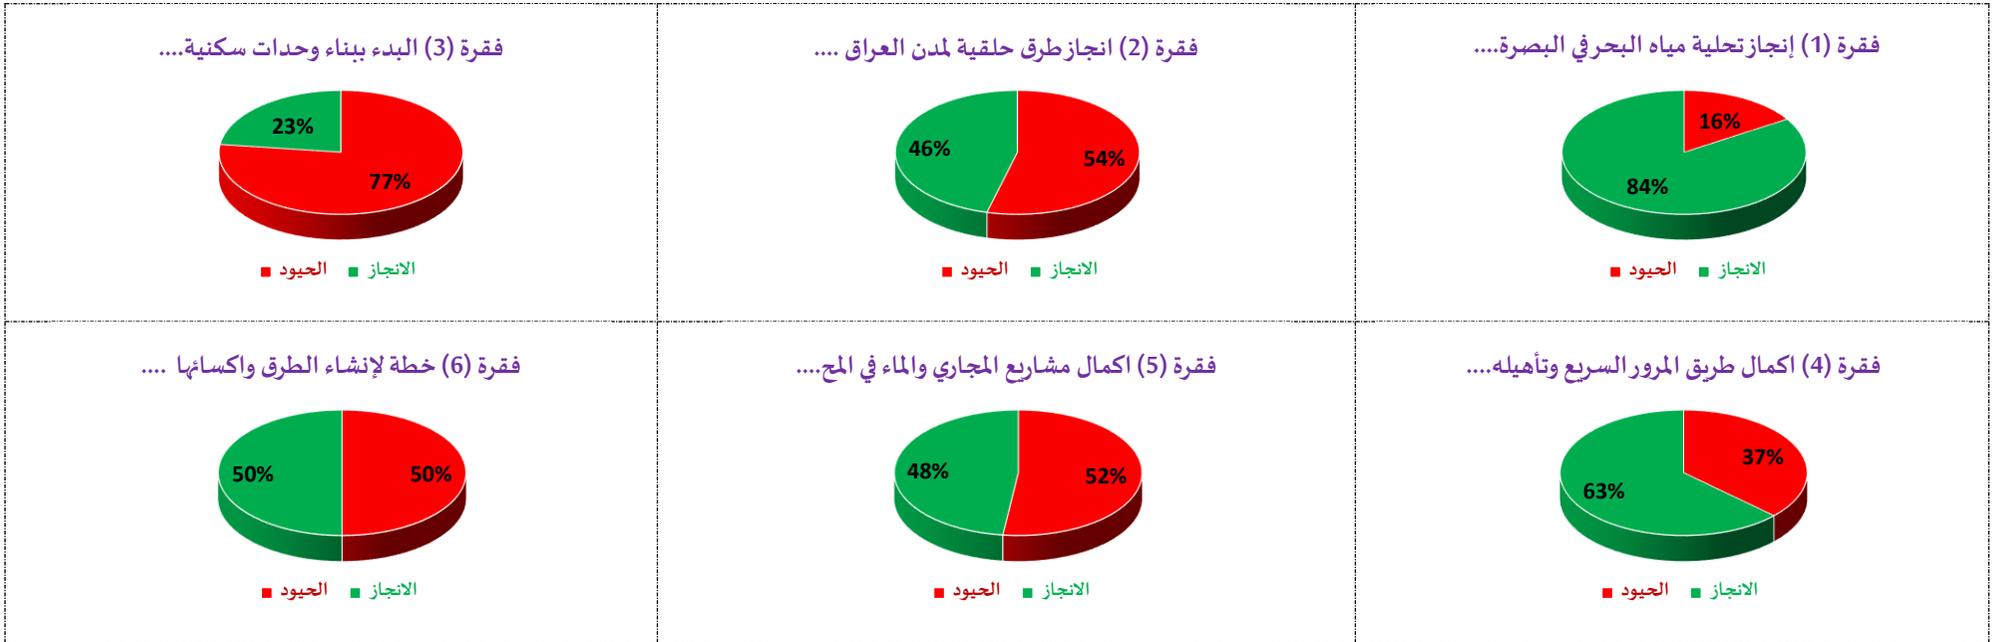

### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (6) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (67.6%) وبنسبة حيدود (32.4%)، وهذا الحيدود يظهر بشكل واضح في الفقرة (3)- والتي تحتوي على (10) مشاريع تعاني من عدم أو تأخر إطلاق التخصيصات المالية.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (64) مشروع ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم اطلاق التخصيصات المالية لهذه المشاريع أو كونها متوقفة حسب القرار 347 لسنة 2015، والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

انجزت الوزارة ضمن مستهدفاتها لهذا الفصل (47) مشروع ضمن فقراتها الـ (6) علماً بأنها ارسلت كتاب رسمي في وقت سابق لتغيير مستهدفات وفترات التنفيذ لبعض من مشاريعها وهو في طور استحصال الموافقات الرسمية.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروعين ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي وهي، مشروع (مشروع تدقيق التصميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مجاري الثقيلة والامطار مع محطات رفع مدينة النجف الاشرف/م(2-3)) ضمن الفقرة (5) ومشروع (اعادة اعمار جسر الفيحاء في البصرة) ضمن الفقرة (6).

انجزت الوزارة خلال الفصل الثاني، وبشكل كامل، (4) مشاريع ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي وهي، مشروع (اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري الاسكندرية والمسبب) و (تنفيذ بناية مركز مجاري المناذرة) ضمن الفقرة (5)، ومشروع (انشاء الممر الثاني لطريق بغداد - كركوك بجزئيه سليمان بيك /العظيم و سليمان بيك /دافوق) و (تبليط شوارع في قضاء الميمونة - ادراج جديد 2013) ضمن الفقرة (6).

من الجدير بالذكر ان نسب المشاريع المتوقفة تمثل النسب التي توقفت فيها تلك المشاريع و لم يتم حساب الاندثار فيها وبالتالي ستقلل من النسب الحالية.

# وزارة الشباب والرياضة

المحور الخامس  
(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها


■ فيها حيود

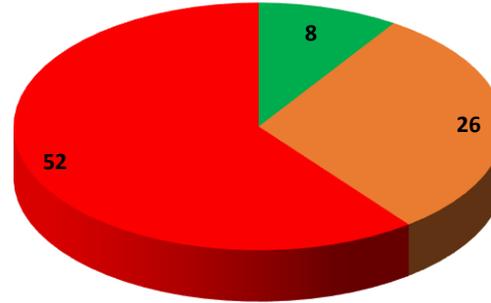

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (88) مشروع، (8) منها انجزت بشكل كامل و(26) حققت مستهدفها و(52) فيها حيود، وهذا الحيود قد ظهر نتيجة جملة من الأسباب، قد أوضحت الوزارة عدداً منها ولم توضح العدد الآخر، ومنها عدم وجود أوقلة التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

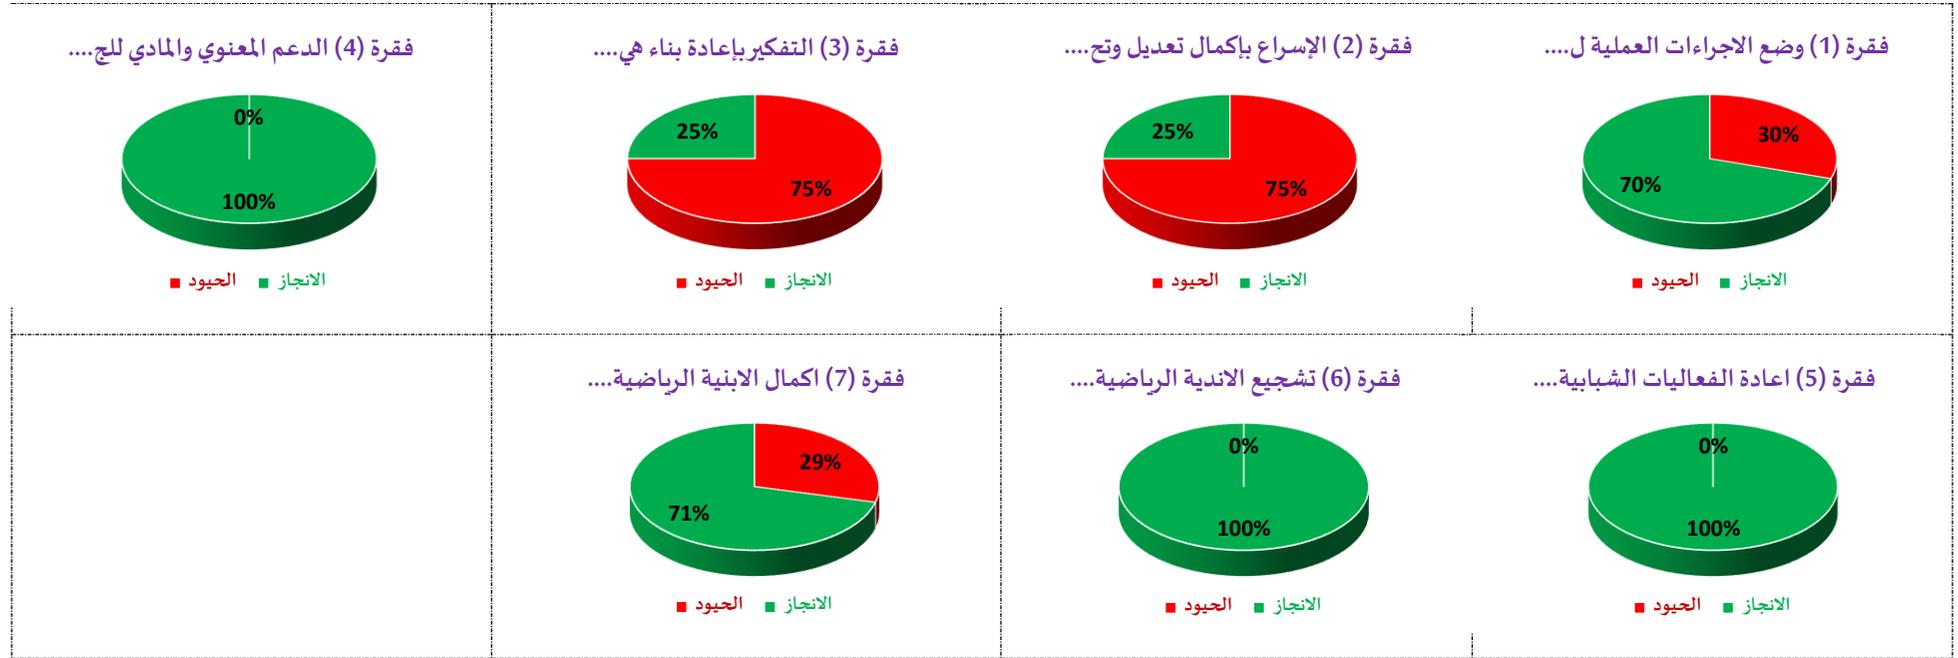

### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (9) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (57.25%) ونسبة حيود (42.75%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و2 و3 و7)، وكما يلي:

الفقرة (1) - مشروع (تنفيذ مشروع بغداد عاصمة الشباب العربي 2020) بنسبة حيود (100%) بسبب عدم وجود تخصيص مالي.

الفقرة (2) - مشروع (اقرار القوانين الخاصة بالشباب) بنسبة حيود (50%) ولم تبين الوزارة اسباب الحيود لهذا المشروع.

الفقرة (3) - مشروع (اعداد هيكل تنظيمي ينظم الحركة الرياضية في العراق (مجلس اعلى للرياضي)) بنسبة حيود (100%) ولم تبين الوزارة اسباب الحيود لهذا المشروع.

الفقرة (7) - مشروع (انشاء قاعات رياضية مغلقة سعة (500) متفرج في أفضية بغداد والمحافظات عدد (6)) بنسبة حيود (100%) بسبب عدم وجود تخصيص مالي.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة مشروعين ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم وجود التخصيصات المالية وكذلك وجود مكونات في المشروع غير محالة.

من الجدير بالذكر ان الوزارة قد انجزت خلال الفصل الثالث، وبشكل كامل، (5) مشاريع ضمن الفقرتين (1 و7)، وانجزت خلال الفصل الثاني (3) مشاريع ضمن الفقرة (7).

# وزارة الموارد المائية

المحور الثالث  
(الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

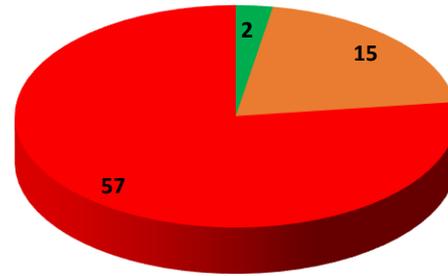

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (75) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و(15) حققت مستهدفها و(57) فيها حيود، حيث ظهر هذا الحيود نتيجة عدم أو تأخر اطلاق التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة وكذلك الأوضاع الأمنية في مواقع المشاريع وإجراءات وزارة التخطيط.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (1) اعادة النظر بالسياسة المائية....



فقرة (2) البدء بمشروع تبطين القنوات المائية....



فقرة (3) وضع خطة بالأرقام لشمول الاثار....



فقرة (4) السعي لزيادة لزيادة الخزين المائي....



فقرة (5) كروي الانهر من قبل القطاع العام....



فقرة (6) العمل الجاد والسريع بالتعاون مع....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثالث من البرنامج الحكومي وضمن (6) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، وبنسبة انجاز الوزارة (65.49%) وبنسبة حيود (34.51%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1) و (2) و (3) و (5) و (6) حيث كانت نسبة الحيود فيها متفاوتة واغلبها عالي جداً ولـ (57) مشروع وهذا العدد كبير بالنسبة لعدد مشاريع الوزارة البالغة (75) مشروع، علماً ان لدى الوزارة مشروع واحد بدون مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفاتها لعام 2019 سوف تتحقق في الفصول القادمة.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان الوزارة حققت مستهدفات (15) مشروع لهذا الفصل وبنسبة انجاز (100%) مثل مشروع (أعمال المعالجة الدائمة لاسس سد الموصل بضمينها اعمال التحشية) ضمن الفقرة (1).

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروع (انشاء ناظم ابو صخير) - الفقرة (4)، كما انجزت خلال الفصل الماضي، وبشكل كامل، مشروع (تجهيز وصيانة اعمال التحشية واعادة تأهيل المنافذ السفلى لسد الموصل) - الفقرة (1)، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي.

# وزارة الثقافة والسياحة والآثار

المحور الخامس

(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها


■ فيها حيود

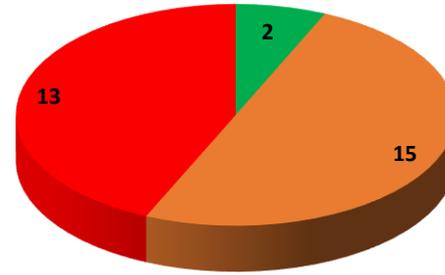

## أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (41) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و(15) حققت مستهدفها و(13) فيها حيود، حيث ان سبب الحيود هذا لعدم توفر أو تأخر اطلاق التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

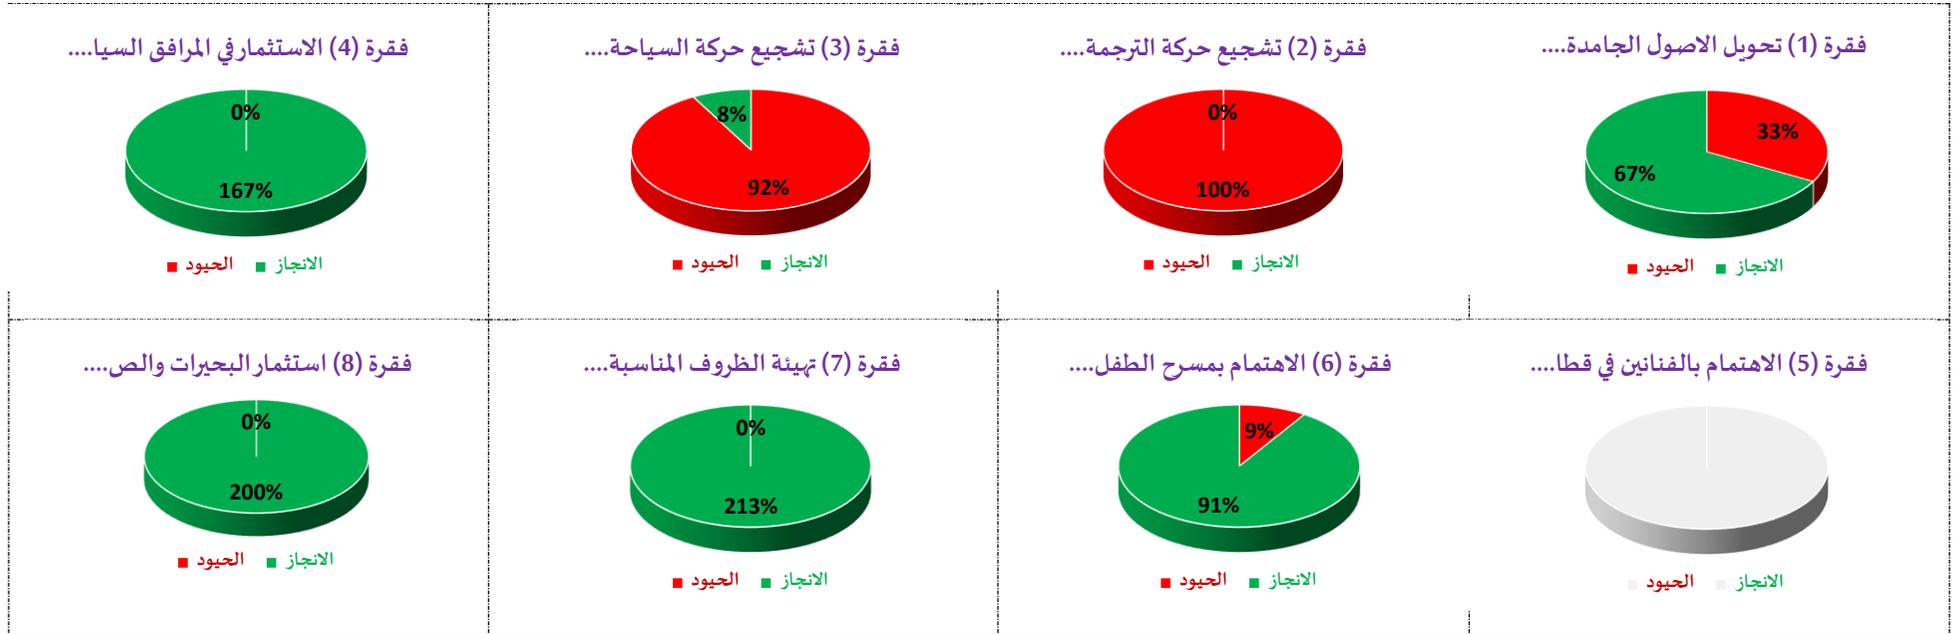

### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (8) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (66.91%) ونسبة حيود (33.09%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و 2 و 3 و 6)، وكما يلي:

الفقرة (1) - مشروع (مسرح الرشيد) بنسبة حيود (100%)، الغاء تأهيل المسرح من قبل دولة قطر.

الفقرة (2) - مشروع (اقامة وتبادل للاسابيع ثقافية داخل وخارج العراق) بنسبة حيود (100%)، لعدم توفر التخصيص المالي.

الفقرة (3) - مشروع (برامج تنفيذية في الجانب السياحي مع البلدان الاخرى) بنسبة حيود (100%)، ولم تحدد الوزارة أسباب هذا الحيود.

الفقرة (6) - مشروع (عربة مسرح الطفل) بنسبة حيود (100%)، ولم تحدد الوزارة أسباب هذا الحيود.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة الفقرة (5) و(10) مشاريع متوزعة على فقرات الوزارة، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم توفر التخصيصات المالية لهذه المشاريع والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة أنجزت خلال الفصل الثالث، وبشكل كامل، مشروع (ساحة الاحتفالات) ضمن الفقرة (1)، كما انها أنجزت خلال الفصل الثاني، وبشكل كامل، مشروع (المسرح الوطني).

# وزارة الهجرة والمهجرين

المحور الخامس  
(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

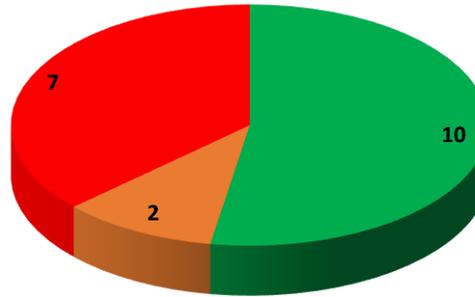

## أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (21) مشروع، (10) منها انجزت بشكل كامل و(2) حققت مستهدفها و(7) فيها حيود، حيث ظهرت هذه النسبة نتيجة عدم توفر التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة، ولأسباب أخرى لم تبيها الوزارة.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (3) متابعة شؤون العراقيين المهاج....



فقرة (2) العمل مع المنظمات الدولية والمح....



فقرة (1) دراسة إنجاز وتطبيق قاعدة بيانات....



فقرة (5) مساعدة هيئة الاستثمار الوطنية....



فقرة (4) اعتماد المهاجرين العراقيين المتميزين....



### تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، ونسبة انجاز الوزارة (74.89%) وبنسبة حيود (25.11%)، وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و 2) وكما يلي:

يلي:

الفقرة (1) - مشروع (حملات دعائية وترويجية وعقد مؤتمرات) بنسبة حيود (17%)، ولم تبين الوزارة أسباب هذا الحيود.

الفقرة (2) - مشروع (توفير وحدات سكنية لفئات العناية (للعوائل الهشة)) بنسبة حيود (99%)، بسبب عدم توفير التخصيص المالي.

الفقرة (2) - مشروع (توزيع منح مالية لغرض ترميم الدور المتضررة في المناطق المحررة لتشجيع العودة الطوعية) وبنسبة حيود (100%)، ولم تبين الوزارة أسباب هذا الحيود.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان مشروع (تشبيد مجمع البصرة السكني) ضمن الفقرة (2)، ومشروع (فتح مكاتب للوزارة في الدول التي تضم كثافة كبيرة للاجئين العراقيين في الخارج الدول (يونان - السويد - استراليا - امريكا - بريطانيا - بلجيكا - النمسا)) ضمن الفقرة (3)، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، بسبب عدم توفر التخصيص المالي فيما يخص مشروع الفقرة (2)، ولم تحدد الوزارة أسباب مشروع الفقرة (3) علماً انه حقق نسب انجاز مقدارها (22%) في الفصل الثاني.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. نشر الاستمارة من خلال المواقع الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي وضمن تطبيقات الاجهزة الذكية - ضمن الفقرة (1).

2. مشروع توفير مؤشرات احصائية عن ذوي الاحتياجات الخاصة للنازحين من النزوح الطارئ - ضمن الفقرة (2).

ومن الجدير بالذكر انها قد انجزت خلال الفصل الثالث، وبشكل كامل، (3) مشاريع وهي:

1. مسح تجريبي بالعينة ل600 شخص مقسم على اربع دول - ضمن الفقرة (1).

2. تصميم قاعدة بيانات وفق نتائج المسح التجريبي - ضمن الفقرة (1).

3. مشروع حراسات مجمع البصرة - ضمن الفقرة (2).

وخلال الفصل الثاني انجزت، وبشكل كامل، (5) مشاريع وهي:

1. اعداد استمارة لتسجيل العراقيين (ورقية وتطویرها الى الكترونية) - ضمن الفقرة (1).

2. إنشاء مجالس جاليات من المهاجرين العراقيين للتواصل - ضمن الفقرة (3).

3. تفعيل الجانب الالكتروني للتواصل مع العراقيين في دول الخارج - ضمن الفقرة (3).

4. تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاختيار السفراء بالتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات ذات العلاقة وعقد مؤتمر في بغداد بحضور السفراء المرشحين - انجاز الفقرة (4) بالكامل.

5. إقرار السياسة الوطنية للاستفادة من العراقيين في دول المهجر - انجاز الفقرة (5) بالكامل.

# أمانة بغداد

(وردت ضمن المحور الخامس وزارة الاعمار والإسكان والبلديات)


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها


■ فيها حيود

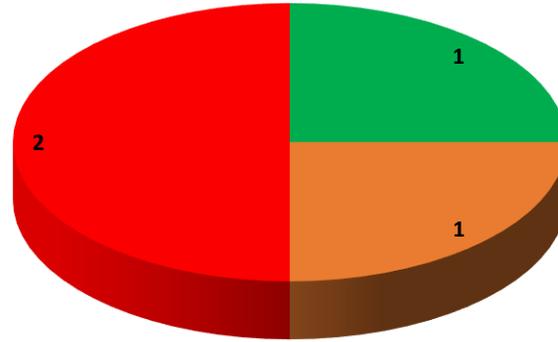


## أسباب عامة للحيود

تعمل الأمانة على (4) مشاريع، (1) منها انجز بشكل كامل و(1) حقق مستهدفه و(2) فيها حيود، والحيود يظهر لأسباب تتعلق بالمعوقات الفنية لمشاريع الأمانة كالتجاوزات وزيادة مكونات المشاريع.

فقرة (2) انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسابها....



فقرة (1) اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات الع....



### تحليل واستنتاج

تعمل الامانة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن فقرتين وردت ضمن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وكما هو مبين في اعلاه، وبنسبة انجاز الامانة (86.21%) وبنسبة حيود (13.79%).

وهذا الحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (1) - مشروع (تنفيذ الخط الرئيسي الناقل في جانب الكرخ / الخط الغربي الاضافي مع تنفيذ محطة ضخ دورة رقم 2 مع خطوط الدفع التابعة لها)، وبنسبة حيود (10%)، بسبب

تعارض سكة الحديد والبزول التابعة لوزارة الموارد المائية مع مسار خط الدفع حيث تم رفع التجاوزات والمباشرة بالعمل بتاريخ 2019/9/3، وكذلك في الفقرة (2) - مشروع (تليط واكساء المحلات والشوارع الرئيسية

في مدينة بغداد / الأفران الجديد)، وبنسبة حيود (56%)، بسبب زيادة مكونات المشروع وبنسبة (25%) واستناداً الى موافقة وزارة التخطيط.

انجزت الأمانة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروع (تنفيذ الخطوط الرئيسية التي ستربط على الخط الشمال الشرقي مع محطة ضخ رئيسية عدد/1)، بالرغم نسبة الحيود التي عانى منها المشروع خلال الفصول

الماضية

# البنك المركزي العراقي

((وردت ضمن المحور الرابع / وزارة المالية))


1. النسبة الكلية للإنجاز والحيود

## مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود

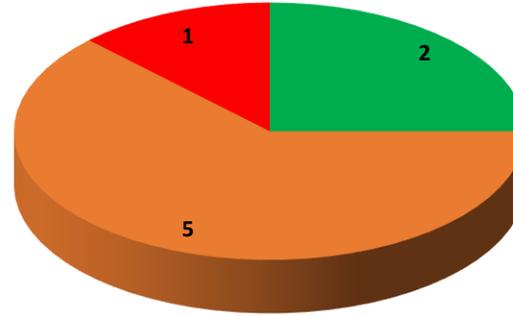


## أسباب عامة للحيود

يعمل البنك على (8) مشاريع، (2) منها انجز بشكل كامل و(5) حققت مستهدفها و(1) فيه حيود، والتي جاءت نتيجة تفاعل المصارف والسوق مع الاليات التي وضعتها دائرة المدفوعات بشكل تدريجي.

## 2. نسب الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (3) السعي للانتقال من اقتصاد الع...



فقرة (2) المصارف عتلة التنمية والواسطة...



فقرة (1) تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز...



### تحليل واستنتاج

يعمل البنك على المحور الرابع من البرنامج الحكومي وضمن (3) فقرات وردت ضمن وزارة المالية وكما هو مبين في اعلاه، وبنسبة انجاز (94.31%) وبنسبة حيود (5.69%)، حيث حقق البنك مستهدفات جميع مشاريعه وانشطته لهذا الفصل وبنسبة (100%) والذي يبرر ارتفاع نسبة انجاز هذا الفصل عن الفصل السابق باستثناء مشروع (توفير بطاقات السفر لدفع المصاريف في الخارج ضمن سعر صرف نافذة العملة دون الحاجة الى مخاطر حمل واستعمال النقد في الخارج) ضمن الفقرة (3)، بنسبة حيود (44%) والذي جاء نتيجة تفاعل المصارف والسوق مع الاليات التي وضعتها دائرة المدفوعات بشكل تدريجي .

انجز البنك هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروع (زيادة السقف الأتسماني للاعتمادات الحكومية من المصارف الخاصة الى 50 مليون دولار) - ضمن الفقرة (1) ضمن التزاماته في البرنامج الحكومي، من الجدير بالذكر ان البنك قد انجز خلال الفصل الثاني، وبشكل كامل ايضاً، مشروع (مراجعة وتطوير اجراءات الاقراض المعمول بها في المصارف والمؤسسات المشاركة في توفير خدمات التمويل الاصغر) - ضمن الفقرة (2)، قبل انتهاء الفترة المخصصة له، علماً بأنه قد تم التخطيط لانجازه في عام 2020.

ملحق تفصيلي

عن بيانات تنفيذ مشاريع الوزارات

## وزارة الخارجية

### المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي

الملاحظات	كانون الأول - 4-4		تموز - 4-3		نيسان - 4-2		عدد البرامج المنفذ	عدد البرامج المخطط	عدد البرامج المخطط	عدد البرامج المخطط	المشروع	الفترة الرسمية التنفيذ	فترة البرنامج الحكومي
	التنفيذ	المخطط	التنفيذ	المخطط	التنفيذ	المخطط							
	1	1	0	0	0	0	صفر	6	2022	2019	4	الحصول على عضوية منظمات دولية	<p>تعزيز دور العراق كمنصرف فاعل في مؤسسة الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والكثير من المنظمات الاقليمية والدولية وان تكون وزارة الخارجية الواجهة الحضارية التي تمثل العراق بأفضل ما يمكن للعالم وتدافع عن مصالحه ومواطنيه. والمساهمة في الحفاظ على امن العراق وتعزيز وحدته وحدوده وتكامل مجتمعه. مع التركيز على توسيع مساحة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والجماعية مع جميع دول العالم بما يضمن مشاركة المجتمع الدولي في إعادة بناء العراق وتطوير بنيته التحتية</p>
	1	0	0	0	0	0	-	3	2022	2019	4	إبرام اتفاقيات تعزيز وحدة وتكامل الأمن المجتمعي	
	2	0	0	0	0	0	-	-	2022	2019	4	تعزيز كوادرات البعثات العراقية في الخارج	
	0	1	1	0	0	0	صفر	5	2022	2019	4	إعادة فتح بعثات جديدة والبعثات التي اغلقت في السنوات الماضية بسبب نتيجة لسياسة التقشف	
	1	0	1	0	0	0	صفر	-	2020	2019	1	التنفيذ والترويج للاقتصاد العراقي عبر المؤتمرات الدولية الاقتصادية والاستثمارية	
	0	0	0	0	0	0	صفر	-	2022	2019	4	بدء مفاوضات مع مجموعة G7 لإعادة إعمار البنى التحتية في العراق	

لم  
تحدد



## وزارة الدفاع

### المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي

الملاحظات	كانون الأول - 4هـ		نور - 3هـ		يومان - 2هـ		الواقع الفعال (عدد أو نسبة)	المستهدف النسبة (نسبة)	تاريخ الانجاز	تاريخ بداية التقديم	الفترة المعدة للتقديم	المشروع	الفترة الزمنية للتقديم	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
	0	3%	0%	3%	0	3%	0	100%	2022	2019	4	تسويق بناء وتطوير قدرات الجيش العراقي		
	0	0,4%	0%	0,3%	0	0,3%	حالي ومستمر	100%	2022	2019	4	تعاون وتنقلات الهندسة العسكرية		
	0.411	12.8	0.001	10	0.534	10	67.2%	100%	2015	2010	4	إتشاء مستشفى عام للقوات المسلحة العراقية		
	0	16.3	0	10	10.3	10	63.7%	100%	2016	2015	1	إنشاء بداية تجهيز مديرية الطوارئ الأرضية النورية ودرج تسليم مفتاح		
	0	10	0	10	0	10.8	69.2%	100%	2015	2012	1	إكمال متطلبات قيادة القوة البحرية من الأبنية والمنشآت الجديدة		
	0	0	0	0	0	0	82.9%	100%	2014	2010	1	إكمال متطلبات قيادة القوة الجوية والكوادر الجوية القائمة بها		
	0	10	0	7	0	10	57.0%	100%	2011	2010	1	إعادة تجهيز تلبية مجمع الكسرة العسكري (عدد 10) جاهزاً		
	0	0	0	0	0	0	83.3%	100%	2013	2012	1	إكمال متطلبات دائرة التدريب والتأهيلات والدورات التدريبية بها		
	10.8	15	13.5	15	11.7	15	9.5%	100%	2018	2015	1	تجهيز وتطوير وإثبات قاعدة الصورة الجوية بأستوديو (التصوير والتقديم)		
	0	0	0	0	0	0	23.9%	100%	2013	2012	1	إنشاء مراكز متخصصة لتعليم عمالتي الصيانة		
	0	0	0	0	0	0	56.2%	100%	2010	2007	1	إنجاز مشروع قاعدة إيم فستار البحرية		
	0	0	0	0	0	0		100%	2011	2008	3	إكمال متطلبات مشروع خطة الاكتفاء الذاتي		
	0	0	0	0	0	0	61.0%	100%	2019	2019	1	إكمال متطلبات القوات الجوية		
	3%	5%	8%	10%	0	10%					2	مشروع القرص الأمريكي لوزارة الدفاع		

تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الإرهاب ومنع عودته بأي عنوان أو شكل أو اسم ولهذا الغرض إيلاء أهمية خاصة للاستمرار في بناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وقبة القوى المتصدية للإرهاب، والاضطلاع على منع أي تشكيل عسكري أو سلاح خارج إطار الدولة، وتابعة الجميع للقيادة العام للقوات المسلحة، والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق الاتفاقات ثنائية وجماعية رسمية.

لم تحدث

	0	5%	0%	10%	0	10%	حال ومستمر	100%	2022	2019	3	<p>أ. دمج الموارز والمديرآت ذات المهام والوظائف المشتركة وفقاً لدراسة وخطة عمل أعدت في دائرة العمليات ومديرية التنظيم والكابلي.</p> <p>ب. دمج مديرية الاستخبارات العسكرية مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن</p> <p>ج. دمج لمديرية العامة للموارز والبرامج مع مديرية الحسابات العسكرية</p> <p>د. دمج المديرية العامة لبيع الدفاع مع مديرية التخطيط</p> <p>هـ. إلغاء مديرية الشؤون العسكرية للأغراض المدنية والاستفادة من مواردها بتشكيل مديرية الاستعمار العسكري</p>	سريع	<p>تكليف القيادة العليا في وزارة الدفاع بإعداد خطة لتطوير عمل الوزارة ومن بينها دمج المديرآت المتشابهة واحترام السهاقات العسكرية وإعادة تنظيم القوات المسلحة وبقية القوى الردفة لمنع التفاعلات والواجبات والمسؤوليات</p>
	0	9%	0%	8%	0%	8%	0%	100%	2022	2019	4 سنوات	<p>توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى البلد (عند حفيف) إطلاقاً</p>	سريع	<p>التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربية لتوفير احتياجات الجيش العراقي من الأسلحة واللاتهاء من وضع الخطط والتعليقات مع استمرار تسليح القوات المسلحة بأفضل أنواع الأسلحة الصعالة التي تناسب طبيعة الحركة في العراق وخصوصاً جهود مكافحة الإرهاب</p>
	0	9%	0%	8%	0%	8%	0%	100%	2022	2019	4	<p>توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى البلد (عند متوسط) إطلاقاً</p>		
	6%	7%	3%	8%	5%	10%	0%	100%	2022	2019	4	<p>تنفيذ برنامج توعية وتثقيف للمواطنين على أمن العراق من مسؤولية جميع المراد المجتمع* وضع تخصيص مالي يكتفي لتغطية نفقات تنفيذ المشروع* تأمين البنى التحتية لتنفيذ المشروع وتزويدها بكافة المتطلبات الضرورية للتدريب* إجراء تدقيق آمني واسع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة</p>	لم تحدد	<p>دراسة إمكانية البدء بتطبيق برنامج إشعاع وبحر التدريب الطوعي للراغبين في سن 22-18 في الدفاع عن البلاد في امها الداخلي والوطني وتشمل أعمال دفاع وحماية وصيانة وبناء وهيئة مستقرات التعمية عند تعرض البلاد لخطر داخلي أو خارجي، وتنمية مهارات الشباب بشكل عام وبعض المتدرب فترة تدريب مناسبة تتحدد لاحقاً مع الأخذ بنظر الاعتبار ديمومة الدراسة والعمل وتقليل الكلف، ويمنح المتدرب بعض الامتيازات غير المالية كالتخفيضات في أحوار وسائل النقل العام، وحمل شارات مميزة، وإعطاء أولويات دون غير الأخرين</p>
	0	5%	5	10%	5%	10%		100%	2019	2019		<p>إعداد دراسة شاملة للاستفادة من طاقات وامكانات القوات المسلحة في أعمال الاعمار وخاصة في المناطق المنغرية ومساعدة الأهالي في تجاوز أوضاعهم الصعبة لتمثل بإعادة البنى التحتية</p>	لم تحدد	<p>الاستفادة من الطاقات العظيمة الموجودة لدى القوات المسلحة للفهام بأعمال الاعمار واستخدام الطاقات الهندسية والعمانية والصعبية واللوجستية لاعمار المناطق الحربية ومساعدة الأهالي في تجاوز أوضاعهم الصعبة</p>

## وزارة النفط

### المحور الثالث: الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية

الملاحظات	كاتبون الأول - 4-4		نموذج - 3-3		تقييم - 2-2		الواقع المالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكمي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المتعددة للتقييم	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
	11%		2%		1%	1%	10%	100%	2022	2019	4	1- مشروع استثمار غاز الريفيوني، مجنون، وغرب القرنة لثوالمجيس والصبية (الطورية)	لم تحدد	الاستمرار في تطوير الطاقات الانتاجية للنفط الخام ونتاج الغاز الطبيعي او المصاحب والعمل الدؤوب لتقليص حرق الغاز وتوفير الغاز للكهرباء المنشآت الصناعية لزيادة الدعم المالي الموازنة العامة للدولة
	0%		0		0%	2%	10%	100%	2021	2019	3	2- مشروع استثمار غازين صخر		
	10%	10%	7%	10%	5%	10%	10%	100%	2022	2019	5	3- مشروع استثمار الغاز في حقول مسلمان (حقول حقلية)		
	18%	15%	1%	10%	1%	5%	10%	100%	2021	2018	4	4- مشروع استثمار غاز حقل الناصرية		
	2%	6%	1.50%	3%	1	1		100%	2023	2019	5	5- مشروع استثمار غاز حقل الناصرية		
	1%	4%	1%	2%	0	1						6- مشروع استثمار غاز حقل حكا		
	5%	5%	2.50%	3%	1.5	2	1%	100%	2021	2017	5	7- تطوير حقل العديرة لعمق		
	66%	67%	30%	30%	2.8	3	75%	100%	2019	2006	13	8- تطوير حقل الصبة لعمق		
	30%	30%	20%	20%	50%	50%						9- استخراج النفط الخام عن طريق مشاريع حوالات الترخيص		
	3%	4%	1.20%	3%	3%	3%	5%	100%	2025	2017	8	10- تطوير حقل الناصرية لعمق		
	70%	70%	26%	25.50%	4.50%	4.50%	86%	100%	2019	2014	5	مشروع الانبوب النجدي	لم تحدد	التعديل في تطوير وتوسيع طاقة منظومة التخزين والنقل والتحميل في المنطقتين الجنوبية والشمالية ومشروع حفر الماء من أجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير واستدامتها، والتسريع في زيادة وادامة مناقذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن كضرورة استراتيجية واقتصادية
	5%	7%	2%	3%	2%	5%	40%	100%	2022	2013	9	1- إنشاء مستودع الناصرية		
	6%	6%	3%	4%	5%	5%	70%	100%	2020	2011	9	2- إنشاء مستودع السماوة		
	2%	4%	1.50%	2%	3.50%	4%	90%	100%	2019	2012	9	3- إنشاء مستودع العمدة		
	5	0	4	1	3	1	1	12 اجتماعات	2022	2019	مستمرة	القيام بدور فاعل في منطقة لوبك	لم تحدد	القيام بدور فاعل في منطقة لوبك بما يصفق مصلحة العراق وبراعي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة
	8%	4%	4.74%	2%	3.81%	4%	60%	140 الف ب/ي	2021	2013	8	1- مشروع دعم نقل البلاد	طويل	اكتمال مشاريع المصافي المتعاقد عليها مع شركات اجنبية من خلال ضمان حقوق العراق وحقوق الشركات بشكل عادل وسلس وحسب نصيب الإنجاز.

												تشكيل فريق هندسي استشاري من الوزارة مختص بتصاميم المشاريع المختلفة لتجهيز الجهد الوطني بمجته اعداد التصاميم الكاملة من خلال فريقهم الفني او من خلال (الهندسة العكسية) باعتماد تصاميم سبق للعراق ان أنفق عليها مئات الملايين من الدولارات وذلك بالاختزال للساعات او تكبيرها وحسب حاجة العراق وطلب المشورة من بيوتات الخبرة العراقية والاجنبية كلما اقتضت الحاجة	سريع	تشكيل فريق هندسي استشاري	1	2019	2019	100%	70%	100%					
												دراسة تقليم مساحات المحرمات النفطية والغازية واصدار تعليمات واضحة بذلك لغرض زيادة المساحات الصالحة للاستخدامات الاخرى ومنع بوز الأراضي دون الاضرار بالقطاع النفط والغازي	سريع	تقليم المحرمات النفطية والغازية	7	2016	2022	100%	70%						
												التركيز على ايجاد فرص استثمارية ضمن قانون الاستثمار النفط رقم 64 لسنة 2007 لبناء مصافي جديدة وان تطلب الامر تعديل القانون لجذب استثمارات للبلاد	لم تحدد	مصفي جيسان الاستثماري 1-	8	2014	2022	الف باري 150	10%	16%	15%	2%	3%	2%	2%
											مصفي كركوك الاستثماري 2-			4	2018	2022	الف باري 150	10%	14%	14%	3%	3%	3%	3%	
														مصفي الفاو الاستثماري 3-	5	2019	2024	الف باري 300	10%	10%	7%	4%	3%	6%	6%
														مصفي الناصرية الاستثماري 4-	5	2019	2024	الف برميل 150 يوم /	5%	3%	2%	5%	5%	8%	8%
												المساهمة بتطوير الصناعات المشتقة كالكبريت وكيماويات والاسمدة وبثمة المشتقات النفطية والغازية او المنتجات العرضية كالكبريت وغيره لتنوع صادرات جديدة غير النفط الخام	لم تحدد	مشروع تطوير مصفي النجف (2019)	4	2019	2022	الف باري 34	10%	3%	3%	8%	8%	12%	14%
												مد منظومات الغاز الى الاحياء والمجمعات السكنية	لم تحدد	مد منظومات الغاز الى الاحياء والمجمعات السكنية	8	2015	2022	100%	26000 وحدة	3560	3559	6815	5516	6815	2847
												تنفيذ مشروع السيارات التي تعمل على احتراق الغاز	لم تحدد	تنفيذ السيارات التي تعمل على احتراق الغاز	12	2017	2028	300 الف سيارة	2000	1512	1238	2088	1971	18000	4516
												وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التحقيق بعد ادخال التعديلات المطلوبة لتتلاقى بعض الثغرات التي تخصها الخبراء، واصدار الانظمة والتعليمات وفق السهائات القانونية، والسماح بعمل شركات الوزارة خارج الوزارة بهدف تحصيل موقوفها الاداري والمالي ونقل خبرتها الى قطاعات اخرى في البلاد سواء كان في القطاع العام او الخاص	لم تحدد	وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق	2	2019	2020	100%	10%	10%	2%	15%	5%	20%	20%

## وزارة الداخلية

### المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي

الملاحظات	كانون الأول - 4		نوفمبر - 3		يومان - 2		الواقع العالي (عدد أو نسبة)	المستهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الأبحاث	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة الممتدة للتنفيذ	المشروع	التقنية الرمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
		40%	70%	30%	30%	30%	40 بئر	48 بئر	2019	2008	مستمرة	مشاريع البنية التحتية	لم تحدد	تكتيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الارهاب وتمنع عودته باي عنوان او شكل او اسم. ولهذا الغرض ابناء اهمية خاصة للاستمرار في بناء القوات المسلحة والجيش الشعبي والبيشمركة وبقية القوى المتصدية للإرهاب. والاصرار على منع اي تشكيل عسكري او سلاح خارج إطار الدولة. وتابعة الجميع للقائد العام للقوات المسلحة. والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية
	0%	10%	25%	15%	25%	25%	مقر 6	مقر 8	2020	2010	مستمرة	بناء مقرات الخوارج بعدة المدن		
	0%	30%	0%	7%	0%	3%	29%	100%	2020	2008	مستمرة	البناء تامة مقر العمليات في مركز الولاية		
	5%	2.50%	0%	2.50%	0%	0%	90%	100%	2020	2006	مستمرة	البناء مقرات جديدة		
	0%	1%	0%	1%	0%	1%	97%	100%	2019	2008	مستمرة	البناء 150 مقعد جديد		
	0%	20%	0%	10%	0%	10%	72%	100%	2020	2010	مستمرة	البناء مركز التدريب شرطة كركي		
	0%	14%	0%	7%	0%	3%	46%	100%	2020	2006	مستمرة	البناء تامة مقر الولاية بجيجر بنسب منظومة الطرقات والمستطير والعمارة مساكن ومطبخ الولاية		
	0%	10%	0%	7%	0%	3%	40%	100%	2021	2009	مستمرة	تطوير البنية التحتية المرحلة الأولى		
	0%	15%	0%	5%	0%	5%	25%	100%	2021	2013	مستمرة	البناء الجامع الرئيسي لتدني الشرطة		
	20%	20%	0%	10%	0%	10%	35%	100%	2020	2013	مستمرة	البناء مبنى الشؤون الداخلية والأمن في الجنوب الشرقي		
	1%	10%	2%	10%	5%	5%			2022	2014	مستمرة	تعزيز قدرات أفراس وزارة الداخلية المستهدفة		
	0%	9%	0%	2%	0%	2%	42%	100%	2016	2009	4	البناء مستطير قوى الأمن الداخلي		
	0%	13%	0%	3%	0%	2%	42%	100%	2017	2013	3	البناء تامة متعددة المطاول في مركز الولاية		
		3%	8%	3%	0%	2%	92%	100%		2010	1	البناء المراكز والتحصينات لمقر مركز الولاية		
					100%	100%	75%	100%	2015	2015	1	خراب مخطات جديدة عند 2015 بوج همامي الولاية الداخلية		
	22%	21%	3%	4%	0%	0%	صفر %	مطلة على الكاب 12 (K9) الروسية الحدود	2022	2019	4	تجهيزات نوع نيسان اختصاصية لنقل الكلاب البوليسية 12 (K9) عملة (الحدود)		
	18%	13%	5%	8%	2%	4%	صفر %	مفرزة K9 عدد 80	2022	2019	4	مفرزة K9 عدد 80 (الحدود)		
	25%	8%	0%	7%	0%	7%	صفر %	100%	2022	2019	4	تشغيل معامل الاسفلت والكونكريت والكسارات وصيانتها وتلميط الطرقات الحدودية		
					100%	100%	100%	الفرع حصر 100 % لتسيار التشغيل جهات	2015	2013	4 اشهر	المقد الرقم (ع/ 66/2013) المداينة الصينية (5000) خط ZTE (مديرية الاتصالات)		
	0%	80%	0%	10%	10%	10%	0%	جهاز 16	2019	2019	1	جهاز (IMS) الثابت والمغلي ( استخبارات )		
	0%	80%	0%	10%	10%	10%	0%	جهاز 1	2019	2019	1	جهاز (TACTICAL SYSTEM SAJ3) ( استخبارات )		
	0%	80%	0%	10%	10%	10%	0%	منظومة 16	2019	2019	1	منظومة استكمال الاتصال اللاسلكي (RF) ( استخبارات )		
	0%	80%	0%	10%	10%	10%	صفر	منظومة 18	2019	2019	1	منظومة استغلال البيانات (XRY) ( استخبارات )		
	0%	80%	0%	10%	10%	10%	0%	منظومة 1	2019	2019	1	منظومة (I2N) ( استخبارات )		



	0%	5%	0%	5%	4%	5%	12	32	2020	2019	2	التأمينات الاجتماعية - حماية الدفاع المدني
	0%	5%	0%	5%	0%	5%	50%	100%	2013	2011	1	إنشاء الكتيبة الدفاع المدني في السويدية
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%	100%	2013	2012	2	إنشاء مركز الدفاع المدني بأحياء العوامات / كربلاء المقدسة
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	100%	2013	2012	2	إنشاء مركز الدفاع المدني بأحياء كمي هجر / البصرة
	0%	3%	0%	3%	0%	2%	92%	100%	2015	2012	1	إنشاء مركز الدفاع المدني بأحياء المزارعة / قضاء النجف الاشرف
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	100%	2013	2012	2	إنشاء مركز الدفاع المدني بأحياء النسيبة / السويدية
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	2013	2012	2	إنشاء مركز الدفاع المدني بأحياء النسيبة / البصرة
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%	100%	2013	2012	2	إنشاء مركز الدفاع المدني قضاء الطقة / كربلاء المقدسة
	0%	12%	0%	8%	0%	8%	72%	100%	2013	2012	1	إنشاء مركز الدفاع المدني قضاء المقداد / بغداد
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	100%	2013	2013	2	إنشاء مديرية الاموال الخاصة في قضاء الخفاجات / البصرة
							65%	100%	2014	2011	2	إنشاء كلية هندسية في جامعة البصرة
	10%	10%	0%	10%	4%	5%	صغير		2022	2019	4	شراء كلاب واستحداث شعبة الكلاب البوليسية (دفاع مدني)
					100%	100%	100%	100%	2022	2018	4	تطبيق فوهات حريق (دفاع مدني)
	30%	70%	0%	25%	4%	5%	16 عجلة اطفال	450 عجلة	2022	2018	4	تأمين خدمة GPS والياترنت سنويا لمجالات الاطفال
	0%	3%	0%	3%	0%	2%	72%	100%	2020	2010	مستمرة	إنشاء مقر مديرية شرطة بابل
	7%	10%	0%	10%	0%	6%	54%	100%	2020	2013	مستمرة	إنشاء رئاسة مديرية حماية المنشآت الحيوية في كربلاء
	100%	14%	0%	10%	0%	5%	21%	100%	2020	2009	مستمرة	إنشاء مديرية حماية مديرية الشرطة في كربلاء
					100%	100%	89%	100%	2016	2014	1	شراء الاميرة الكاسية ذات المواصفات العسكرية نوع خاص
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	100%	2016	2011	3	إنشاء مقر مديرية الشرطة في وسط
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	100%	2011	2010	2	إنشاء مراكز شرطة عند 177 في بابل
	0%	4%	0%	4%	0%	2%	90%	100%	2013	2013	1	إنشاء حاية الازقة الختامية في بابل
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	59%	100%	2014	2012	2	إنشاء موقف امنية الضباط مديرية شرطة بابل / بابل
							43%	100%	2011	2010	2	إنشاء مركز شرطة الرقة في كربلاء
	0%	14%	0%	10%	0%	5%	46%	100%	2013	2012	2	إنشاء مركز شرطة السبعا ومكتب مكافحة الامراض / كربلاء المقدسة
	0%	6%	0%	6%	0%	4%	80%	100%	2013	2012	2	إنشاء مركز شرطة الوفاء ومكتب مكافحة الامراض / كربلاء المقدسة
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%	100%	2014	2012	3	إنشاء مقر مديرية شرطة النسيبة في صلاح الدين
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	88%	100%	2013	2012	2	إنشاء مركز شرطة ابو جعفر / صلاح الدين
	0%	7%	0%	8%	0%	3%	52%	100%	2014	2011	3	إنشاء مجلس قضاء لشرطة بابل
	0%	4%	0%	5%	0%	2%	84%	100%	2014	2012	2	إنشاء مختار الكلاب البوليسية لشرطة بابل / بابل
	0%	5%	0%	5%	0%	3%	67%	100%	2015	2012	2	إنشاء مصنع لمنتجات شرطة النجف / النجف
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	100%	2012	2012	2	إنشاء مركز شرطة العاصي / البصرة
	10%	10%	8%	8%	7%	7%	60%	100%	2020	2019	سنة 2	ادخال وحدات وتشكيلات الشرطة الاتحادية دورات تطويرية لتعزيز قدراتهم على مكافحة الارهاب والتهريب المنظمة داخل المدن وفي كافة المجالات والفنون القتالية وتجهيزهم بالاسلحة والاليات الحديثة ليكونوا اكثر جاهزية واستعدادا لتسلم الملف الامني (الشرطة الاتحادية)
							0%	100%	2020	2019	مستمرة	وضع وتنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة وإزالة المخاطر المسلحة من الشوارع (جهد حكومي)
							0%	100%	2020	2019	مستمرة	وضع وتنفيذ خطة لتفليس السيخات من شوارع المدن والمناطق التي بداخلها مع تفعيل أجهزة المراقبة الرقمية (جهد حكومي)

متوسط

إعادة تنظيم قوات الشرطة الاتحادية لتمكين الوزارة من استلام الملف الأمني، وبناء قدرات الشرطة المحلية في المحافظات

متوسط

حصر السلاح بيد الدولة وإزالة المخاطر المسلحة من الشوارع

متوسط

تفليس السيخات من شوارع المدن وتحويلها الى مداخلها مع تفعيل أجهزة المراقبة الرقمية

	0%	40%	0%	35%	20%	25%	0%	100%	2020	2019	مستمرة	وضع وتنفيذ خطة لتأمين مراكز المراقبة الوبائية بكل محافظة وربط كاميرات المحافظات بسيطرة مركزية وربطها بمقر وكالة شؤون الشرطة (جهد حكومي)	متوسط - تطوير	تأمين مراكز المراقبة الوبائية بكل محافظة وربط كاميرات المحافظات بسيطرة مركزية وربطها بمقر وكالة شؤون الشرطة
					100%	100%	40%	100%	2019	2018	1	مشروع قانون المرور الجديد	سريع	تفعيل أنظمة المرور وإعادة فرضها
	10%	20%	30%	30%	50%	50%	0%	100%	2020	2019	مستمرة	وضع وتنفيذ خطة لفتح المنطقة الخضراء وإدماجها في حركة المرور تدريجياً (جهد حكومي)	متوسط	فتح المنطقة الخضراء وإدماجها في حركة المرور تدريجياً
							0%	100%	2020	2019	مستمرة	وضع وتنفيذ خطة للتوسع في فتح المناطق المغلقة في المحافظات تدريجياً وعودة الحياة الطبيعية اليها (جهد حكومي)	متوسط	التوسع في فتح المناطق المغلقة في المحافظات تدريجياً وعودة الحياة الطبيعية اليها

# وزارة الكهرباء

## المحور الثالث: الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية

الملاحظات	كامون الأول - 2019		تحويل - 2020		تيسار - 2021		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الأبحاث	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتقييم	فترة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
	0	250	250	250	750	1000	2500	7417	2022	2019	4	مشروع الاستثمار الخاص في قطاع الانتاج (IPP)	لم تحدد	العمل فوراً لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتخفيف وطأة نقص الكهرباء خلال صيف 2019 والدمج بين حلول كلية طويلة الأجل وحلول محلية قصيرة الأجل خصوصاً في المناطق الفقيرة والمعزومة
	30%	30%	15%	35%	35%	35%	0	1571	2021	2019	3	مشروع تأمين محطات الانتاج المتولفة والعامسة التي تحتاج الى تأمين	لم تحدد	البدء فوراً ببناء القدرات الكهربائية المحلية لتزويد المناطق الأكثر محرومية وفقراً والأكثر نقصاً بالكهرباء، وذلك خارج الخطة الوطنية لتعظيم الكهرباء والطاقة
	2	2	1	2	6	6	0	10	2019	2018	6 اشهر	مشروع تنفيذ الدراسات ومخططات التشغيل في شركات النقل قبل الاتجار والتي ستدخل العمل قبل صيف 2019	لم تحدد	تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لزيادة طاقة الانتاج والنقل والتوزيع وفق أولويات وسياس متدرج ومتصاعد لتحقيق الاكتفاء خلال سنوات الخطة
	0	30%	0	35%	0	35%	0	7970	2022	2019	4	مشروع اكمال مشاريع انتاج الوزارة المتوقفة والتفويضة حسب خطة الوزارة (التصميم وحدات بخارية وغازية)	سريع	متابعة العقود المعدة للتوقيع مع شركات عالمية لزيادة كفاءة وسعة الانتاج في الطاقة الكهربائية والاسراع بذلك ومراعاة الجانب التعاقدى لصالح العراق
	0	50%	5%	30%	20%	20%	0	1000	2021	2019	3	مشروع الطاقات المتجددة	سريع	الاهتمام بالطاقة البديلة والنظيفة لانطلاق العراق طاقات كبيرة في هذا المجال، وإن يكون هذا الاهتمام من اولويات الجامعات والاكاديميات العلمية العراقية ووزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط وغيرها، وتشجيع اللجوء الى الغاز والطاقة البديلة والنظيفة تماماً ايضاً أمكن ذلك. والسعي لإضافة (7000) ميكا واط من الطاقة النظيفة (الشمسية وغيرها) في نهاية السنة الثانية من عمر الحكومة وبمعدل (500) ميكا واط لكل سنة وتعتبر هذا مشروعاً ريادياً (pilot plant) تم بوضع ميثاقاً متبعاً للسنتين القادمة لوقف التلوث وللحاق بركب العالم وتنفيد اتفاقات المناخ
	0	0	0	0	0%	0%	0	50	2019	2019	1			
	0	0.25	10%	0.25	0.5	1	0	8	2022	2019	4			
	0%	35%	6%	35%	30%	30%		16	2019	2018	6 اشهر	مشروع تنفيذ مشاريع المرحلة ضمن خطة الطوارئ لتقليل استهلاك قطاع النقل تنفيد مشاريع قريش شركة ABB السعودية		

												متوسط طويل	احتمال نواقص نقل القدرة الكهربائية بالتوازي مع التطور الذي يحصل في منظومة الانتاج وذلك بإضافة خطوط نقل وخطوط احتياط لمنع انهيار الشبكة المعالج في المحافظات المختلفة
	5%	5%	2.50%	5%	5%	5%	محطة 39	2022	2019	4	مشروع تطوير وتوسيع شبكات النقل على التدرج المتوسط والبعيد من خلال الفروع المتمثلة بالآلماني والياباني المرحلة الثانية والثالثة وقوس (SIEMENS 1-2) قوس (TSE) لقطاع النقل - قوس (2-1) قوس		
	2%	2%	0	2%	4%	4%	0%	30%	2022	2019	4	مشروع وضع آلية لإدارة الطلب	اعداد نظام عملي لتقليل الهدر الحاصل في نقل الطاقة الكهربائية على ان يبدأ التخفيض منذ السنة الأولى وهكذا لبقية السنين الأربع
	16%	16%	0	18%	19%	19%	20%	5%	2022	2019	4	مشروع وضع آلية للحد من التجاوز على الشبكة وتخفيض نسبة المتجاوزين بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية	
	40%	40%	10%	40%	10%	20%	0%	100%	2019	2019	1	تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارة مع وزارات الصحة والبيئة والزراعة وادارات المحافظات لدراسة امكانية تحديث المسافات المحددة للمحرمات بما يسمح لتسهيل المرور الى الخطوط وسياتها بالحد الأدنى من المحرمات	تقليل مسافات محرمات نقل الطاقة لمسافات معقولة وذلك لزيادة المساحات الزراعية ولتنتج حرمان المواطنين من استغلال اراضيهم بالشكل الامثل وتشمل المنشآت الزراعية والصناعية ومواقع الخزير التجاري وتعرض المحددات للدراسة
	30%	30%	26%	24%	46%	46%	16	20	2022	2019	4	مشروع تنفيذ المشاريع المطلوبة لتكديس الاعتمالات واستيعاب الطاقة التي سيتم تصريفها من خلال شبكات التوزيع وجزء من قوس (SIEMENS 2) المرحلة الثالثة - توزيع	اكتمال نواقص شبكات التوزيع المنتشرة في المحافظات كافة.
	0	10000	0	10000	10006	10200	1380	5250200	2022	2019	4	مشروع اكمال العدادات الذكية من خلال خارطة طريق (SIEMENS) على الاعداد الطويل	اعتماد العدادات الذكية وعبر البطاقات الالكترونية بما يسمح بالسيطرة على العيديات وعدم التلاعب بالتوقيعات او مدد الفواتير. مما يضاعف احياناً من الاسعار. وكذلك تحميل المقتدرين والمقاليين باستخدام الكهرباء بدفع كلف اعلى. وتقليلها عن ذوي الدخل المحدود او حتى منحها بشكل مجاني لمن هم تحت خط الفقر بحسب البيانات
									2022	2018	5	مشروع عقود الخدمة والعيابة	
									2019	2018	2	مشروع تجهيز عدادات ذكية من شركة (LSIS)	
	4%	5%	0%	5%	10%	10%	70%	2019	2019	سنة اشهر	تقديم مقترح لتعريف جديدة بعد دراسة التعريف الحالية وان تغطي التعريف الجديدة نسبة 70% من التكلفة الحقيقية.	تخفيض اجور الكهرباء للاستخدام الصناعي والزراعي وربط هذا التخفيض بالزيادة الحقيقية للإنتاج. وذلك لدعم قطاعات الانتاج الحقيقية ورفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية	

## وزارة المالية

### المحور الرابع: تقوية الإقتصاد

الملاحظات	كانون الأول - 2019		نوفمبر - 2019		أكتوبر - 2019		الواقع الحال (عدد أو نسبة)	المستهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الانجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتصديق	فترة البرنامج الحكومي
	التحقق	المستهدف	التحقق	المستهدف	التحقق	المستهدف								
	5%	0%	28.62%	54%	16%	16%	30%	100%	2019	2018	1	التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة ضمن اتفاقية البنك أولاً تحديثات استثنائية لمرحلة متطلبات وأعداد وثيقة نظام IFMIS والتحليل الفني والمالي وسدلاً إلى الإزالة وتوقيع العقد مع مورد نظام IFMIS	سريع	إعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبلاد وتحولها من متوالية عديدة إلى أرقام تقابلها أهداف تنموية واضحة ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية والعمل أن تكون موازنة 2020 موازنة مشاريع واداء والسعي لتقديم حسابات الأرباح والخسائر والحسابات الختامية بدءاً من سنة 2019
	0	20%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	3	التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة ضمن اتفاقية البنك للبناء والتصميم وتجهيز والتدريب والتشغيل لنظام IFMIS		
	0	20%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	3	التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة ضمن اتفاقية البنك كإجراء خدمات استشارية للاشراف على تنفيذ نظام IFMIS		
	0	20%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	2	تطوير الخدمات في مجال الإدارة المالية العامة		
	20%	30%	40%	0	0	0	0%	100%	2020	2019	2	تحديث التدقيق الداخلي لوزارة المالية		
	0	20%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	3	تحديث الإدارة المالية العامة على المستوى المحلي (اللامركزي) إلى محافظتين بغداد وبابل		
	0	10%	5%	15%	1.40%	5%	11%	100%	2021	2017	5	إدارة المشروع وتنسيق الاستشارات		
	20%	40%	30%	30%	20%	30%	0%	100%	2019	2019	1	النظام المصرفي الشامل - استخدام شركات استشارية لأعداد وثيقة العمل (RFP) واختيار أفضل منها وحسب المعايير الفنية المعتمدة من قبل البنك المركزي		
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	2020	2020	1	الكمال وثيقة العمل (RFP) وأعداد دراسة شاملة لعمل المصرف من قبل الشركة الاستشارية		
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	2022	2021	2	البدء بالبناء البنية التحتية لكافة فروع المصرف مع الإدارة العامة		
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	2022	2021	2	ربط كافة الفروع بعدة الخواديم الضوئية المجربة من قبل وزارة الاتصالات بما يوفرو وسط سري وأمن في لتداول البيانات		
	5%	15%	20%	15%	0	0	40%	100%	2020	2017	4	النظام المصرفي الشامل		
	9%	45%	12%	10%	30%	40%	25% من المشروع 3%	100%	2021	2018	4	إقتناء النظام الشامل 1- يتضمن العقد الاستشاري - عقد الإقتناء للنظام		
	13%	52%	18%	20%	17%	20%	من المشروع	100%	2022	2019	4	إقتناء النظام الشامل 2- مركز البيانات ومركز التحليل من الكوارث		
	0	50%	0	20%	0	0	0%	100%	2020	2019	2	إقتناء النظام المصرفي الشامل إضافة إلى العقد الاستشاري		

الانتقال من فئمة ان الاقتصاد هو مجرد تعظيم موارد الخريزة والحصول على القطع الاجنبي الى ان الاقتصاد هو اولاً تعظيم الموارد الوطنية والتابع الوطني الاجمالي وتعزز دور العملة الوطنية ومعارية البطالة والغلاء وانتشال الشعب من الفقر والجبل والمرض والخوف فكم من صبرية او مورد للخريزة هو ضرر على الاقتصاد الوطني والعكس ليس صحيحاً اطلاقاً فالاولوية للاقتصاد الوطني وتعصير شروط عيش المواطنين وعدم الاكتفاء بزيادة موارد الخريزة على حساب تراجع الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحقيقية

لم تتحدد	6	2019	2025	0%	5%	3%	0%	خمس منافذ مهمة هي الاعلى ايراداً	تعديت وثمة الكمارك فقد تعلق الامر بالهيئة العامة للكمارك كونها الجهة التنفيذية للقوانين والقرارات من الجهات التشريعية ومجلس الوزراء الموقر فان المشروع اعلاه (تعديت وثمة الكمارك) يشغل في مراحله عدة اهداف تسهم في تعظيم الموارد الوطنية من ضمنها 1- تاهيل البنى التحتية اللازمة للمراكز الكمركية المتطورة الزيادة كمنائها وطاقتها الاستيعابية . 2- توفير اجيزة ومعدات الكشف الكمركي 3- تعديت الاطار التنظيبي لتيسيط وتنسيق الاجراءات الكمركية والاجراءات الشكالية بما في ذلك تفعيل الصورية الكمركية . 4- رفع المقرة للموظفين وشرحة من المستودين عن طريق انشاء اكااديمية الابداع الكمركي لتزويدهم بمعارف ومهارات جديدة
متوسط	5	2019	2023	0%	5%	3%	0%	100%	النظام الضريبي الالكتروني الشامل
لم تتحدد	4 اشهر	2019	2019	0%	0	0	0	100%	النظام الخاص بتشغيل المركبات مع دائرة المرور
متوسط	4	2019	2025	100%	15%	13%	15%	100%	التصنيفات الشهرية
	4	2019		100%	15%	15%	15%	100%	التسهيلات المصرفية القطاع الخاص
	4	2019		100%	0%	26%	26%	300	اسكان منتسبي المصرف 25 سنة
	15	2019							فروض اسكان دوائر الدولة (100) راتب
	5	2019		100%				1000	فروض الدرجات العامة
	10	2019						3000	فروض اسكان المواطنين في المناطق المحررة
	10	2019		100%	10%	7%	5%	1000	اسكان مواطنين (50) مليون
	15	2019		38%	20%	20%	20%	5000	فروض مشروع بحماية
	5	2019	2024	63%	15%	12%	5%	2000	مهارات الشركات
	3	2019	2022	65%	0	0	0	5000	فروض المشاريع الصغيرة بالدينار
	3	2019	2022	17%				500	فروض المشاريع الصغيرة بالدولار
	4	2019	2023	16%	20%	10%	20%	100%	فروض تجارية صلاحية الادارة العامة (15/200) (200 فما فوق)
	4	2019	2024	33%	15%	0	15%	100%	فروض الاطباء والصيدالة
	4	2019	2024	8%	25%	0	20%	100%	فروض تفجير حريق الكرازة والشورجة
	4	2019	2021	100%	5%	1	15%	100%	تمويل البحوث العلمية
	4	2019	2024	49%	8%	0	15%	100%	القروض التشغيلية (مدارس ورياض الاطفال والجامعات الاحلية)
	4	2019	2020	7%	5%	0	20%	100%	القروض التشغيلية لاصحاب الفنادق
	3	2019	2021	0%	20%	0%	35%	21000	1-فروض اسكان (بناء وحدة سكنية + اضافة بناه + شراء وحدة سكنية
	4	2019	2022	0%	10%	5%	40%	10	2-فروض استثمارية تمويل مشاريع المجمعات السكنية
	5	2019	2023	0%	20%	5%	40%	5000	3-فروض سيارات
	5	2019	2023	0%	20%	5%	30%	2500	4-فروض اسكانية بفائدة بفائدة 6%
	4	2019	2022	0%	9%	12%	8%	5000	منح القروض للمشاريع الصناعية والتجارية
	4	2019	2022	37%	10%	0	20%	100%	اولامنج قروض 50% من القطاع الحكومي
	4	2019	2022	18%	20%	19.30%	20%	100%	ثانياً قروض المواطنين
	4	2019	2022	16%	15%	8.80%	10%	100%	ثالثاً القروض الاستثمارية (التسهيلات)
	4	2019	2022	0%	10%	0	20%	100%	رابعاً قروض المحافظات المتضررة
	4	2019	2022	45%	15%	17.40%	20%	100%	خامساً منح مبلغ 50 لكافة فئات المجتمع
	4	2019	2022	0%	10%	7.20%	10%	100%	فروض المبادرة الزراعية
	4	2019	2022	0%	10%	17.30%	10%	100%	فروض البنك المركزي
	4	2019	2022	0%	10%	2.10%	10%	100%	فروض الموارد الذاتية - زراعية

2%	15%	3%	0%	3%	5%	0%	0%	2025	2019	6
0	15%	3%	0%	3%	5%	0%	100%	2023	2019	5
0	100%	0	0	0	0	0%	100%	2019	2019	4
20%	15%	13%	15%	12%	15%	100%	100%	2025	2019	4
19%	4%	15%	15%	15%	15%	100%	100%		2019	4
22%	0%	26%	0%	26%	26%	100%	300		2019	4
									2019	15
						100%	1000		2019	5
							3000		2019	10
10%	2%	8%	5%	7%	10%	100%	1000		2019	10
23%	3%	20%	20%	20%	20%	38%	5000		2019	15
13%	5%	8%	5%	12%	15%	63%	2000	2024	2019	5
34%	20%	14%	14%	0	0	65%	5000	2022	2019	3
						17%	500	2022	2019	3
15%	5%	10%	20%	10%	20%	16%	100%	2023	2019	4
18%	8%	10%	15%	0	15%	33%	100%	2024	2019	4
9%	4%	5%	20%	0	25%	8%	100%	2024	2019	4
15%	10%	5%	15%	1	5%	100%	100%	2021	2019	4
22%	15%	7%	15%	0	8%	49%	100%	2024	2019	4
20%	20%	0	20%	0	5%	7%	100%	2020	2019	4
0	45%	20%	35%	0%	20%	0%	21000	2021	2019	3
60%	50%	35%	40%	5%	10%	0%	10	2022	2019	4
0	40%	0	40%	5%	20%	0%	5000	2023	2019	5
50%	50%	45%	30%	5%	20%	0%	2500	2023	2019	5
13%	8%	2%	8%	12%	9%	0%	5000	2022	2019	4
0	20%	13.10%	20%	0	10%	37%	100%	2022	2019	4
8%	20%	3.90%	20%	19.30%	20%	18%	100%	2022	2019	4
10.30%	25%	5.40%	10%	8.80%	15%	16%	100%	2022	2019	4
0	20%	0	20%	0	10%	0%	100%	2022	2019	4
52.00%	25%	20%	20%	17.40%	15%	45%	100%	2022	2019	4
4.90%	5%	17.25%	10%	7.20%	10%	0%	100%	2022	2019	4
12.80%	5%	18.20%	10%	17.30%	10%	0%	100%	2022	2019	4
3.16%	5%	2.03%	10%	2.10%	10%	0%	100%	2022	2019	4

	17.42%	5%	6.74%	10%	1.40%	10%	0%	100%	2022	2019	4	فروض الموارد الذاتية - تجارية
	0.90%	15%	3%	10%	0	0	0%	100%	2022	2019	4	فروض الموارد الذاتية - سيارات زراعية
	6.50%	5%	21.36%	10%	14.80%	10%	0%	100%	2022	2019	4	فروض الموارد الذاتية - فروض سلف موظفين
لم تحدد	0	0	0	0	100%	100%	97%	100%	تشرين 2018	أب 2018	3 اشهر	اعداد السياسات والخطة الاستراتيجية للمصرف لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات حسب متطلبات البنك المركزي العراقي بموجب العقد المبرم مع شركة القواسمي وشركاه (KPMG)
	12%	30%	20%	30%	0	0	40%	الحصول على الشهادة	2019	2017	3	التعاقد مع شركة متخصصة لتطبيق المعايير الدولية لادارة العودة والحصول على شهادة (ISO) العالمية
	0	33%	0	33%	34%	34%	فروعين	10 فروع	2021	2016	6	توسيع شبكة المصرف من خلال فتح فروع ومكاتب في بغداد والمحافظات
	0	15%	5%	15%	5%	10%	مليار 175	500 مليار	2019	2017	1	تبرئة رأسمال المصرف الصناعي
	0	5%	0	0	0	0	95%	100%	2019	2016	1	تعديل النظام الداخلي واستحداث اقسام وتبويب جديدة في المصرف الصناعي
	14.10%	15%	2.70%	10%	51.20%	60%	50% من المشروع	100%	2022	2019	4	هيكلية المصرف وتنظيم اولا الهيكلية المالية
	3%	8%	0	2%	61%	60%	60% من المشروع	100%	2022	2019	4	ثانيا هيكلية الرقابة والمخاطر
	10%	10%	0.70%	5%	54.30%	55%	50 % من المشروع	100%	2022	2019	4	ثالثا هيكلية النظام الداخلي وبناء الفدرات
	35%	25%	10%	10%	4.20%	15%	50% من المشروع	100%	2021	2019	4	رابعا الهيكلية التشغيلية وتطوير البنى التحتية
	0	40%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	3	هيكلية المصرف الزراعي التعاوني
	66%	33%	33%	33%	34%	34%	0%	3003500	2022	2017	4	نظام البطاقة الالكترونية (master card)
لم تحدد	34%	25%	19.60%	10%	5.40%	15%	10% من المشروع	100%	2022	2019	4	اصدار بطاقة الماستر (النخل)
	6%	12%	10%	10%	8%	8%	70%	100%	2019	2017	3	مستحقات المقاولين العصر الاول
لم تحدد	0%		3%	0%	0%	0%	40%	100%	2020	2018	2	مستحقات المقاولين العصر الثاني قرار مجلس الوزراء 261 لسنة 2018
لم تحدد	8%	10.80%	4%	10%	7.20%	8%	0%	100%	2020	2015	5	مشروع ممرات النقل
	8%	8.60%	6.40%	7%	7.40%	8%	0%	100%	2020	2015	5	مشروع عمليات التنمية الطازية
	0%	8%	0%	7%	0%	5%	0%	100%	2023	2018	5	مشروع تجهيز المياه والمصرف الصناعي / بغداد
	3%	10%	0%	8%	2%	5%	0%	100%	2023	2018	5	فروض صندوق التنمية الاجتماعي
	0%	6%	5%	4%	0%	3%	0%	100%	2023	2018	5	مشروع دعم الاستقرار والعمود
	4%	5%	1%	4%	0.50%	2%	0%	100%	2023	2018	5	مشروع عمليات التنمية الاضائي 2/

المصارف عملة التنمية والواسطة الاساسية لحشد رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية لتمويل المشاريع في شتى المجالات. وان عملاً أساسياً يبقى مطلوباً للهبوط بالقطاع المصرفي في مجانبه العام والخاص. واصمية وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في دعم المصارف والربح بمسئولياتها لتسطيع القيام بدورها في التنمية وعدم الاعتماد في وجودها على عمليات مزاد العملة وصرفها وما لم تعبر هذه المهمة فان الاختناق سيمتد كسمة اساسية للاقتصاد الوطني

المنى للانتقال من اقتصاد العملة الورقية الى اقتصاد العملة الرمزية والالكترونية. والسعي لسحب الاموال المجمدة حالياً خارج الدورة المصرفية وادخالها الى الدورة لتقديم الحوافز والضمانات لتحقيق هذا الغرض والسعي لتحريك الاموال المجمدة في المصارف الحكومية والاهلية لغرض تنشيط شتى النشاطات الاقتصادية والاجتماعية

تقسيم كمية تسديد مستحقات المقاولين خلال مدة 3 اشهر للإيفاء بحقوق المواطنين وتنشيط القطاع الخاص وتنجيحه على انجاز الكثير من المشاريع المعطلة

حرفية الربح الداخلي والخارجي والتعلولة دون تجاوزه مستويات معينة. وربط تدفون الداخلية والخارجية بالمشاريع الاستثمارية والمولدة للقيم والتروات وعدم استخدامها للأغراض الاستهلاكية أو الأغراض الترفيهية للموازنة اساساً

	2%	4%	2%	3%	3%	2%	0%	100%	2018	2008	10	مشروع ناهيل محطة المسيب الكهربائية	
	0.53%	1%	0.92%	1%	6%	4%	0%	100%	2021	2008	10	مشروع إعادة ناهيل مهمل الأسمدة / خور الزبير	
	1%	2.80%	3%	2%	0.20%	1%	0%	100%	2021	2008	10	مشروع تسهيلات تصدير النفط الخام	
	1.29%	4%	4%	3%	9%	7%	0%	100%	2021	2008	10	مشروع تطوير ماء البصرة	
	8.29%	10%	5%	8.60%	8.40%	8%	0%	100%	2022	2012	10	مشروع محطة ذرلوك الكهربائية	
	0%	10%	1%	7.50%	2.50%	4%	0%	100%	2022	2012	10	مشروع إعادة اعمار قطاع الصحة	
	0.05%	70%	0.10%	3.80%	0.20%	10%	0%	100%	2022	2012	10	مشروع تحديث مصفى البصرة	
	2.04%	0%	1%	0%	10.50%	5%	0%	100%	2024	2014	10	مشروع ناهيل المواني - 2 /	
	1.30%	0.60%	0.10%	0.50%	0.90%	0.50%	0%	100%	2020	2015	5	مشروع كهرباء الهائلة 1/	
	0.34%	3%	0.16%	2.30%	0.70%	1%	0%	100%	2021	2015	6	مشروع اعمار الكهرباء 2/	
	0.90%	4%	0%	3%	0%	1%	0%	100%	2022	2017	5	مشروع اعمار الكهرباء 3/	
	23%	8%	0.43%	6.50%	4.50%	5%	0%	100%	2022	2017	5	مشروع كهرباء الهائلة 2/	
	4.60%	2%	2%	1%	3%	2%	0%	100%	2024	2018	6	مشروع ماء البصرة 2/	
	0%	3%	0%	2%	0%	1%	0%	100%	2025	2018	7	مشروع قطاع الري 2/	
	6.03%	0.50%	3.20%	0.50%	22%	13%	0%	100%	2022	2017	5	مشروع إعادة البنى التحتية للكهرباء في المناطق المحررة 1/	
	0%	15%	4.80%	10%	0%	5%	0%	100%	2023	2018	5	مشروع إعادة البنى التحتية للكهرباء في المناطق المحررة 2/	
	0%	7%	0%	5%	0%	2%	0%	100%	2023	2018	5	مشروع إعادة اعمار الطرق والجسور والمجاري في نينوى	
	18%	6%	7%	4%	1.80%	2%	0%	100%	2019	2017	5	قرض مشروع ناهيل محطات الكهرباء / HBIC	
	25%	8%	13%	7%	3%	5%	0%	100%	2023	2018	5	توزيع اراضي سكنية للمواطنين	لم تحدد
	الانسجام مع السياسة الجديدة لتوزيع الأراضي على المواطنين وكذلك تشجيع تحويل الأصول والاموال والموجودات المجمدة والميتة الى اصول متحركة وناشطة ومولدة للقيم والثروات												

# وزارة التخطيط

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	كانون الأول - 4		نور - 3		نيسان - 2		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	الهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الأعمار	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فترة البرامج الحكومي
	المتعلق	الهدف	المتعلق	الهدف	المتعلق	الهدف								
	10%	10%	20%	20%	20%	20%	50%	100%	2020	2019	1	تحديث دليل أسس إعداد دراسات الجدوى	سريع	إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية التي تقدم من قبل الدوائر المختلفة للمشاريع المعدة ضمن الموازنة العامة للملاذ وحملها دراسة حقيقية لا تخضع للمعاملة للأملاب السياسية والاجتماعية أو لأهداف ليس لها علاقة بالتنمية الشاملة
	1%	50%	10	10	0	0	4%	100%	2022	2018	5	مشروع ادارة الإستثمارات العامة والمشتريات العامة على المستوى الاتصادي / فرض البنك الدولي أ- ادارة الإستثمارات العامة وتشمل ( مشروع تحديث نظام ادارة التنمية العراقية IDMS ، فهمم الاحتياجات ، تطوير قدرات مشروع PIM في التصاميم والاختيار والتقييم ، تطوير الدليل والمهنية ب- ادارة المشتريات العامة ويشمل ( مشروع انشاء الخفية الالكترونية الموحدة للتعاقد الحكومية في العراق ، التعلم عن بعد	سريع	التكامل مع وزارة المالية في تحقيق التنمية الشاملة من خلال الأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة للملاذ وتشجيع نشاطات القطاع الاهلي الخاص ، وتطوير عمل الوزارة كليا لتتبع دورها في التخطيط الاستراتيجي الكلي والجزئي ، والسعي لأن تكون الموازنة الاستثمارية لعام 2020 موازنة مشاريع وأداء
	5%	5%	10%	10%	10%	10%	0%	100%	2022	2018	4	متابعة تنفيذ خطة التنمية الوطنية 2018-2022		
	5%	5%	10%	10%	10%	10%	0%	100%	2022	2018	4	متابعة تنفيذ استراتيجحة تطوير القطاع الخاص 2018-2022		
	10%	10%	17%	20%	35%	35%	35%	100%	2019	2018	1	اعداد استراتيجية للتنمية الحضرية للمعالمات		
	3%	3%	2%	3%	3%	9%	75%	100%	2020	2016	5	تعزيز التنمية الريفية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء		
	8%	8%	3%	8%	2%	9%	0%	100%	2022	2019	4	اعداد الاستراتيجية شاملة التنمية الريفية للمعالمات التي تم اصدار المصح فيها		
	8%	8%	7%	8%	5%	9%	25%	100%	2021	2018	4	بناء قاعدة بيانات مكانية لمواقع الماني لجميع القطاعات في المحافظات كافة واعداد الاطلس التكنية لها على مستوى الاقضية والدواي		
	5%	5%	10%	10%	10%	10%	0%	100%	2022	2014	مستمر	تحديث قاعدة بيانات مؤشرات التنمية التكنية في المحافظات على مستوى الاقضية والدواي		
	5%	5%	10%	10%	10%	10%	0%	100%	2022	2018	مستمر	بناء رؤية العراق (2030) للتنمية المستدامة ومواءمها مع المخطط الاستراتيجية الوطنية		
	61%	61%	6%	17%	5%	17%	5%	100%	2019	2018	2	مشروع دعم تطبيق اللامركزية والتنمية المحلية في العراق الملاد بين الوكالة الألمانية بالتعاون الدولي وهيئة التنسيق بين المحافظات بوزارة التخطيط		
	0.30%	0.30%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	99%	100%	2019	2014	5	متابعة تشريع قانون التخطيط العمراني وتحديث قانون البلديات والاتصال العامة		
	28%	28%	35%	35%	35%	35%	2%	100%	2019	2018	1	مشروع تحديث أراضي خارج التصميم الأساس لمراكز المحافظات لتكون متن جديدة مع وزارة الامعار والإسكان والبلديات والاتصال العامة لغرض توزيعها لأراضي سكنية للمواطنين		

	8%	10%	5%	5%	3%	5%	20%	100%	2022	2018	4	متابعة والتدريب وتمويل الأنشطة والمشروع المنصوص عليها في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2018-2022 (التي تكونت من 6 محصلات) التي تكونت من 32 نشاطاً	
	10%	10%	5%	5%	2%	5%	20%	100%	2022	2018	4	متابعة والتدريب وتمويل وتنفيذ الأنشطة والمشروع ضمن الموازنة الجارية في المحافظات المحررة والمحافظات التي تواجه أزمات طارئة	
	8%	11%	3%	3%	2%	2%	0%	100%	2022	2018	4	إنشاء صندوق اجتماعي للتنمية	
	20%	20%	10%	10%	10%	10%	30%	100%	2021	2018	3	مشروع السج الكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق	
	55%	55%	5%	5%	15%	15%	25%	100%	2020	2019	2	مشروع مسح الفتوة والشباب	
	10%	10%	10%	10%	10%	10%						السياسي الى ان تكون الموازنة الاستثمارية لعام 2020 موازنة مشاريع واداء	
	0	300	500	500	500	500	800	5200 مشروع	2022	2018	4	فحص وتقييم المشاريع التي تزيد كلفتها عن 12 مليار	حسم موضوع آلاف المشاريع الاستثمارية المعطلة والمفددة حزيناً والتي تتجاوز قيمتها تريليونات الدنانير
	487	487	500	500	313	313	1200	5600	2022	2019	4	ان المنظمات التي تحكم سير عملية التقييم وتصنيف الشركات قد صدرت عام 2015 وبالتحديد في 13/7/2015 وان جميع الاجراءات سليمة وغير معقدة ولا توجد حاجة ملحة لفرض تعديلاتها سواء موضوع بوفر شروط الآليات وعليه ترى وزيرتنا بان التعديلات المقترحة لا تحتاج الى تعديل في الوقت الحاضر	سرعة اعادة النظر بشروط احوالة المفاوضات واعتماد عوامل محددة غير قابلة للتأويل لفرض منع الفساد والاتفاق المبرق مع الفاسدين. وكذلك بتصنيف الشركات واعتماد معايير محددة تشمل كفاءة الشركة وعلاقتها المالية وجرياتها وتاريخها ومجالس ادارتها. وغير ذلك
<b>المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي</b>													
<b>ت- مكافحة الفساد والهدر العام</b>													
	3%	3%	9%	9%	8%	8%	0%	100%	2022	2018	4	إصدار التشريعات الجديدة ومراجعة التشريعات الناقذة وفق نظرية تحليل الأثر التشريعي والتي تترتب على إصدار التشريع	متوسط وضع معايير. و/أو تفعيل قوانين وألظمة عمل نافذة، للوصول الى مواصفات ومعايير واضحة لوصف جميع الوظائف والعمود. والاتصال والتخراط والمخططات والأنظمة والاجازات والاعمال والمشاريع والسافرات والمخالفات والتطبيقات وغيرها، بما يتناسب مع المعايير المعمول بها في اغلب دول العالم. وعدم ترك الامور للاجتهادات او لفوضى الأبتزاز والفساد والتطبيقات البالية ومختلفة لتنظيم الحياة العامة في كافة الشؤون والمصالح. ولتتمسك للمعايير والمصالح الخاصة والعامة حماية حقوقهم بمبدأ عن التلاعب وعن المراجعة والرشاوى وتعميق المسؤولة او التحكم والمتمسك بمعايير المهنية

## وزارة التجارة المحور الرابع : تقوية الإقتصاد

الملاحظات	كانون الأول - 4		تموز - 3		يناير - 2		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المتهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الاعجاز	تاريخ بداية التنفيذ	المدة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المتهدف	المتحقق	المتهدف	المتحقق	المتهدف								
					90%	90%	10%	100%	أذار 2019	أول شهر 2018	اربعة اشهر	دراسة وضع المظافة التعمومية ومبرداتها والشرائح الأساسية المستخدمة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع أي فساد او هدر وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير العديد من مبرداتها	سريع	دراسة وضع المظافة التعمومية ومبرداتها والشرائح الأساسية المستخدمة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع أي فساد او هدر وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير العديد من مبرداتها
	0	17%	0	5%	0	0		53%		2008	5	الامتثال الانشائية لعمليتي الكومرة والشاشية		
	0	5%	0	5%	0	0		90%		2012	1	انشاء خلية الرقابة التجارية والذاتية في المنى		
	0	10%	0	12%	0	0		34%		2012	3	انشاء مجمع مغربي في ديار		
	0	0	0	0	0	0		62%		2009	3	انشاء مجمع مغربي في الدياينة		
	0	1%	0	1%	0	0		98%		2009	3	انشاء مجمع مغربي في دي فاد		
	0	0	0	0	0	0		25%		2007	3	انشاء خلية جديدة تفر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ساحة منظر		
	4%		1%	5%	0	0				2007	6	اعادة تفعيل سائلو التزوية		
	12%	15%	0	5%	0	0				2013	2	القيام سائلو مغربي في محافظة كركلاء		
	13%	15%	0	5%	0	0				2013	2	انشاء سائلو مغربي في محافظة دي فاد		
	0	5%	0	0	0	0				2011	6	استواء وضبط معدات كيرة ميالكه في خان صفاق		
	0	0	0	0	0	0				1998	7	المظافة القرنية الاساسية		
	5%	10%	0	5%	0	0				2010	6	اعادة تفعيل السائلات ذات الطاقات القرنية العالية		
					0	0					4	انشاء سائلو كوكريكين في محافظة واسط		
	0	15%	0	5%	0	0				مستمر		توسيع مظافت الكومرة من المهنسة		
									فيضان 2019	تشرين الأول 2018	6 اشهر	تسهيل اجراءات منح اجازات تأسيس الشركات بأشكالها المختلفة . ومنع ازدواج الرسوم على التجار.	لم تحدد	تسهيل اجراءات منح اجازات تأسيس الشركات بأشكالها المختلفة . مع استثناء ما يستوجب موافقات خاصة ، وعرض الشروط المطلوبة لتأسيس المشاريع ليهوم صاحب المشروع بتوفيرها وتصبح الاجارة مفرقة من حيث الأساس ان توفرت هذه الشروط ، وتكون مع اجازات الاستيراد والتصدير لتصنيف واحد من السلع والغاء التكرار والاعتماد من التعقيد في تعريف الاجازات لتقليل الهدر في الزمن وجماعة التجار الجرافيين من الفساد والبيروقراطية . مع مراعاة منع ازدواج الرسوم على التجار لغرض الابتزاز . والحرص على التكاثل مع ديوان الرقابة المالية ومهيئة التزامة لفحص وتدقيق الرسوم التي تفرض على التجار واصحاب المهن الكبار والصغار من قبل الغرف التجارية .
	30%	25%	30%	25%	20%	25%	0%	100%	2019	من تاريخ منح التصحي ص	1	اعتماد الرشقة الالكترونية	سريع	
					10%	10%	90%	100%	2019	2016	ستة اشهر	منظومة الكترونية لاصدار اجازات وهويات الاستيراد تربط بكل الاقسام ( الرقابة ، التدقيق المالي ، الحاسبة )	سريع	فتح نافذة الكترونية تعاطل الشركات المنتجة التي يتم الاستيراد منها للخراق بعرض تدقيق المنشأ ومواصفات التصاعة وتقرير فحصها في بلد المنشأ ويمكن لوزارة التجارة ان تأخذ عينة من أي بضاعة مشكوك بها وفحصها من قبل شركة فاحصة داخل الخراق على ان لا يتم حجر البضاعة وتلفها في المخازن عند المنافذ الحدودية
	30%	10%					0%	100%	2020	2019	1	منظومة الكترونية لاصدار اجازات وهويات الاستيراد تربط بكل الاقسام ( الرقابة ، التدقيق المالي ، الحاسبة ) وكذلك المنافذ الحدودية . الوزارات ذات العلاقة بالمواد المصدرة اضافة الى الجهات الامنية لغرض الحصول على الموافقات الكترونياً	سريع	
			25%	25%	75%	75%	0%	100%	2022	2019	4	تفعيل عمل نقطة تجارة الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص	سريع	

## وزارة التربية

### المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية

الملاحظات	كانون الأول - 4		نومر - 3		نيسان - 2		الواقع الحال (عدد أو نسبة)	المتهدف (عدد أو نسبة)	التاريخ المتوقع	تاريخ بداية التنفيذ	المدة المحددة للتنفيذ	المشروع	المدة الزمنية للتنفيذ	فترة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المتهدف	المتحقق	المتهدف	المتحقق	المتهدف								
	72%	25%	20%	25%	8%	50%	0%	%100	2022	2019	4	الاستمرار في مشروع تطوير وطبع المناهج العراقية لمواكبة التطور المعرفي وفي مجال طرائق التدريس وعلم النفس التربوي وتضمينها بما يتوافق متطلبات التنمية المستدامة	لم تحدد	الاستمرار بتطوير المناهج بما يساهم في بناء جيل متعلم، رفيع المستوى خلقياً واجتماعياً وعلمياً ومعرفياً، محياً للأخريين ونبأداً للعنف والتطرف والعنصرية، وادخال الحاسوب والبرامج المتطورة للرفي بمستوى التربية والتعليم
	20%	25%	10%	10%	25	250	3000	5000	2022	2012	4	ادخال الحوسبة في الصفوف الدراسية لعدد (5000) مدرسة		
	25%	25%	20%	25%	0	1500	-	على 6000 البنك الدولي	2022	2019	4	تأهيل وتدريس	متوسط	القيام بدورات التطوير ضمن مفهوم التعليم المستمر للهيئات التعليمية اثناء فترة العطلة الصيفية لكي يتم رفدهم وتطويرهم ضمن مفاهيم حديثة لتواكب حركة التقدم العالمي
	4%	25%	10%	10%	0%	375 مدرسة	0	3000 بنائة مدرسية	2022	2019	4	بناء (3000) مدرسة جديدة لمختلف المراحل الدراسية لتقليل الازدواج والكثافة الطلابية في الصف الواحد		
	85%	25%	15%	25%	0	250	0	2000 بنائة مدرسية	2022	2019	4	تأهيل وتدريس 2000 بداية مدرسة بمختلف المراحل		
	13%	25%	10%	25%	0	175	0	بنائة 600	2020	2019	2	مشروع الوزارة رقم (1) الشروع باكمال 1626 بنائة		
	13%	11%	15%	15%	74%	100%	0	بنائة 100	2020	2019	2	بناء مدارس ابتدائية بأسلوب سريع (بناء جاهز) عدد (100) مدرسة في بغداد	لم تحدد	تستمر وزارة التربية بإنجاز المدارس بمعدلات يشترك فيها القطاع العام والخاص للانهاء من ازمة المدارس خصوصاً فيما يخص نزاحم أكثر من مدرسة في بنائة واحدة او الاعداد الكبيرة في الصف الواحد او توفير كافة المستلزمات لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في كافة مراحلها خلال فترة السنوات الاربع القادمة
	11%	11%	15%	15%	74%	100%	0	بنائة 100	2020	2019	2	بناء مدارس ابتدائية بأسلوب سريع (بناء جاهز) عدد (100) مدرسة في المحافظات بما بغداد		
	12%	25%	10%	10%	0	11	-	مدرسة 73	2022	2019	4	القرص التكويني		
	11%	25%	10%	10%	0	26	-	مدرسة 26	2020	2019	1	قرص البنك الدولي		

# وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	كانون الأول - 4-9		حوز - 3-7		نيسان - 2-7		الواقع العالي (عدد أو نسبة)	المتهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الأبحاث	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتقرير	المشروع	الفترة الزمنية للتقرير	خضرة البرنامج الحكومي
	المتهدف	التحقق	المتهدف	التحقق	المتهدف	التحقق								
	1.4	8	27.4011	6	6	6	10	جامعة طيبة 1000 رسالة	2022	2018	5	التصنيف والاعتماد الأكاديمي		اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف وكمؤشر لجودة التعليم العالي في العراق ويجب ان يقدم كل رئيس جامعة جدولاً زيميا محدداً لدخول جامعتة في أحد التصنيفات المهمة العالمية
	0	10	23	5	5	5	24	جامعة حكمة 25	2022	2017	6	مشروع التصنيف الوطني لمعودة الجامعات العراقية	لم تحدد	
	6	5	6.5	5	15	15	0	100%	2022	2019	4	دعم الابتاع والابتكار		
	5.194	7	10.51	5	0	4	0	38	2022	2019	4	استحداث البنى التحتية والبحث		
	5	5	5	10	5	5	0	40 طالب	2022	2019	4	مذكرة تفاهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي السعودي	لم تحدد	اعتناء توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية المهمة من خلال الدوااسة والتدريب المشتركين ولبادال وسائل الاختيار ومخرجات البحث العلمي المشترك وغير ذلك من الأمور الجوهرية
	1.7	15	6	10	5	5	0	30 طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع وزارة التبية والتعليم الرومانية		
	11	10	10	10	5	5	0	1400	2022	2019	4	مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي وزارة العلوم والابتاع التقنية		
	2	10	7	10	5	5	0	80 طالب	2022	2019	4	مذكرة تفاهم مع بولندا		
	1	0	3	10	5	5	0	15 طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي السوداني		
	11	10	10	10	5	5	0	30 طالب	2021	2019	3	اتفاقية تعاون مع الجانب القطري		
	0	0	0	0	0	0	0	75 طالب	2022	2020	3	تنفيذ الاتفاقية مع منظمة الداد DAAD		
	15.2	15	10	10	5	5	0	210 طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع سنكاريا		
	0	0	0	0	0	0	0	75 طالب	2022	2020	3	اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمريكي		
	0.2	0	3	10	5	5	0	13 طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع جامعة سوتشون الأسترالية		
	0.2	0	3	10	5	5	0	30 طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع جنوب افريقيا		
	0	30	0	15	0	15	0	3 مشاريع	2020	2019	2	اتفاقية البنك الاسلاي للتنمية		
	0	0	0	0	0	0	0	30 طالب	2022	2020	3	مشروع اتفاقية تعاون بين العراق والجزاير		
	1	0	5	10	5	5	0	63 طالب	2021	2019	3	اتفاقية كامبوس فرانس بين جزائرنا والسفارة الفرنسية في بغداد		
	0	0	3	10	5	5	0	40 طالب	2022	2019	4	البرنامج التنفيذي مع ارمينيا		
	2	0	2	10	5	5	0	30 طالب	2021	2019	3	البرنامج التنفيذي مع وزارة التعليم العالي المصري		
	11	15	10	10	5	5	0	345	2021	2019	3	برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم الروسي		
	0.2	0	2	10	5	5	0	480	2022	2019	4	برنامج تنفيذي مع الأردن		
	8	15	3	10	5	5	0	30 طالب	2021	2019	3	برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم العالي اللبنانية		
	2	10	5	10	5	5	0	48 طالب	2021	2019	3	برنامج التبادل الروسية والسويدية		
	1	0	3	10	5	5	0	30 طالب	2021	2019	3	برنامج التبادلي بين جزائرنا وبنغلاديا السورية		
	1.56	2	2.74166	2	1	1	70%	100%	2022	2016	8	استراتيجية التدريب والتعليم الفني والتفني		
	10	0	30	0	0	0	0%	100%	2022	2019	3	توأمة الدراسات العليا		
	0	0	8.6	10	3.4	5	0%	100%	2022	2019	4	التبادل كرسى البولندي في جامعة الكوفة		
	6.75	0	6.65	10	4.1	5	30	170	2022	2019	4	أعداد وتسويق البحوث التطبيقية	متوسط	تقديم الوزارة حقلها لخصم التزهل وانشاعة الاحواء الأكاديمية والابحاث والحياد الجامعية ورفع المستويات العلمية والسعي للتعاقد مع الدولة او الشركات لإنجاز أعمال
	4	4	6.4	3	0.1	3	0%	100%	2022	2019	4	مشروع تفعيل البحوث العلمية التطبيقية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني		
	9.055	4	9.73	3	3	3	0%	100%	2022	2019	4	دراسات وبحوث للترويج بواقع الانتاج الزراعي والحدود العمالية		
	4	4	3.5	3	3	3	0%	100%	2022	2019	4	اثنى بحوث تطبيقية توفر البنى التحتية الضرورية		
	9	0	1	10	3	5	0%	100%	2022	2019	4	بحوث تطبيقية لتوفير بيئة صحية سليمة		
	8.706	5	9.79	5	3	3	1%	100%	2022	2017	6	تطوير وتحديث البرامج في الدراسات الأولية والعليا وتوأمها مع نظيراتها في دول الحوار والتعاقد		
	24.88	10	11.7	10	5	5	0%	100%	2020	2019	2	استحداث مركز بحثي للدراسات السكانية		
	10.92	10	5.86	5	5	5	0	35	2022	2019	4	إعداد نظام المقررات		
	14	10	10	10	10	10	0	13	2021	2019	4	الفضول المركزي وقنواته		
	4	7	6	5	3	5	100%	100%	2022	2018	5	المكتبة الافتراضية		
	6.12	50	4.73	40	7.1	10	0%	3800%	2019	2019	1	اختزال دورة العمل باعتماد النظام الالكتروني تدريجياً بدلاً من العمل الوراي		

	1	10	14.25	10	3	5	0%	100%	2022	2019	4	ربط المكتبة الافتراضية الحرة بالمراقبة
	6.25	4	22.2944	3	3	3	0%	100%	2022	2019	4	بناء قاعدة بيانات للكتب المؤلفة والمترجمة والمعدة من قبل الجامعات
	15	10	8	5	5	5	0%	100%	2022	2019	4	النشر الالكتروني
	8.2	6	11.1	6	3	3	0%	100%	2022	2017	6	نظام المستودع الرقمي
	10	10	9	5	5	5	100	حكومة	2022	2017	6	تصميم وتنفيذ وإدارة البوابة الالكترونية لجهات الاعتراف والتقويم العلمي ونشرها على الشبكة العنكبوتية الدولية (الانترنت)
	0	5	2.4	3	0	2	0%	3800%	2022	2019	4	الحكومة الالكترونية
	14.9	20	19.4	15	5	15	15%	100%	2021	2018	3	النظام الاحصائي لمعلومات التعليم العالي
	11.6	5	14.8883	5	8.4	15	0	12362	2022	2019	4	تطوير منسقي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
	27	40	30	30	30	30	38	38	2019	2019	1	الهيكل التنظيمي والتوصيف الوطني
	0	6	2.87833	6	3	3	2	35	2022	2017	4	استغلالية الجامعات
	10.6	10	7.46978	5	4	5	0	2000	2022	2019	4	مركز تطوير الفترات الجامعية
	16.5	25	2.99	20	15	15	5	35	2020	2017	6	شعب التوظيف والتأهيل والمتابعة في الجامعات
	0	5	5	5	5	5	0	1400	2022	2019	5	برامج الاعتراف للتمهينات الماددة والمهية
	19	10	8.974	10	5	5	200	4000	2022	2018	5	مشروع المعلم المتميز والكوادر الواسطة المتصورة
	10	10	5	10	5	5	0%	100%	2022	2019	3	متابعة اصدار التعليمات الخاصة بالمتخصصات التكنولوجية
	5	10	50	10	5	5	0%	100%	2022	2019	3	اعداد ضوابط استخدام البرامج الالكترونية
	3	5	5	15	15	15	5%	100%	2020	2019	1	متابعة مشروع قانون وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع مجلس الدولة
	20	20	15	15	5	15	0%	100%	2020	2019	1	تعديل تعليمات التأليف وترجمة الكتب المنهجية
	0	40	75	35	25	25	0%	100%	2019	2019	1	تعديل ضوابط اصدار المجلات
	6	10	5	10	5	5	0%	100%	2022	2019	4	تعديل تشريعات للكتبات الجامعية
	0	5	10	15	5	15	5%	100%	2020	2019	2	امس معادلة الشهادات
	5	20	80	15	15	15	15%	100%	2020	2019	2	تعليمات تعيين الكوادر
	35	40	30	35	25	25	80%	100%	2019	2019	1	تعليمات الدراسات العليا
	25	30	24	25	20	20	40%	100%	2020	2019	2	مشروع تعديل قانون المكتبات الاستشارية
	0	20	72	15	15	15	17%	100%	2020	2019	2	مشروع قانون اتحاد الطلبة
	35	20	61.5	15	12.5	15	10%	100%	2020	2019	2	تعديل قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية
	0	40	40	35	15	25	80%	100%	2019	2019	1	تعليمات اسكان الطلبة
	23	20	29	15	15	15	5%	100%	2020	2019	2	مشروع امتيازات الطلبة المتعلمين
	33	40	49	35	25	25	80%	100%	2019	2019	1	قانون المقيد الحضري والإقليمي
	35	40	30	35	25	25	10%	100%	2019	2019	1	نظام صندوق تقاعد التدريسيين العاملين في الجامعات والكتبات والمعاهد الاعلمية
	0	40	75	35	25	25	40%	100%	2019	2018	2	مشروع التعديل الثالث لتعليمات صندوق التعليم العالي
	10	10	6	5	0	5	20%	80%	2022	2018	5	تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة
	0	10	10	5	5	5	0%	100%	2022	2019	4	تصميم مسارات الجامعات الأهلية
	12	0	20	0	0	0	0%	100%	2022	2020	3	نظام الاعتراف في الجامعات والكتبات الأهلية
	15	10	30	5	5	5	29%	35%	2022	2018	5	برنامج القبول المركزي لعقبة الجامعات الاعلمية
	19	10	20	5	5	5	0%	100%	2022	2019	4	التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية
	20	10	20	5	5	5	0%	100%	2022	2019	4	نظام تسجيل حضور الطلبة الالكتروني في الجامعات الاعلمية
	9	20	25	20	10	10	5%	100%	2020	2019	2	وضع تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون التعليم العالي رقم 25 لسنة 2016
	16	20	10	20	10	10	5%	100%	2020	2019	2	مشروع تعديل قانون التعليم العالي الاعلمية
	13	20	17	20	10	10	5%	100%	2020	2019	2	مشروع قانون التعليم الموازي
	5	10	13	5	5	5	0	38	2022	2019	4	الاستثمار والشراكة في التعليم العالي
	2	10	5	5	5	5	0	14	2022	2019	4	تميز الشراكة من خلال برامج المكتبات الاستشارية
			100		100	100	40%	100%	2019	2018	2	تعليم الموارد المالية في التعليم العالي

متوسط

سريع

التشجيع على تأسيس الجامعات الأهلية بمعايير وجودية عالمية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وإدخال التعليم عن بعد، ووضع الجامعات الحالية تحت الاختيار سواء لرفع المستوى أو للإلغاء، اجازة الجامعات غير الجادة والتي تستهدف اصدار الشهادات بدون مقومات علمية جامعية

تشجيع الاستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والاكاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي والاجنبي او الجامعات الاجنبية بحيث تصبح للكلية او الجامعة الحكومية نظيراً مساعداً لتحسين الوضع التعليمي وتوفير المنقذات من خارج موارنة الدولة.

## وزارة العدل

### المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي

الملاحظات	كابون الأول - ف4		نومر - ف3		نيسان - ف2		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المتهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الإقرار	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المدة لتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فترة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المتهدف	المتحقق	المتهدف	المتحقق	المتهدف								
	صفر	2 مستمر	صفر	1 مستمر	صفر	1	6 مستمر	6	3		3	بناء جمعيات عمالية ذات مواصفات عالية يمكن من خلالها تطبيق مكنة دوائر التسجيل العقاري	متوسط	ربط جميع دوائر التسجيل العقاري بشبكة الانترنت والوزارة ومكتب الوزير شخصياً والمفتش العام لتسهيل إجراءات تسجيل عقارات المواطنين واعتبار التعطل المقصود فساداً يعرض مرتكبه الى المعاساة القانونية
					2	2	3 مكن مستمر	3	2022 مستمر	2012	4	بناء وتطوير التسجلات والسجون وفق المعايير الدولية	متوسط	
	1	1	1	1	3	3	نسبة اعمار 20%	20	2022	2018	5	تحسين الواقع الصحي والدعم النفسي للزلاء من خلال انشاء عيادات نموذجية للاقسام الاصلاحية (السجون)		
	5%	5%	5%	5%	10%	10%	نسبة اعمار 30%	البرامج التدريبية بالبلديات والقوى الاجرائية	2022	2018	5	تشكيل وحدة للدعم النفسي تعمل على اعداد دورات وبرامج تاهلية ونفسية للزلاء والقوى الاجرائية		
	1	1	1	1	1	1	5	الاقسام الاصلاحية 9	2022 مستمر	2018	5	اعداد وتنفيذ مشاريع وورش عمل لتشغيل الزلاء		
	49	49	49	49	98	98	1118 حدث	784	2022 مستمر	2018	5	برامج تربوية (محاضرات ثقافية ودينية) للاحداث		اصلاح نظام السجون العراقية وفق اعل المعايير في مجال الاصلاح الحقيقي وتدريب السجناء وتأهيلهم للعودة للمجتمع واندماجهم الصالح فيه
	4	3	4	4	7	7	5% باحث	5% باحث اجتماعي	2022 مستمر	2018	5	تدريب العاملين في البحث الاجتماعي على كيفية التعامل مع الحدث وفق مبادئ حقوق الانسان وحقوق الطفل		
	70	69	70	70	138	138	1118 حدث	1118 حدث	2022		4	تدريب الاحداث من خلال اشراكهم بدورات مهنية في (التجارة، الحداثة، الحاسبات، والاعمال اليدوية، خياطة)		
	70	69	70	70	138	138	1118 حدث	1118 حدث	2022		4	الفاء محاضرات نفسية واجتماعية على الاحداث		
	13	12	13	13	24	24	200 حارس	200	2022	2019	4	تدريب المأمورين وضباط الخفر والحراس على مبادئ حقوق الانسان وحقوق الطفل		

# وزارة الصحة والبيئة

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية

الملاحظات	كانون الأول - 2019		تموز - 2019		يناير - 2019		الواقع الحال (عدد أو نسبة)	المستهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الاعمال	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتقييم	فقرة البرنامج الحكومي
	التحقق	المستهدف	التحقق	المستهدف	التحقق	المستهدف								
					100%	100%		100%	2019	2019	سنة أشهر	التقييم الشامل لكل المؤسسات الصحية وفق المعايير الخاصة بالجودة والمعتمدة في وزارة الصحة		المنشورة فوراً بتقييم الوضع الصحي والامن الصحي في العراق ودراسة الفجوات الراهنة والتحديات التي تواجه النظام الصحي بالاستناد الى أفضل الممارسات المتاحة ووضع صيغة متقدمة للسياسة الصحية واعتماد سياسات تمويل صحي منضبطة وخطة عمل متكاملة للوصول الى تغطية صحية شاملة وخدمات عادلة لكل المواطنين بغض النظر عن امكاناتهم المادية
				100%	100%		100%	2019	2019	سنة أشهر	تطوير المهارات الادارية والفنية للملاكات العاملة في الجودة وبعده (50) مديراً			
				100%	100%		100%	2019	2019	سنة أشهر	اعادة النظر بنظام التمويل الصحي بما يلائم حاجة المؤسسات الصحية ومراجعة تنفيذ العمل على المواطن			
				100%	100%	دوائر 9 محدثة	100%	2019	مستمر	سنة أشهر	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لدوائر مركز الوزارة بواقع 3 دوائر لعام 2019			
				100%	100%	تم تحديث الهيكل التنظيمي للمستشفيات الاطفال وبواقع (4) مستشفيات	100%	2019	مستمر	سنة أشهر	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لمستشفيات (الاطفال) و(النسائية والتوليد) و (النسائية والاطفال) ضمن الفئات ABCD بواقع (2) مستشفى لعام 2019 نسائية اطفال ونسائية وتوليد			
				100%	100%	80%	100%	2019	مستمر	سنة أشهر	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لاركان الرعاية الصحية الاولية وفق نهج صحة الأسرة بما يشمل التغطية الصحية الشاملة			
				100%	100%		100%	2019	2019	سنة أشهر	مراجعة وتحديث السياسة الصحية الوطنية			
	24%	24%	10%	10%	16%	16%	3	المختبرات الطبية عدد (7)	2020	2015	2	برامج اعتماد المختبرات الطبية في المستشفيات التعليمية		تعزيز النظام الصحي العراقي عن طريق التوسيع لمواطني الشعب في مقوماته الأساسية وخاصة التمويل والقوى الصحية العاملة و توفير الادوية والعقاقير والمستلزمات والتكنولوجيا الأساسية وجودة الخدمات الصحية
	10%		10%	25%	25%	25%	100%		2020	2019	2	مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية		
	30%	30%	36%	36%	34%	34%	81%	الجرعة الثالثة سداسي * عدد 590	2020	2019	مستمر	زيادة نسب التغطية باللقاحات الروتينية (الجرعة الثالثة سداسي + OPV الخمسة)		
	30%	30%	36%	36%	34%	34%	82%	لقاح الخمسة سداسي عدد 27%						
	2%	2%	2%	2%	1%	1%	0%	60%	2020	2019	2	خطة لتجهيز اعداد و مواصفات و توزيع اجهزة معالجة وتشخيص السرطان في العراق Linear accelerator, PET scan, gamma camera mamogram		
	30%	20%	20%	20%	10%	10%	الوصول الى توفير من 65% من الاحتياجات النسوية		2022	2019	4	توفير الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والخدمية في المؤسسات الصحية ومن عداها، رصدية		
	15%	15%	35%	35%			25%	100%	2020	2019	2	تجهيز حزمة الادوية والخدمات الصحية المقدمة للمواطن في مؤسسة صحية و حسب معايير الجودة		
	4%	4%	4%	4%	4%	4%	20%		2020	2019	2	تجهيز نظام المعلومات الصحية والتسجيل الطبي والاستشارات الصحية (المرامات والبوليات)		
	40%	40%	40%	40%	30%	30%		تغطية الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية في المحافظات والقرى النائية وعدد 27%	2020	2019	1	خطة الانتعاش الاستراتيجية لعام 2019 بدعم منظمة الصحة العالمية		الاستماع بتقييم الوضع الصحي لتفازين وتحسين الخدمات الصحية لهم والالتزام باولوية اعادة بناء المراكز الصحية للمحافظات التي تضررت خلال الاحداث والعمليات العسكرية
	25%	25%	25%	25%	50%	50%		تغطية الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية في المحافظات والقرى النائية وعدد 27%	مستمر	2019	2	خطة استجابة وزارة الصحة ما بعد الجائحة للتحديات الصحية التي تواجهها في التقييم كوفيد-19		



	0%	2%	2%	2%	0%	0%	38%	100%	2022	2011	مستمر	11- إنشاء مستشفى صحة (1100) مزيجي في محافظة صلاح الدين / قضاء سامراء		
	0%	5%	2%	2%	0%	0%	33%	100%	2022	2011	مستمر	12- إنشاء مستشفى صحة (1100) مزيجي في محافظة صلاح الدين / قضاء السلي		
							0%		تاريخ الانتهاء 2023	لم تبدأ		إنهاء الإنفاق في ظل الفساد المستشري في القطاع العام		
	17%	18%	10%	10%	8%	8%	0%		تاريخ الانتهاء 2023	لم تبدأ		20- إنشاء مستشفى صحة (1000) مزيجي في محافظة ذي قار / قضاء القادسية والفرق الاحمر الطبية ومنظمة (100)		
	36%	24%	24%	24%	40%	40%			2019	2019	سنة	14- اعداد خطة العمل للمؤسسات الصحية لدعم العراق اعدا اقليم كركوك / خلال سنة من التسليم بموجب الصحة في بغداد والمحافظات		
	15%	25%	25%	25%	50%	50%	معلومات وبيانات قيد التحليل	خطة منحرة	2019	2019	1	وضع خطة شاملة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الصحية	لم تحدد	
	5%	5%	6%	10%	5%	5%	20%	60%	2022	2019	4	رفع مستوى الثقافة الوصي الصحي في المجتمع		
			9%	9%	91%	91%	100% (تقرير 2020)	100% (تقرير 2020)	2022	2019	اربع سنوات	تعزيز الملاكات الطبية والصحية والتدريبية لعدد الاحتياجات الموجودة	لم تحدد	
			25%	25%	75%	75%	100% (تقرير 2020)	100% (تقرير 2020)						
			25%	25%	75%	75%	100% (تقرير 2020)	100% (تقرير 2020)						
			20%	20%	80%	80%	100% (تقرير 2020)	100% (تقرير 2020)						
	3%	3%	2%	2%	5%	5%	0%	80%	2022	2019	ارب سنوات	مشروع توفير الكوادر البشرية العاملة في مجال تشخيص وعلاج الامراض السرطانية		
	70	40	2	32	0	0			2022	2019	مستمر	تقييم نوعية الخدمات المساندة للانشطة القوية للمصادر المائية واعداد قاعدة بيانات بذلك	لم تحدد	
												استخدام وحدات المعالجة البيولوجية للمياه الثقيلة وحمل هذا الأمر شرطاً لبناء أو استمرار اي مستشفى او مصنع وذلك للتخلص من النفايات والمحافظلة على جودة مياه النهر		

# وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## المحور الرابع: تقوية الإقتصاد

الملاحظات	كانون الأول - 4		نور - 3		ديسمبر - 2		الواقع الحال (عدد او نسبة)	المستهدف الكمي (عدد او نسبة)	تاريخ الانجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية لتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي		
	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق										
	210611	101399	83577	101400	838321	1397201	69.23% من المستهدف الكلي	مليون وستمائة الف أسرة	2019	2019	1	اولاً تحديث البيانات للمسؤولين من خلال الربط مع الجهاز المركزي للإحصاء . البطاقة التموينية . ومديريات الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية لخلق قاعدة بيانات رصينة ودقيقة	سريع	تطوير قاعدة بيانات دقيقة عن العراقيين او العوائل التي تعيش تحت خط الفقر بغرض شمولهم بالرعاية الاجتماعية والقروض وتأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير دعم الدولة المستحق لهم في الاسكان والعمل والكهرباء الرخيصة		
	30%	30%	30%	30%	40%	40%	69.23% من المستهدف الكلي	مليون وستمائة الف أسرة	2019	2019	1	ثانياً: تطوير اليات عمل البحث الاجتماعي لخلق استهداف اكثر فاعلية للوصول ال الأسرة الميمشة الحقيقية ولخلق قاعدة رصينة ودقيقة				
	109114	250000	250000	250000	500000	500000	0%	مليون 1	2019	2019	1	ثالثاً: تأسيس قاعدة بيانات التسجيل ونقطة الاسر الفقيرة من خلال المسح الديموغرافي باعتماد خارطة الفقر (وزارة التخطيط) من خلال تهيئة ادارة لوضع اليات لتنفيذ المشروع				
	607	3884	1370	3884	7232	7232	الف شخص من (45) تسليم خمسة واربعون الف شخص من (100) المستفيدين من قاعد بيانات دائرة العمل والتدريب المهني	الف شخص من (100) المستفيدين من قاعد بيانات دائرة العمل والتدريب المهني	2022	2019	4	دعم المشاريع الصغيرة (مستلوق الافراض) وفق قانون رقم (10) لسنة 2012				
	7%	5%	5%	5%	15%	15%	عدد العمالة الوطنية ( 13638 )	نسبة العمالة الاجنبية ال العمالة الوطنية	2022	2019	4	تشغيل الباحثين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني في الشركات المتعاونة مع الوزارات وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص				
	0%	10%	0%	5%	10%	10%	100%		2022	2019	4	انشاء دار لابواء النزلاء والمودعين من قبل دائرة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة				
	20%	20%	10%	10%	20%	20%	0%	من 100% المعاقين	2022	2019	2	انشاء قاعدة بيانات رصينة يتوفر فيها جميع بيانات المعاقين في العراق				
	36410	10000	15000	15000	17218	15000	29411	98039	2022	2019	4	تطبيق المادة (19) /لنايا-1) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2018 والذي ينص على شمول المستفيدين من راتب المعين المنفرد				
						1200242	1200242	1063630	نسبة الباحثين عن العمل المعدلة بحالهم	مستمر	مستمر		تحديث بيانات العاطلين الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني		سريع	التأسيس لمشروع تشغيل الشباب وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة وتقديم تسهيلات مصرفية ميسرة بهدف الحد من البطالة والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد
	0	100	0	0	0	0	0	400 متر	مستمر	2019	مستمر	بناء قدرات المشورين (تدريب مدربين) (TOT) للحصول على الترخيص بالتدريب من الجهات الدولية المرجعية على ضوء المعايير الدولية	لم تتحدد			

تأهيل وبناء ودعم مراكز التدريب المهني التي تعلم المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل والمجتمع

شمول جميع المواطنين العاملين في القطاع العام أو الخاص بنفس الحقوق والامتيازات من حيث التقاعد والضمان وتوزيع الأراضي شريطة مساهمة المواطن بالاستقطاعات المناسبة وفق القواعد المنشوعة.

مستمر	2019	مستمر	مختص 100	0	0	0	0	25	0	تطوير لغات الاكالات العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب المهني في مجال الحصول على الشهادات الدولية من الجهات المرجعية في تطوير المناهج والتقييم
مستمر	2019	مستمر	مستمر حسب حاجة سوق العمل	81	100%	100%	100%	100%	100%	تطوير المناهج على وفق المنهجيات الحديثة cbe
4	2019	2022			50%	15%	25%	0%	25%	تطوير خريطة التطوير استراتيجيا للقطاع الصناعي الاجتماعي
3	2019	2021	شمول الفناجين العائدين الى مناطقهم المعززة والسكان المحليين		10%	0%	10%	10%	10%	الظفر مقبول العمل والتدريب الاقتصادي وفهم كسب الرزق
					10%	0%	10%	10%	10%	شيكات امان اجتماعي ضمان
					10%	0%	10%	10%	0%	ادارة للترويج الطاقم
4	2019	2022	ورشة 20	0	10%	10%	5%	10%	10%	استحداث ورش تدريبية لتبني الاعاقة بجهة تدريب على بعض المهن التي تناسب مع نوع الاعاقة والتعامل مع اتفاقية حقوق الاشخاص
1	2019	2019	100%	0%	35%	30%	30%	34%	35%	نقل مراكز التأهيل للمخالي المناسبة وتم الميزانية وبعدها عشرة حسب قانون هيئة الاعاقة والعاقبة مع موجوداتها وموظفيها الى هيئة الاعاقة ونقل مراكز التأهيل التابعة الى وزارة الصحة وبعدها 8 تؤدي نفس الفرض اعلام
4	2019	2022	100%	0%	25%	25%	0%	0%	0%	تاهيل المراكز واعادة اعمارها وتجهيزها بالاعدات اللازمة والمبالغ المطلوبة
			الف 250 عامل ومتقاعد	القرار	0%	0%	0%	0%	0%	تخصيص قطع اراضي لشريحة المتقاعدين والعمال في القطاع الخاص والذي يتطلب (مصدور قرار من مجلس الوزراء الموقر لتخصيص قطع اراضي في بغداد والمحافظات)
				القرار	0%	0%	0%	0%	150000	معالجة المعيشين بمقدور او اجور يومية في الولايات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذي يتطلب قرار من مجلس الوزراء يلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشمول العقود او الاجور اليومية بالضمان الاجتماعي وفق الحد الأدنى للاجر (300) الف دينار

لم تحدد

# وزارة الصناعة والمعادن

## المحور الرابع : تقوية الإقتصاد

الملاحظات	كانون الأول - 4-4		نموذج 3-4		بيسان - 2-4		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنتاج	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة الزمنية للبناء	المشروع	الفترة الزمنية للنفوذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
	2	6	5	5	9	9	0%	الف طن / سنويا 38	2020	2018	2	معمل ورق بيسان / (استثمار)		التحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشآت المتوقفة او الخاسرة وطرحها للمشاركة والاستثمار او البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة يملكها الشعب بشرط تشغيلها واستيعاب العاملين المنتجين فيها وتحقيق سعرات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق المحلية كمرحلة اولى والتصدير كمرحلة ثانية
	12.5	12.5	5	5	2.5	2.5	0%	عمود / سنة 70.000	2020	2019	2	معمل الاعداد الكهربائية / معدات الاتصالات (مشاركة)		
	10	10	5	5	5	5	0%	مولدة مع 50 كلم صوت 384 سنة	2020	2018	2	مشروع تجميع مولدات القدرة والكوازم / ابن الوليد (مشاركة)		
	22	20	10	10	30	30	0%	طن / سنة 7375	2020	2019	2	مشروع الاسهجة الواقية للطرق السريعة / الفولاذية (مشاركة)		
	5	10	0	10	40	40	0%	طن / سنة 800	2020	2019	2	مشروع السلاسل / الفولاذية (مشاركة)		
	15	50	20	40	10	10	0%	طنون 5.5 مليون صندوق سنة 24 مائل سنويا	2019	2019	1	الناج وثمانية مياه الشرب / المنصور الزوراء (استثمار)		
	5	10	7	10	80	80	0%	طن سنويا 230000	2019	2014	1	مصنع الفلاز / الزوراء (استثمار)		
	5	30	10	20	10	10	0%	محرك سنويا 24	2020	2017	2	معمل تصنيع محركات الجهد المتوسط / الزوراء (توسيع طاقات) (استثمار)		
	15	37	20	20	43	43	0%	الف اعمار سنويا 500	2019	2019	1	مصنع اطارات البونابية / مطاطية (استثمار)		
	12	30	15	20	10	10	0%	طن / سنة 10250	2020	2019	2	البان الموصل / الغذائية (استثمار)		
	6	15	5	5	0	0	0%		2020	2019	2	مراكز جمع الحليب عند (5) مرحلة لولي / الغذائية (تأجير للقطاع الخاص)		
	10	10	10	10	40	40	0%	BB15 / سنة	2020	2016	2	البان ابو حبيب / الغذائية (رفع الطاقة الانتاجية) (استثمار)		
	10	43	15	15	2	2	0%	ذكي 200 الف / سنة / سنويا 100 الف / سنة	2020	2016	2	مصنع تطوير المقاييس الالكترونية ونتاج المقاييس الذكي / ديالى (استثمار)		
	1	10	3	3	87	87	0%	طنون لكر اسنويا 33	2019	2017	1	الغازات الطبية / الزوراء (استثمار)		
	3	5	0	5	10	10	0%	طنون طابوقة / سنة 100	2020	2018	2	معمل طابوق البصيرة / الانشائية (استثمار)		
	0	0	0	0	20	20	0%	طنون طابوقة / سنويا 80	2020	2018	2	معمل طابوق القاسمية / التوسيع / الانشائية (استثمار)		
	1	15	0	5	0	0	0%	الف متر مكعب / سنة 100	2020	2019	2	معمل لوجستون بغداد / الانشائية (استثمار)		
	1	0	0	0	20	20	0%	طنون طابوقة / سنة 80	2020	2018	2	معمل طابوق ديالى تأهيل وتشغيل / الانشائية (مشاركة)		
	10	10	10	10	80	80	0%	متر معددة	2019	2019	19 شه	مشروع تصنيع وتجميع معدات تخصصية خدمية / الهيدروليكية (استثمار)		
	15	45	25	25	30	30	0%	طنون طن / سنة 2.16	2019	2018	1	سمنت بابل / السمنت (الوصول للطاقة التصميمية) (استثمار)		
	23	45	25	25	30	30	0%	الف طن / سنة 580	2019	2018	1	معمل النورية / السمنت الوصول للطاقة التصميمية (استثمار)		
	1	0	0	0	20	20	0%	الف طن / سنة 309	2020	2018	2	سعرات الذهب / السمنت الوصول للطاقة التصميمية (استثمار)		
	5	15	5	5	0	0	0%	طن / يوم 600	2020	2019	2	الرجاج المنطع / الشركة العامة الرجاج والحرايات (استثمار)		

	0	40	4	30	30	30	0%	الف طن / نسبة جهيزات مع 90 اصفاة خط جديد بطاقتة 25 الف طن / نسبة	2019	2018	1	معامل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية / التوسيع الى الطاقة التصميمية (مشاركة)
	32	32	20	20	8	8	0%		2020	2018	2	انشاء ورشة متخصصة لتطوير انتاج الكرفانات (استثمار)
	6	10	5	5	15	15	0%	ملفون طن / نسبة	2020	2019	2	خط انتاج الكبريت الحصى (استثمار)
	5	10	5	5	5	5	0%	الف النسبة الفقة 100 الف طن / نسبة	2022	2018	4	تأهيل الشركة العامة للفوسفات (استثمار)
	1	0	0	0	20	20	40%	مخارطة الفاصلة 261 الف طن / نسبة	2022	2012	4	معمل سميت الحلوجة
	5	15	10	10	5	5	0%	الف 10 طن / نسبة	2021	2018	3	مشروع قابلو الضغط المتوسط / اير / استثمار
	8	6	5	5	19	19	0%	الف طن / نسبة 100	2021	2018	3	مصنع انابيب الملحومة طولانيا (استثمار) الحديد والصلب
	6	10	10	10	10	10	0%	طن نسبة 100 الف طن / نسبة 100000 الف 100000 طن / نسبة 100000	2021	2019	3	معمل السكر والبطيخة في الموصل / الفذائية (استثمار)
	0	15	10	10	5	5	0%	100000 طن / نسبة	2021	2018	3	معمل سكر ميدان مع المزرعة / الفذائية (استثمار)
	5	20	9	9	1	1	0%	الورق بانواته 82 طن / يوم) (المقوى 54 طن / يوم)	2020	2019	2	الصناعات الورقية (استثمار)
	15	20	10	10	0	0			2019	2019	2	معالجة العمالة الفائضة في الصناعة
	5		5				0	طن / يوم 40	2021	2019	3	مشروع انتاج الكافور (مشاركة / استثمار)
	0	0	0	0	2	2	98%	الف طن / نسبة 45	2019	2017	6	تأهيل مصانع الشركة العامة للزيوت النباتية / الزراعة الفقة (مشاركة)
	0	0	0	0	100	100	90%	100% من 20000 الى 100000 طن / نسبة الف 100000 طن / نسبة 100000 الف 100000 طن / نسبة 100000	2019	2008	6 أشهر	تأهيل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية (المرحلة الأولى)
	0	0	0	0	95	100	80%	100% مخارطة معالجة تبلغ 3 م3 / ساعة	2019	2013	شهر	وحدة اذ الفخاطرة الكيميائية والتأويلية كمنج الاير
	2	8	9	9	6	6	77%	80% الف 100000 طن / نسبة 100000 الف 100000 طن / نسبة 100000	2019	2013	1	انتاج الطلائع الفقة نسبة الاير 80% بطاقتة الفقة الفقة
	13	28	25	25	10	10	37%	60% الف 100000 طن / نسبة 100000	2019	2009	1	تأهيل معمل الطابوق الفعالي في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
	0	0	0	5	5	5	90%	50% الف 100000 طن / نسبة 100000 الف 100000 طن / نسبة 100000			شهر	تأهيل معمل الاسمنت الفقة رقم (2) مع الفقة معملة لويد الجريد
	31	54	25	25	5	5	6%	الف 100000 طن / نسبة 100000 الف 100000 طن / نسبة 100000			2	تأهيل معمل الشركة العامة للحديد والصلب / المرحلة الأولى
	9	9	5	5	0	0	3%	100%			3	مشروع بناء الفقة ادارية وتطوير الفقة البشرية مرحلة (2)
	1	1	1	1	10	10	44%	مع الفقة الفقة في 1750 من الفقة الف 100000 طن / نسبة 100000 الف 100000 طن / نسبة 100000			1	تأهيل شركة زوال العامة للصناعات البتروكيمياوية
	4	0	4	0	23	23	25%	100%			2	الفقة الفقة الفقة في الفقة الفقة الفقة الفقة
	0	5	10	3	5	5	52%	100%			4	انشاء معملات الفقة الفقة الفقة الفقة
	0	0	0	0	3	3	23%	100%			4	مشروع المعمل الفقة / ميدا البحث والتطوير الفقة
	3	2	1	1	3	3	69%	100%			4	الفقة الفقة الفقة الفقة الفقة الفقة
	0	0	2	0	1	1	77%	100%			3	الفقة معمل الاسمنت الفقة (2) (2)

سريع

تقديم دراسة لعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن للقطاع العام او الخاص او مشاركة بنائها خلال العام الأول على ان تقدم تسهيلات مصرفية ميسرة كبقية المشاريع حسب نوع المشاريع وحجمها وأهميتها.

	5	5	5	5	5	5	0%	100%			3	مشروع القوانين المدروسة كالمستوى الصناعي، المرحلة الأولى (المراسلة)	
	78	0	0	0	700	700	0%	مشروع 700			6 أشهر	اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة / قطاع خاص	
	296	322	297	250	50	50	0%	مشروع 4997			4	مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة / قطاع خاص قيد التنفيذ	
	0	0	0	0	75	75	25%	100%			6 أشهر	مشروع تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 للقطاعات الخاص والمختلط	سريع
					50	75	25%	100%	2019	2019	6 أشهر	مشروع تخصيص الأراضي الصناعية للقطاع الخاص بموجب دراسات الجدوى الاقتصادية المقرة	لم تتحدد
	5	5	5	5	5	5	0%	100%	2021	2019	3	الدراسات والتقييم والتكاملات المتكاملة وفقاً للائحة التأسيس (SME) لمشروع التأسيس المدروسة كالمستوى الصناعي، الترتيب الخاص الفرعي	لم تتحدد
<b>المحور الثاني: تقوية الإقتصاد</b>													
		0		0	100	100	0%	100%	2019	2019	شهر	تصنيع الطائرات المبردة الاستطاعية والمقاتلة	سريع
		0		0	100	100	0%	100%	2020	2020	شهر	انتاج العتبات المدرعة	

توجد شروط والتمديدات مديرية التنمية الصناعية وقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتطويرها وتسهيلها لصالح المستثمر المنتج الذي يوفر صناعة عراقية وتخليق شعار "صنع في العراق" و"صنع بأيدٍ عراقية"

منح الأراضي الأخرى الصناعية مجاناً أو بأسعار رمزية وتحدد مساحتها بحسب حاجة المشروع وبالتكامل مع وزارة الإسكان والأعمار وهنئة الاستثمار الوطنية. وفتح الباب للاستثمار الخاص في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة واستخدام الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها حزيناً أو كليا في العراق

فتح الباب للاستثمار الخاص في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة واستخدام الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها حزيناً أو كليا في العراق

التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربية لتوفير احتياجات الجيش العراقي من الاسلحة والانباء، من وضع الخطط والتعليمات مع استمرار تصنيع القوات المسلحة بأفضل انواع الاسلحة الفعالة التي تناسب طبيعة المعركة في العراق وخصوصاً جهود مكافحة الارهاب

# وزارة الزراعة

## المحور الرابع : تقوية الإقتصاد

الملاحظات	كابون الأول - سنة 4		نموز - سنة 3		نيسان - سنة 2		الواقع الحالي (عدد او نسبة)	المستهدف الكلي (عدد او نسبة)	تاريخ الاجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الرئيسية للتنفيذ	فترة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
	0	15	0	0	0	0	-	لوحيد قوانين وقرارات محدود (15) بشريع واحد	2020	2019	2	<b>الغاء وتعديل تشريعات زراعية</b>	متوسط	العمل جدياً للتخلص من مفهوم الأراضي الاميرية الموروث من النظم العثمانية السائدة. وملكية الدولة بشخص وزارة المالية وبمعية الوزارات لمعظم اراضي البلاد. ونشر قانون بحفظ الملكيات الزراعية والحجارة والآبار والاستثمار لانهاء الموضي الحالية في ملكيات وحيازات الأراضي التي تثير مخاوف كثيرة. وتمنع تطور الزراعة والتربية الحيوانية وتطور الحياة الريفية وتوزيع الاراضي بأسعار رمزية او حتى مجانية عبر احياء مفهوم الاراضي لمن احياء واحياء الاراضي الوات وتوفير المسهلات المصرفية والشعبوية لتسهيل الدورات الزراعية والحيوانية. ودعم الزراعة اساساً بدعم المخرجات الزراعية واعتبار جميع ذلك من اهم مجموعات النهضة الزراعية الريفية
	0	15	0	0	0	0	0%	محافظة 15	2022	2019	2	<b>تم تفعيل قانون (117) لسنة 1970</b>	+ طويل	
	0	2	0	0	0	0	53%	موقع 11	2022	بداية اكمل الانجاز، 2019	4	<b>الكمال الشراء القري العصرية في المحافظات</b>	متوسط	توسيع تجربة القري العصرية من خلال توفير القروض الميسرة للمزارعين في عموم العراق والعمل على بناء عدد من القري العصرية المجاورة لمزارع نموذجية زراعية وحيوانية في عدد من المحافظات لتكون مثالا وقدوة لتشجيع عصرية الحياة الريفية والقروية وتنشيط الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات القروية والمحلية
	2000	2000	2000	2000	1000	1000	اجراء بحوث ودراسات علمية وانماذج 750 طير محلي * مخزن اجزاء بحوث ودراسات علمية والانتاج 1500 طير محلي * مخزن اجزاء بحوث ودراسات علمية والانتاج 50 الانتاج 750 طير محلي وومي	الانتاج (5000) طير محلي * مخزن الانتاج 5000 طير محلي الانتاج 1000 طير محلي ومي الزراعة والاطار العام الاموي بعدد 50 مخ	مستمر	2003	غير محددة(د انمية)	<b>بحوث الثروة الحيوانية (مستوى)</b>	متوسط	
	0	1	0	2	1	1	0%	محافظة 15	2022	2019	4	<b>برنامج تنمية وتطوير مهارات وقابليات الفلاحين ومربي البيثرة الحيوانية والمرأة اريفية لزيادة الانتاج</b>		
	0	10%	0	10%	0	10%	0%	100%	2021	2019	3	<b>مشروع الإدارة المتكاملة لبساتين التخيل والحمضيات</b>		
	0	5%	0	5%	15%	15%	0%	100%	2022	2019	4	<b>مشروع ترشيد استخدام المياه بالاساليب الحديثة</b>		
	0	34	0	33	0	33	0%	680 فلاح	2022	2019	4	<b>مدارس المزارعين الحقلية لمحاصيل الخضار</b>		
	950	15000	0	0	0	25000	0%	الانتاج 250 الف لتر لخدمة لفاح بمعد من فحول الجاموس المنحبة	2022	2019	4	<b>مشروع التلقيح الاصطناعي في الجاموس وتحسين الكفاءة التناسلية للجاموس العراقي</b>		
	0	15	0	0	0	0			مستمر	اذا 2019		توفير فرص للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين و خريجي المعاهد الزراعية للمشاركة في النشاط الزراعي الانتاجي. وتعديل لقانون (24) لسنة 2013 الخاص بالترغ الزراعي		
	9	2	0	0	33	33	14	152	2021	2018	4	البرنامج الوطني لاكتثار سلالات و هجن محاصيل الخضار المحلية	لم تحدد	
	1	0	0	0	18	18	12 دونم	66 دونم						

	284	0	0	0	0	300000	0%	مليون اصل 1.79	2023	2019	5	البرنامج الوطني لاكتثار واصناف الماكبة والريبتون المختلفة	تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني بتوفير القروض المناسبة بدون فائدة او بتحمل الدولة لقوائدها بضمان الانتاج وزيادة استخدام الانتاج الوطني في تلبية احتياجات السلة الغذائية وتقليل الاستيراد وتوفير مفردات البطاقة التموينية	
	0	0	0	0	0	258000	0%	مليون 2171						
	0	0	300	210	0	0	دونم 231,5	دونم 990	2021	2017	5	برنامج اكتثار بذور الرتب العليا لمصنول الرز للأسفاف المعتمدة والسجلة لدائرة المحوت الزراعية		
	0	0	0	0	184,5	184,5	مساحة 21 دونم	دونم 49267	2021	2017	4	برنامج اكتثار بذور الرتب العليا لأصناف الشعير		
	32	15	2	2	0	0	موسم 2018 اكتثار بذور السلالات النقية بمساحة 142 دونم	تحدد المساعدات الكلية للبرنامج حسب الموسم الزراعية بعد استحصان موافقة اللجنة الوطنية للزراعة والحرار خطة العمل	2021	2017	5	برنامج ادامة واكتثار السلالات وإنتاج هجن الذرة الصفراء المعتمدة في العراق		
	0	0	0	0	3000	3000	موسم 2018-2017 زراعة مساحة 1851.200 دونم	اكتثار بذور الرتب العليا من بذور الذرة والاسمان بالمساحة ال انتاج بذور السرة والساق	مستمر	2014	غير محددة	برنامج اكتثار بذور الرتب العليا لمصنول الحنطة		
					750	750	موسم 2018 انتاج طن 1499955	انتاج 750 كم / دونم بذور الحنطة لتوفير الامن الغذائي للسنة الالبرنامج الرتب نسبة زراعة الحنطة في العراق	مستمر	2011	غير محددة	البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق		
	100	100	0	0	0	150		انتاج 500 حمار السوسية اكتثار وتصدير ذري والوزن الجوزات المعوية ذوالها للسمكات الاقتصادية على السهول من واحوا الحوت المعوية طرية	مستمر	2004	غير محددة	انتاج كباش الانعام العواسية		
	20%	20%	0	0	0	0	تشاء 20 حضور فردية وقاعة لجمع السائل السوي ومطبو لتقييم وتحسين السائل السوي	الشارح 20 حضور فردية للطاق الجاموس وقاعة جمع السائل السوي ومطبو وانشاء وحدة تعويد السائل السوي واشغال فواجر (10) طولة جاموس حضور ذوالها الى الفرح	مستمر	2018	غير محددة	مشروع التلقيح الاصطناعي في الجاموس (دعم المزارعين)		
	0	150	0	150	0	200	0%	دونم 5000	2022	2019	4	مشروع اقراض المزارعين لشراء منظومة ري حديثة لاعادة تأهيل بمائتين النخيل والفاكية والريبتون		متوسط

المحور الثالث: الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية

	0	67500	40500	0	0	0	304الف دونم	الف دونم 750	2022	2011	11	مشروع استخدام تقنيات الري والتكنبة الحديثة	سرعة	وضع خطة بالأرقام لشمول الأراضي الزراعية بمعدات الري الحديثة لضمان انتاج زراعي وفير واقراض المزارعين لهذا الغرض وبالتكامل مع وزارة الزراعة وبطريق مشترك واحد
	1.55%	2%	0.90%	1%	0	0			2021	2006	15	تثبيت الكشبان الرملية		
	0	3%	0	2%	0	1%				2008		تطوير وتأهيل المطبات الري في العراق		

# وزارة النقل

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية

الملاحظات	كانون الأول - 4		تموز - 3		نيسان - 2		الواقع الحال (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الانجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المتعددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتقييم	فقرة البرنامج الحكومي
	التحقق	التقييم	التحقق	التقييم	التحقق	التقييم								
			1.50%	1.50%	3.50%	3.50%	95%	100%	2019	2014	5	كسر الطواقم الكبرى	لم يتحدد	نجاز ميناء العراق الكبير عن طريق الاستثمار المباشر وان تعذر عن طريق شراكة عراقية اجنبية خلال المدة التي مستفضيها الدراسات الفنية للمشروع وجدول زمني يتم تدقيقه كل ثلاثة اشهر وبمراحل متعددة وانجاز اعمال ميناء العراق الكبير
	2.50%	30%	19.5%	19.50%	2.50%	2.50%	43%	100%	2020	2008	أسبوع من تاريخ 2019	الكمال مشروع وخط حافلة شبكة حافلة بين الحضر وقديانيا	سريع	زيادة الاعتماد على السكك الحديدية وادخال تحسينات جوهرية في الشبكة الحالية بما يخفف عن النقل البري سواء للركاب او للبضائع لفك الازدحامات والحوادث على الطرق والتوقف عن الاضرار بالطرق بسبب الاحمال الثقيلة. وانجاز المرحلة الاولى من مشروع القطار السريع بالاتفاق مع كونسورتيوم عالمي لتحقيق تكنولوجيا متقدمة مطابقة عالمياً، ليتم التعاقد والاستثمار قبل نهاية العام الاول
	0.20%	0.20%	0.50%	0.50%	0.30%	0.30%	77%	84%	2026	2001	أسبوع من تاريخ 2019	مشروع البوسنة حلة - سايها القطران لخدمة المناطق القريبة		
	0%		0.30%		1.20%	0%	94%	100%	2022	2010	سنوات من تاريخ 2019	مشروع وسيل كركلا - بغداد		
	0.30%	0.30%	0.40%	0.40%	0.30%	0.30%	61%	71%	2024	2004	سنوات من تاريخ 2019	اعمال مشروع اسبوع - اسبوع للقطران الهند الاكبر والقديم		
	2.50%	2.50%	0.10%	0.10%	0.40%	0.40%	83%	98%	2023	2002	أسبوع	اعمال مشروع اسبوع - اسبوع للقطران الهند الاكبر والقديم		
	0.50%	0.50%	1.40%	1.40%	0.10%	0.10%	83%	100%	2022	2004	أسبوع من تاريخ 2019	مشروع تدار مواد يمكن الشبكة الاقتصادية		
	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0%	0%	38%	61%	2026	2002	الأسبوع من تاريخ 2019	مشروع اعداد بحري القطران الهند الاكبر والقديم		
	0.30%	0.30%	0.40%	0.30%	0.40%	0.40%	41%	54%	2026	2001	الأسبوع من تاريخ 2019	كمال مشروع اسبوع - اسبوع للقطران الهند الاكبر والقديم		
	0%	0.50%	2%	0.50%	0%	0%	23%	36%	2026	2002	الأسبوع من تاريخ 2019	مشروع اعداد القطران الهند الاكبر والقديم		
	0%	13%	0	8%	0%	0%	37%	100%	2020	2004	أسبوع من تاريخ 2019	ايجاد اعداد اسبوع القطران		
	0%		0		0%	0%	80%	100%	2022	2012	أسبوع من تاريخ 2019	مشروع تدار وسيل حافلة		
	0%	2%	2%	2%	0%	0%	21%	100%	2022	2008	سنوات من تاريخ 2019	استبدال خط حافلة حافلة		
	0%	2	0				0%	100%	2020	2015	2	القطران حافلة	لم يتحدد	
			0				14 طائرة	25 طائرة	2025	2008	4	شراء طائرات بويغ (المرحلة الثانية)		
	0.9	25%	0	5.00%	0%	0%	5.7%	100%	2020	2014	2	ايجاد طائرة الشحن الجوي وبعدها حافلة حافلة		
		6.50%	0	6%	0%	0%	0%	100%	2029	2019	11	مشروع بناء 8 بواخر متعددة الاغراض مختلفة الحمولة		

	32%	25%	18%	25%	0%	0%	0%	100%	2020	2019	2	مشروع شراء بواخر صيد عدد (2)	
	75%	75%	25%	25%	0%	0%	0%	100%	2020	2019	1	مشروع نقل اشخاص من رصيف العشار الى جزيرة كيتش وموانئ الخليج العربي والخليج	
	5%	5%	5%	5%	0%	0%	90%	99%	2019	2008	11	شراء معدات محطة الموانئ	
	2.50%		2.50%	5%	0%	0%	95%	100%	2019	2008	11	شراء معدات بحرية	
	6.10%	3.30%	4.26%	7%	6.70%	6.70%	53%	100%	2022	2016	7	تأهيل قطاع الموانئ (التجديف الاثرية)	
	0%	15%	0	14.90%	10.10%	10.10%	60%	100%	2019	2016	1	مشروع تأهيل رصيف (6 ميناء ام قصر الجنوبي)	
	7%	24%	11%	24%	0%	0%	52%	100%	2019	2017	1	مشروع تأهيل رصيف رقم 9	
	7%	30%	15%	25%	15%	15%	30%	100%	2019	2017	1	مشروع تأهيل رصيف رقم 5	
	4%	45%	19.60%	34.10%	9.90%	9.90%	11%	100%	2019	2017	1	مشروع تأهيل رصيف رقم 7	
	1%	40%	1%	35.50%	4.50%	4.50%	20%	100%	2019	2017	1	مشروع تأهيل رصيف رقم 4	
	2%	40%	25%	20%	0%	0%	8%	100%	2020	2018	2	مشروع تأهيل رصيف رقم 8	
	0%	25%	0	25%			0%	100%		-	2	مشروع إنشاء رصيف نبطي في حور الزبير	
	0%	20%	0	20%			0%	100%			3	مشروع إنشاء رصيف الموانئ	
	0%	25%	9.45%	25%			0%	100%				مشروع إنشاء رصيف حاويات	
	10.64%	7%	29.40%	16.40%	16.60%	16.60%	17%	100%		2017 (تسجل عدد)	2	تأهيل الأرصفة (12-15) وبناء أرصفة جديدة في ام قصر الشمال	
	19%	11%	8%	45%	4%	4%	1%	100%		2015 29/3/2018 (تسجل عدد)	2	تأهيل رصيف رقم 16 ميناء ام قصر الشمالي و رصيف 9 في حور الزبير	
	5%	5%	4%	12%	3%	3%	15%	100%		2017	4	تأهيل رصيف رقم 17 مع إنشاء رصيفين جديدين في ميناء ام قصر الشمالي	
	2%		75%					100%		2018		تأهيل رصيف رقم 18	
	0%	10%	17%	9%	3%	3%	78%	100%		العمل مستمر حتى فترة التسليم	2016	1	تأهيل رصيف رقم 19
	4%	15%	5%	14%	0%	0%	71%	100%		من تأهيل الرصيف رقم 20 وتسليمه في 19/3/2016			تأهيل رصيف رقم 21
	0.20%	5%	2%	4%	1%	1%	صغير	50%	2024	2018	6	مخطة تحديث الارضيات في ميناء رقم 3 ميناء ام قصر	
	0%		0					100%		2014	2	إنشاء رصيف نبطي في قناة حور الزبير	
	0%	14%	0	10%	1%	1%	75%	100%		يوجد فترة تسديد للعقد	2016	1	تأهيل الأرصفة 2,3,4 في ميناء حور الزبير
	16%	26%	21%	20%	44%	44%		100%		2016 2018 (تسجل عدد)	2	تأهيل الأرصفة 5,6,7 في ميناء حور الزبير	
	4%	15%	0	15%			0%	60%	2020	2018	2	بناء رصيف نبطي بين الرصيفين 4 و 5 في حور الزبير	
	17%	7%	17%	4%	29%	29%	17%	100%	2020	2017	2	بناء رصيف نبطي في ميناء حور الزبير (رصيف 11)	
	8.50%	20%	10%	20%	20%	20%	35%	100%	2020	2017	2	تأهيل رصيف رقم 12 في حور الزبير	
		20%	0	5%	15%	15%	0%	40%	2022	2017	5	إنشاء أرصفة بحرية نبطية على قناة حور الزبير	
	12.45%	41%	55.55%	40%	18%	18%		100%	2020	2019 تسجل عدد	2	تأهيل الأرصفة 1,2,3 في ميناء أبو فلوس	
	26%	27%	23%	20%	11%	11%		100%	2020	2018	2	إنشاء رصيف تجاري و رصيف مسافرين في الواسطية	

رقع طاقة الموانئ الحالية لتصل الى 23 مليون طن سنوياً (وزارة النقل)

# وزارة الاتصالات

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	كانون الأول - 4م		تموز - 3م		نيسان - 2م		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الانجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المتعددة للتقييم	المشروع	الفترة الزمنية لتنفيذ	فترة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
					0	0	0	قانون	2019	2018	1	تشريع قانون للرقابة الإلكترونية	لم تعدد	تشريع قانون للرقابة الإلكترونية وتأمين متطلبات الأمن السيبراني
					0	0	0	4 مليون مشترك	2021	2019	3	الهاتف النقال 4G	متوسط	طرح الجيل الرابع من الهاتف النقال 4G بمشاركة الوزارة والقطاع الخاص
		0.75		0	0	0	0.6 مليون مشترك	4.6 مليون مشترك	2022	2018	5	مشروع الكابل الضوئي (بالمشاركة)	متوسط	اكتمال متطلبات مشروع الكابل الضوئي وجدول زمني واضح وتصحيح الخطأ والخمائر التعاقدية السابقة
	21	40	61.4	30	15	15	35	500	2022	2010	13	تسويق البنى التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص	متوسط	مضاعفة سعة وسرعة شبكة الانترنت خصوصا في استعمالها في البحث والتطوير وانجاز المعاملات
	72224	75764	200000	200000	150000	150000	2.7 مليون مشترك	4015623	2021	2018	5	زيادة نسبة النشار الهاتف الضوئي الثابت، والهاتف اللاسلكي	طويل الأمد	اعادة خدمة الهاتف الأرضي وربطه بشبكة الانترنت واعادة ثقة المواطن به كمتنافس لشبكات الهاتف المحمول
					100	100	80%	100%	2019	2010	9	ربط الدوائر في بغداد والمحافظات لاسلكياً (LTE)	سريع	تقديم الاستشارة الخدمية لكافة وزارات ودوائر الدولة لانجاز الحوكمة الالكترونية في كافة مرافق الدولة وخصوصا المصارف والدفع الالكتروني ودوائر التسجيل العقاري وقوى الامن الداخلي والدفاع
	0	20	6	20	0	0	0	ثلاثة شبكات ضوئية	2023	2019	5	تطوير وتوسيع الشبكات الضوئية		

# وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية

الملاحظات	كانون الأول - 2014		تموز - 2013		يناير - 2012		الواقع الحال (عدد أو نسبة)	المستهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الإصدار	تاريخ التنفيذ	الفترة الممتدة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتمديد	فترة البرنامج الحكومي	
	التمتع	المستهدف	التمتع	المستهدف	التمتع	المستهدف									
	0%						0%	100%	-	-	-	مشروع بناء البصرة الكبرى (بمراحل الإنشاء المتقدمة)		لم تحدد	التعاقد بأسرع وقت مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لإنجاز مشروع تحلية مياه البحر في البصرة على أن تعجز جدواوى زمنية واضحة. وبمكس نفس الأثر على المحافظات الجنوبية الأخرى التي تعاني من ملوحة المياه بشكل الفل
	13%	25%		5%	4.00%	5%	15%	0	2019	2016	2	مشروع مياه البصرة الكبرى المرحلة الثانية			
	6%	4%		5%	1%	4%	86%	0	2018	2014	3	مشروع مياه البصرة الكبرى المرحلة الثالثة			
	6%	3%		5%	2%	3%	87%	0	2018	2014	4	مشروع مياه البصرة الكبرى المرحلة الرابعة			
	3%	10%	5%	6%	4%	4%	17,72%	100%	2022	2018	3	إنشاء جسر سلمان الفارسي وبغديزة		طويل	إنجاز طرق جديفة لمدينة العراق الكبيرة (RING ROAD) وبدون زمني واضح ومن ذلك اكتمال الطرق الحلقية المتوقفة وغير المكتملة ومنها الطريق الحلقى السريع للعاصمة بغداد
	3%	4%	7%	8.00%	6%	6%	58%	100%	2022	2018	4	تطوير شبكة الطرق في بغداد والفرقة والطريق الجديد بطول 10 كم بمساحة 1000 هكتار			
	0%	1%		1%	0%	1%	97%	100%		2005	6 اشهر	تطوير الطرق في بغداد		سريع	البدء ببناء وحدات سكنية تفضل بشكل واضح العجوة بين العرض والطلب وتوزيعها على الفئات المسجلة تحت حيد الفقر في سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي لا تمتلك دار سكن لائفة
	2%	2%		1%	0%	1%	95%	100%		2008	10 اشهر	تطوير الطرق في بغداد			
	0%	0%		0%	0%	0%	19,3%	100%		2012	4	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	71,3%	100%		2010	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	1%		0%	0%	0%	63,1%	100%		2005	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	35,5%	100%		2011	4	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	52,8%	100%		2010	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	55,5%	100%		2011	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	32,3%	100%		2011	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	8%		7%	0%	5%	60%	100%		2010	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	33,9%	100%		2014	4	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	66,3%	100%		2011	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	3,9%	100%		2014	4	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	8%		8%	0%	5%	33,2%	100%		2012	4	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	65,7%	100%		2012	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	2%	8%		8%	0%	5%	51,6%	100%		2011	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	4%	100%		2012	4	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	29%	100%		2011	2	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	84%	100%		2011	2	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	96,6%	100%		2012	2	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	32,4%	100%		2012	4	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	0%	0%		0%	0%	0%	47,9%	100%		2012	3	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			
	1%	7%		7%	0%	5%	36,6%	100%		2012	4	تطوير الطرق في بغداد الجديدة			

	0%	0%		0%	0%	0%	10,8%	100%		2012	4	التعمير السكني في شمال العاصمة
	2%	7%		7%	0%	5%	23,9%	100%		2013	4	التعمير السكني في شمال العاصمة
	0%	7%		7%	0%	5%	61,3%	100%		2013	3	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	8%		7%	0%	5%	39%	100%		2012	4	التعمير السكني في العاصمة - من الشمال
	0%	0%		0%	0%	0%	1,08%	100%		2014	4	التعمير الاجتماعي - التعمير السكني في غرب العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	14,4%	100%		2014	4	التعمير الاجتماعي - التعمير السكني في وسط العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	18,6%	100%		2014	4	التعمير الاجتماعي - التعمير السكني في وسط العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	41%	100%		2013	3	التعمير السكني في وسط العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	28%	100%		2015	4	التعمير السكني في وسط العاصمة
	4%	7%		6%	0%	5%	52,2%	100%		2013	3	التعمير السكني في وسط العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	31,7%	100%		2013	3	التعمير السكني في وسط العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	44,7%	100%		2012	3	التعمير السكني في وسط العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	73%			2012	2	التعمير السكني في وسط العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	39%	100%		2013	3	ولاية القفلة - التعمير السكني في العاصمة - العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	5,8%	100%		2014	4	ولاية القفلة - التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	11,1%	100%		2014	3	ولاية القفلة - التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	7,6%	100%		2014	3	ولاية القفلة - التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	25%	100%		غور سائره	4	ولاية القفلة - التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	56,9%	100%		2011	3	التعمير السكني في شرق العاصمة
	4%	7%		6%	0%	5%	43,5%	100%		2012	3	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	52,3%	100%		2013	3	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	37,3%	100%		2013	4	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	4,2%	100%		2014	4	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	33,7%	100%		2014	3	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%	12,8%	100%		2014	4	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%						التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%						التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	0%		0%	0%	0%						التعمير السكني في شرق العاصمة
	2%	3%	4%	4%	3%	3%	68,39%	100%	2022	2018	4	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0	1%	0	0%	0	0%	93,01%	100%	/	متوقف	2	التعمير السكني في شرق العاصمة
	5%	2%	2%	2,00%	2%	2%	91,49%	100%	2020	2018	3	التعمير السكني في شرق العاصمة
	5%	6%	5%	7%	5%	7%	13%	100%	2021	2018	4	التعمير السكني في شرق العاصمة
	0%	3%		3%	4%	5%	87%	100%	2016	2010	1	التعمير السكني في شرق العاصمة
	5%	20%		15%	6%	6%	54%	100%	2015	2012	1	التعمير السكني في شرق العاصمة
	2%	15%		10%	8%	6%	62%	100%	2015	2013	1	التعمير السكني في شرق العاصمة
	1%	3%		2%	3%	5%	90%	100%	2015	2014	1	التعمير السكني في شرق العاصمة
	11%	5%		5%	4%	10%	35%	100%	2016	2013	2	التعمير السكني في شرق العاصمة

متوسط / طويل

اكتمال طريق المرور السريع وتأهيله على أن يكتمل التأهيل وتكامل هذه المسؤولية المشتركة مع وزارة النقل

لم تحدد

اكتمال مشاريع الجدران والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة المسؤولية الخاصة بالتنفيذ مع الجهات الأخرى

	0%			0%	0%	93%	100%	2015	2011	1	مشروع ماء فري العنة (العاون) بايل (10000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%		2%	1%	3%	95%	100%	2016	2013	1	مشروع ماء ابي شوق (بايل/4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	5%	11%	6%	6%	49%	100%	2016	2016	2	مشروع ماء النعيف-كوفة النعيف (16000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	3%	5%	5%	1%	7%	48%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء الصعارة المثي (10000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	9%	15%	10%	7%	24%	النسبة المتعلق التكميلية (46%)	100%	2016	2013	1	مشروع ماء الاصلاح - العدايش دي فزار (1000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	2%	1%	2%	3%	89%	100%	2014	2008	1	مشروع ماء العفارة ليبسان (16000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	1%	15%	5%	7%	8%	67%	100%	2015	2012	1	مشروع ماء البيروان بغداد (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	2%	5%	5%	5%	88%	100%	2011	2009	1	مشروع ماء الحسينية (2) بغداد (1000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	2%	20%	10%	12%	12%	53%	100%	2015	2012	1	مشروع ماء ناحية الزهراء المركزي بغداد (10000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%			0%	0%	52%	100%	2014	2011	2	مشروع ماء القوس بنوي (2000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	24%	1%	22	2%	2%	18%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء العفارة- الشوبر- تل عمتة) بنوي (3000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	23	22	3331%	0%	15%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء ناز كركوك (2000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	0	0	0%	0%	48%	100%	2015	2011	2	مشروع ماء خان بني سعد/ بابل (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	5%	13%	2%	2%	5%	100%	2016	2012	2	مشروع ماء جديدة الشعا بابل (2000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	15%	5%	5%	3%	3%	62%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء السادة العصور بابل (2000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	17%	5%	60	0%	0%	50%	100%	2015	2013	2	مشروع ماء السلام والسراج والمصورة بابل (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	13%	5%	25	0%	0%	16%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء الفصيل بغداد (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	0	0	0%	0%	36%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء عدا بغداد (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	5%	15	4%	4%	6%	100%	2014	2012	2	مشروع ماء الفادسية/ بغداد (1000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	16%	0	0	0%	0%	42%	100%	2014	2013	2	مشروع ماء الفوجة/ الانبار (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	4%	5	65	2%	2%	58%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء العديدي، الدوقان، الانبار (3000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	5%	5%	2%	2%	28%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء ناحية الكفل بايل (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	2%	40	1%	1%	37%	100%	2017	2013	2	مشروع ماء العويرات/الضوي العربي كربلاء (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0%	0	0	0%	0%	52%	100%	2016	2011	2	مشروع ماء الشامية القادسية (4000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	1%	5%	25	0%	0%	16%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء الناصرية (2) دي فزار (10000 م <sup>3</sup> /ساعة)
	0.90%	18%	16%	83.00%	66.00%	0%	100%	2018	2011	1	مقابلة التصميم وتنفيذ بحرين محاري الحدانية (التحلية مفتاح)
	2%	12%	11%	40%	42%	0%	100%	2015	2012	2	مشروع بحرين وتنفيذ محطة معالجة الحيات ابيس مدينة النور (الترجمة 37) في محافظة بنوي
	0%	12%	13%	29%	35.00%	0%	100%	2015	2013	2	مشروع بحرين وتنفيذ محطة معالجة الحيات ابيس مدينة النور (الترجمة الثانية) في محافظة بنوي
	0%	2%	2%	26.00%	96.00%	0%	100%	2014	2012	1	مشروع بحرين وتنفيذ الخطوط الثلاثة الغربية في محطة رفع (47) في محافظة بنوي
	5%	14%	10%	16.00%	51.00%	0%	100%	2015	2013	2	مناقشة بحرين وتنفيذ الخطوط الثلاثة للبحرين الثالثة من اربع محطات رفع مدينة النور الحيات ابيس (الترجمة الرابعة)
	0%	0%	0%	68.00%	100%	0%	100%	2017	2012	1	التدقيق لاصفايم وبحرين وتنفيذ والتعليق وصيانة الشبكة محاري بركة بنوي نطاق تصفية (47) في بنوي
	9.06%	27%	22%	5%	1.00%	0%	100%	2015	2013	2	بحرين وتنفيذ محطة معالجة الحيات ابيس (3) (47) في بنوي
	7%	18%	30%	3.00%	2.00%	0%	100%	2015	2013	2	بحرين وتنفيذ محطة معالجة الحيات ابيس (2) (47) في بنوي




	1%	0%		0%	99.00%	100%	0%	100%	2018	2013	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	0%		0%	51.00%	100%	0%	100%	2017	2011	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	3%	0%		21%	88%	79.00%	0%	100%	2016	2012	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	3.30%	8%		3%	72.00%	89.00%	0%	100%	2015	2009	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	18%		6%	55%	76.00%	0%	100%	2015	2012	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	1.00%	100%		100%	55%	100%	0%	100%	2016	2013	2	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	2%	12%		13%	61.00%	50.00%	0%	100%	2016	2012	2	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	8%	0%		0%	30.00%	100%	0%	100%	2014	2011	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	30%		20%	29.00%	30%	0%	100%	2016	2013	2	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	15%		12%	52%	48%	0%	100%	2016	2013	2	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	1.58%	0%		0%	93.00%	100%	0%	100%	2017	2011	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	0%		0%	51.00%	100%	0%	100%	2014	2013	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	0%		0%	93%	100%	0%	100%	2016	2012	ستة أشهر	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	0%		0%	50%	100%	0%	100%	2014	2013	ستة أشهر	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	0%		0%	100%	100%	0%	100%	2013	2013	أربعة أشهر	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0%	0%		0%	100%	100%	0%	100%	2017	2014	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	4%	0%		0%	60%	100%	0%	100%	2013	2012	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	7.50%	0%		0%	82.00%	100%	0%	100%	2014	2012	1	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	4%	5%	2%	2%	0	0	63%	100%	متعدد	متعدد	متعدد	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	8%	5%	6%	6%	14%	14%	37%	100%	2020	2018	3	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	4%	10%	5%	9%	6%	6%	50%	100%	2020	2018	2	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	1%	7%	8%	8%	10%	10%	18%	100%	2020	2018	3	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	4%	3%	4%	4%	2%	2%	11%	100%	2021	2018	4	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	4%	4%	9%	4%	3%	3%	69%	100%	2020	2018	3	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	0.5	2%	1%	3%	0	0	متعدد	100%	متعدد	متعدد	3	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	1	1%	1%	1.00%	0%	0%	98,59%	100%	متوقف	متوقف	2	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	1	5%	0%	3%	0%	0%	90%	100%	متوقف	متوقف	2	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	11%	10%	10%	12%	8%	8%	3%	100%	متوقف	متوقف	3	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة
	5%	3%	1%	3%	0%	0%	84%	100%	2019	2018	2	تطوير وتطوير الخدمات الصحية في مستشفى جامعة القاهرة

سريع

العمل خطة مشروعة لإنشاء الطرق واكسابها على ان تقوم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول الكميات وتقديم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات

0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	غير مدرج	100%	غير مدرج	غير مدرج	1	انشاء الممر الثاني لطريق حبرية / حياضية
5%	5%	4%	5%	0%	0%	0%	85%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء الممر الثاني لطريق بفقوية بين سعد بغداد القديم بطول 43 كم
7%	5%	2%	5%	0%	0%	0%	66%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء مقاطع ابو عاز بن النعم بطول 40 كم في محافظة ذي قار
1	2%	0%	1%	0%	0%	0%	58,7%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء طريق قرية ننه عمر عندان لطريق بغداد الكركوك بطول 33 كم
0	3%	0%	1%	0%	0%	0%	26,3%	100%	متوقف	متوقف	4	انشاء طريق العج التي بطول 23,9 كم على مراحل
2	2%	0%	1%	0%	0%	0%	9%	100%	متوقف	متوقف	4	انشاء طريق الرجاء النخعية بطول 134 كم
3%	2%	2%	2%	0%	0%	0%	70%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء الممر الثاني لطريق كربلاء / البرزخ الاخصير بمعمل بطول 90 كم
2	2%	0%	0%	0%	0%	0%	58%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء الممر الثاني لطريق سمانود منطقة طريق سدطه ابو نجم بطول 10,2 كم
5%	7%	3%	3%	0%	0%	0%	71%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء جسر القربة الثاني / محافظة النجف
10%	5%	4%	4%	1%	1%	1%	88%	100%	2020	2018	3	انشاء جسر الهندية الثاني ومقارباته / محافظة كربلاء
0	2%	0%	0%	0%	0%	0%	48%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء جسر عبر الدين / محافظة النجف
17%	4%	28%	25%	25%	25%	25%	0%	100%	2019	2018	1	الاعمال التكميلية لتجسر الدواس الكونكريت البديل عن جسر العالم
5%	5%	1%	4%	0%	0%	0%	11%	100%	متوقف	متوقف	4	انشاء طريق بوزة / بوسنة للممر السريع بطول 14 كم محافظة بغداد
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء طريق ابو العيص
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	100%	متوقف	متوقف	4	طريق تكريت الطول البديل
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	100%	متوقف	متوقف	3	تكملة طريق خدمة الزائرين ( بغداد - جسر السكة ) بطول ( 21,75 ) كم
3%	5%	4%	3%	0%	0%	0%	59%	100%	متوقف	متوقف	3	تشييد ( 78,5 ) كم طرق في مناطق محور محافظة ذي قار / برنامج العمل الامور
8%	6%	5%	10%	3%	4%	4%	0%	100%	/	لم يحال	4	الطريق العمودي بين عزر - عترة بطول 2,37 كم وعلى مراحل
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	47%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء طريق كسند - ربيعة بعمق والممر الثاني من 42 كم: 67 كم
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	91%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء الممر الثاني لطريق بفقوية - حانقين - الخندرية
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	100%	متوقف	متوقف	4	انشاء الممر الثاني لطريق رمادي - مشنة بطول 140 كم ( المرحلة الاولى )
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء الممر الثاني لطريق مدخل الصويرة مع انشاء جسر ثاني على جسر دجلة بطول 12 كم من مقاطع بمسكون / جسر ضمن الطريق
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء الممر الثاني لطريق الجودي الى قضاء المظاربة بطول 15 كم
0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء الممر الثاني لطريق سعد الشيب العمودي / مقاطع ( معارة - طيب - مشير - كعلاما - العمود الارابية بطول ( 44,135 ) كم
4%	3%	1%	1%	0%	0%	0%	33%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء جسر حديثة ومقارباته / محافظة الانبار

	0	1%	0%	0%	0%	0%	99%	100%	متوقف	متوقف	2	التدابير المتخذة في التوعية المجتمعية
	3%	16%	0%	10%	0%	0%	14%	100%	متوقف	متوقف	3	استكمال الجلسات التدريبية لمتطوعي الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
	0	1%	0%	0%	0%	0%	82%	100%	متوقف	متوقف	2	استكمال الجلسات التدريبية لمتطوعي الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
	0	3%	0%	2%	0%	0%	90%	100%	متوقف	متوقف	2	العمل على استكمال الجلسات التدريبية لمتطوعي الجمعية بمكة المكرمة
	0	1%	0%	0%	0%	0%	9%	100%	متوقف	متوقف	4	استكمال الجلسات التدريبية لمتطوعي الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
	5%	3%	3%	2%	0%	0%	13,50%	100%	متوقف	متوقف	3	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0	1	0%	0	0%	0%	26%	100%	متوقف	متوقف	2	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0	1%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	متوقف	متوقف	4	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0	2%	0%	0%	0%	0%	96%	100%	متوقف	متوقف	2	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0	0%	0%	0%	0%	0%						التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	3	2	1	1	0	0						التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	13	20%	0%	0%	0%	0%				2020		التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	22	65%	0%	0%	0%	0%				2019		التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0	0%	0%	0%	0%	0%						التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0	0%	100%	0%	100%	100%						التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	6%	9%		10%	5%	10%	71%	100%	2019	2030	1	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	5%	15%		15%	2%	2%	38%	100%	2020	2014	2	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	20%	25%		30%	7%	7%	8%	100%	2020	2014	2	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	7%	25%		20%	0%	0%	35%	100%	2020	2013	2	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	8%	20%		12%	0%	0%	16%	100%	2020	2013	2	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	3.00%	20%		15%	0%	0%	1%	100%	2020	2013	2	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0%	20%		13%	0%	0%	77%	100%	2019	2013	1	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	20%	25%		15%	0%	0%	21%	100%	2019	2013	1	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	11%	20%		10%	0%	0%		100%		2013	/	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0%			0%	0%							التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0%			0%	0%		0%	100%		2013		التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0%			0%	0%							التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	0%			100%	100%	100%	100%	100%	منجز	2013	1	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية
	150%	2%		5%	7%	7%	86%	100%	2018	2013	1	التدابير المتخذة للتوعية المجتمعية



	0%	4%		5%	8%	8%	83%	100%	2019	2013	1	تخطيط التوزيع في قطاع الهندسة - ابراج جسد 2011
	0%				0%	0%	37%	100%	2019	2013	1	تخطيط وتجهيز التوزيع بقطاع ابراج
	9%	30%		30%	0%	0%	10%	100%	2019	2013	1	تخطيط التوزيع في قطاع المخطوط
	28%	20%		20%	0%	0%	23%	100%	2020	2014	2	مخطوطات التوزيع في القطاع الكهربائي
	19%	20%		10%	0%	0%	5%	100%	2019	2015	1	مخطوطات التوزيع والاشعة والكابلات الوسطية في قطاع

# وزارة الشباب والرياضة

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	كانون الأول - 4هـ		نومور - 3هـ		نيسان - 2هـ		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الانجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتصديق	فترة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	2023	2018	6	انشاء صندوق ساهدي لتنمية الشباب في المحافظات كافة	لم تحدد	
	7%	10%	5%	5%	5%	5%	0%	100%	2023	2008	6	تمكين الشباب وأهليهم للعمل على فريز عمل		
	3%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	100%	2022	2018	5	تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة للشباب بالتعاون مع البنك المركزي او تصاريح المعاقرة والمناطق الدولية		
	40000	40000	30000	30000	30000	30000	50000	100%	2022	2009	24	تعزيز الشعور الوطني لدى الشباب ومشاركتهم الفاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية		
	7%	10%	4%	5%	2%	5%	5%	100%	2022	2018	5	تفقد برامج والنشطة الخيرية الخيرية لطاقي الشباب والرياضة 2023-2018		
	0%	0%	25%	25%	25%	25%	50%	100%	2019	2018	2	اعداد روية 2020 للشباب للسنوات العشر القادمة وبما يتكامل مع الية الديموقراطية والتنمية المستدامة		
	8%	10%	15%	15%	25%	25%	50%	100%	2019	2018	2	اعداد صبح شامل للشباب العراقي ليتم وضع سياسات وبرامج للشباب على كافة المستويات		
	20	20	80	80	70	70	180	400	2022	2009	14	عقد الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الشباب والرياضة		
	6	6	4	5	0	5	8	40مظاهرة	2022	2018	5	رصد مخاوف من الظواهر السلبية في تجربة الشباب ووضع الحلول الناجمة		
	0%	0%	2%	10%	0%	10%	5%	100%	2022	2019	4	تنشيط منظمات الشباب والرياضة في محافظات العراق من خلال رسم خطط وبرامج لمنظمات الشباب والرياضة بالتعاون بين الوزارة والمحافظة وهي البرامج الحكومي وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الانشطة		
	0	16	0	16	0	0	0	42نشاط	2020	2018	3	تنفيذ مشروع بغداد عاصمة الشباب العربي 2020		
	0	25000	0	25000	0	0	3500	250000 مستهدف	2022	2018	5	مشروع بناء السلام (برامج وتدريب وورش حول السلام وثقافته واعادة التاجمة الوطنية بين فئات المجتمع)		
	250	250	478	250	1319	500	2250	3000 موظف	2022	2008	15	التطوير الموسمي من خلال برامج وورش تدريبية لرفع كفاءة الموظفين لتقديم خدمة افضل		
	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	2022	2012	11	اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية		
	8%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	2022	2019	4	اكتشاف ورعاية المواهب العلمية		
	5%	10%	0%	5%	5%	5%	5%	100%	2022	2018	5	اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية		
	3%	10%	8%	10%	2%	5%	0%	100%	2022	2019	4	سدادة القدرات الشبابية (تنفيذ برامج وتنشئة وورش لتسليم القدرات الشبابية)		
	0%	50%	0%	50%	0	0	0%	100%	2019	2019	1	البرامج والانشطة الاسلامية المستضافة في العراق 2019		
	3.50%	7%	3%	3%	0%	0%	0%	100%	2022	2019	4	تأسيس الاكاديميات والراكز العلمية (اكاديمية الشباب للتطوير - مركز التدريب - مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات - المركز الوطني للتدريب والابداع)		
	10%	25%	25%	25%	50%	50%	0%	100%	2019	2019	1	اعداد تعليمات العمل التطوعي		
	5%	5%	5%	5%	10%	10%	20%	100%	2022	2018	4	برامج تدريبية للعمل التطوعي		
	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	100%	2022	2019	4	وضع برامج تنفيذية لممارسة الرياضة للجميع		
	4%	4%	3%	3%	0%	3%	5%	100%	2022	2012	11	توفير المساحات الخضراء لممارسة الرياضة للجميع بالتعاون مع المحافظات		

وضع الاجراءات العملية لتحسين الشباب العراقي ومساعدتهم لاكتشاف قابلياتهم وكفاءاتهم والابتعاد عن السلوكيات والعادات المضرة صعباً وأخلاقياً . واعادة تفعيل عمل المؤسسة الشبابية في عممة كسب وتعليم ورعاية الشباب لممارسة هواياتهم الثقافية والفنية والعلمية والرياضية وتحفيز المواهب المتميزة مهم كل في حل تخصصه . ونشر ثقافة العمل الطوعي لتنمية القابليات البشرية والمجتمعية وفي خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية والانسانية . والسمي الجاد لوضع المادة 36 من الدستور موضع التنفيذ ونشر الممارسة الرياضية في الاوساط الاجتماعية ولكل الشرائح والاعمار لما في ذلك من فوائد اقتصادية وصحية وتربوية ونفسية وامنية

	1	2	0	0	0	0	0	5	2020	2018	3	القرار القواني العاصم بالرياضة	لم تحدد	الاسراع باكمال تعديل وتحديث وتشريع القوانين المعطلة للمؤسسات الرياضية كافة. ووضع حد للتقاطعات والاختلافات المضرة في الاوساط الرياضية
	0	1	0	0	0	0	0	1	2019	2018	2	القرار القواني العاصم بالشباب	لم تحدد	التفكير بإعادة بناء هيكلية تنظيمية حديثة تؤمن للحركة الرياضية وتناجها ديمومة وتصاعد في التطور والاستقرار
	0%	15%	0%	10%	0%	0%	50%	100%	2020	2019	2	اعداد هيكل تنظيمي ينظم الحركة الرياضية في العراق (مجلس اهل الرياضيين)	لم تحدد	مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وبما يتناسب مع توجيهات الحكومة
	10%	20%	15%	15%	15%	15%	50%	100%	2019	2018	2	مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وبما يتناسب مع توجيهات الحكومة	لم تحدد	مواصلة الدعم المعنوي والمادي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها المختلفة. ومواصلة الدعم المقدم الى اللجنة الاولمبية الوطنية لمتحدي الاعاقة بما يضمن لها مواصلة مسؤولياتها
	30%	30%	35%	35%	35%	35%	100%	100%	2022	2004	19	مواصلة الدعم المعنوي	لم تحدد	اعادة الفعاليات الشبابية والرياضة الى المدارس والتوسع في فتح مدارس الموهبة الرياضية
	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	100%	2022	2019	4	القائمة أنشطة مشتركة في المدارس ومسابقات الشباب	لم تحدد	دورات وورش تدريبية وندوات واجتماعات لتشجيع الاندية الرياضية على التحول الى مؤسسات اجتماعية ذاتية التمويل
	10%	10%	10%	10%	5%	5%	0%	100%	2022	2019	4	دورات وورش تدريبية وندوات واجتماعات لتشجيع الاندية الرياضية على التحول الى مؤسسات اجتماعية ذاتية التمويل	لم تحدد	اعداد وتنفيذ برامج للتصحيح المصادر لقيادات المؤسسات الشبابية والرياضية للايقاظ بالحركة الرياضية والشبابية
	5%	5%	5%	5%	10%	10%	20%	100%	2022	2012	10	اعداد وتنفيذ برامج للتصحيح المصادر لقيادات المؤسسات الشبابية والرياضية للايقاظ بالحركة الرياضية والشبابية	متوسط	اكمال الابداع الرياضية المتعاقد عليها
	1.37%	1%	0.00%	1.47%	0.73%	1.47%	78%	100%	2022	2007	15	انشاء فاعليات رياضية في بغداد والمحافظات عدد (15)		انشاء مستشفيات متخصصة وعلاجية عدد (7) في بغداد والمحافظات
	0.66%	0.20%	0.20%	0.20%	0%	0%	98%	100%	2022	2007	15	انشاء مستشفيات متخصصة وعلاجية عدد (7) في بغداد والمحافظات		انشاء مستشفى اولمبية عدد (3) في المحافظات
	0.50%	0.20%	0.30%	0.30%	0%	0%	97%	100%	2022	2007	15	انشاء مستشفيات اولمبية عدد (3) في المحافظات		انشاء وتطوير وتأهيل (40) صالات للتمارين والرياضة في بغداد والمحافظات
	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	100%	100%	2022	2008	14	انشاء وتطوير وتأهيل (40) صالات للتمارين والرياضة في بغداد والمحافظات		انشاء ملاعب ساحة (1000) مفرق في نواحي بغداد والمحافظات عدد (12)
	0.68%	0.40%	0.40%	0.40%	0%	0%	96%	100%	2022	2008	14	انشاء ملاعب ساحة (1000) مفرق في نواحي بغداد والمحافظات عدد (12)		انشاء ملاعب رياضية ساحة (2000) مفرق في النجف بغداد والمحافظات عدد (20)
	0.51%	0.90%	0.90%	0.90%	0%	0%	91%	100%	2022	2008	14	انشاء ملاعب رياضية ساحة (2000) مفرق في النجف بغداد والمحافظات عدد (20)		انشاء فاعليات رياضية مغلقة ساحة (800) مفرق في النجف بغداد والمحافظات عدد (8)
	0.00%	1.60%	0.00%	1.60%	0%	0%	84%	100%	2022	2008	14	انشاء فاعليات رياضية مغلقة ساحة (800) مفرق في النجف بغداد والمحافظات عدد (8)		تصميم وانشاء فاعليات رياضية مغلقة ساحة (800) مفرق في بغداد والمحافظات عدد (8)
	0.00%	3.80%	2.38%	3.80%	0%	0%	62%	100%	2022	2008	14	تصميم وانشاء فاعليات رياضية مغلقة ساحة (800) مفرق في بغداد والمحافظات عدد (8)		اقامة مسابقات الدائية لمتواجبة في بغداد والمحافظات عدد (10)
	0.00%	0.80%	0.77%	0.80%	0%	0%	92%	100%	2022	2008	14	اقامة مسابقات الدائية لمتواجبة في بغداد والمحافظات عدد (10)		انشاء مستشفى اولمبية مغلقة عدد (3) في بغداد والمحافظات مع (2) اقسام صيد البري في نواحي عدد (1)
	0.00%	4.90%	0.00%	4.90%	0%	0%	52%	100%	2022	2008	14	انشاء مستشفى اولمبية مغلقة عدد (3) في بغداد والمحافظات مع (2) اقسام صيد البري في نواحي عدد (1)		انشاء مسابقات رياضة خيلية عدد (2) في المحافظات
	1.50%	1.50%	0.00%	1.50%	0%	0%	85%	100%	2022	2008	14	انشاء مسابقات رياضة خيلية عدد (2) في المحافظات		انشاء مطبخ من شكل مسابقات في بغداد والمحافظات عدد (13)
	0.68%	0.20%	0.20%	0.20%	0%	0%	98%	100%	2022	2008	14	انشاء مطبخ من شكل مسابقات في بغداد والمحافظات عدد (13)		اعداد الدراسات والتمارين والتدريب والترويج للتمارين الرياضية الجديدة (مع الاستشارات والترويج والادارة الخارجية لخدمات التمارين الحديثة في بغداد والمحافظات وفي المحافظات واسبق
	0.00%	3.34%	0.00%	3.33%	0%	3.33%	50%	100%	2022	2011	11	اعداد الدراسات والتمارين والتدريب والترويج للتمارين الرياضية الجديدة (مع الاستشارات والترويج والادارة الخارجية لخدمات التمارين الحديثة في بغداد والمحافظات وفي المحافظات واسبق		اعداد الدراسات والتمارين والتدريب والترويج للتمارين الرياضية الجديدة (مع الاستشارات والترويج والادارة الخارجية لخدمات التمارين الحديثة في بغداد والمحافظات وفي المحافظات واسبق
	1.15%	8%	0.00%	8%	0%	0%	20%	100%	2022	2011	11	اعداد الدراسات والتمارين والتدريب والترويج للتمارين الرياضية الجديدة (مع الاستشارات والترويج والادارة الخارجية لخدمات التمارين الحديثة في بغداد والمحافظات وفي المحافظات واسبق		انشاء مسابقات متعددة الافراس مسبوقة مغلقة بالباران عدد (30) في بغداد والمحافظات الكلية - التخصص - 2.200 متر
	0.42%	0.17	0.17%	0.17	0%	0%	98%	100%	2022	2008	14	انشاء مسابقات متعددة الافراس مسبوقة مغلقة بالباران عدد (30) في بغداد والمحافظات الكلية - التخصص - 2.200 متر		تصميم وانشاء مكتبة مركزية
	0.00%	9	0.00%	9	0	0	10%	100%	2022	2011	11	تصميم وانشاء مكتبة مركزية		اوصاف اقامة اداء ثلاث طاول عدد (3) مع معلقاتها مع تطوير المساح الخارجي للعب
	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	100%	100%	2022	2008	14	اوصاف اقامة اداء ثلاث طاول عدد (3) مع معلقاتها مع تطوير المساح الخارجي للعب		انشاء اللجنة الرياضية في النجف
	2.42%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	94%	100%	2022	2008	14	انشاء اللجنة الرياضية في النجف		

	24.64%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	52%	100%	2022	2008	14	تصميم وتطوير مكتب بازل البروز مع المحافظات (12.500) مشروع و (3.000) مشروع في مدينة العتبات
	0.00%	1.07%	1.00%	1.07%	0	0	89%	100%	2022	2008	14	انشاء منشآت التماهي في الفصية ورواس بغداد والمحافظات (9.800) عدد (3)
	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	100%	100%	2022	2008	14	انشاء فاعلية رياضية (2000) مشروع في بغداد والمحافظات (11)
	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	100%	100%	2022	2010	12	انشاء فاعلية رياضية (10000) مشروع في الكوفة
	0.00%	4%	2.50%	4%	0%	0%	60%	100%	2022	2008	14	انشاء بوند شباب في كربلاء والكوفة
	0.00%	0.17%	0.00%	0.49%	0	0	97%	100%	2022	2011	11	اعداد الارشادات والتعاميم والانشاء مراكز حاسوب (80)
	0.00%	2.64%	0.00%	2.64%	0%	2.64%	56%	100%	2022	2011	11	اعداد الارشادات والتعاميم والانشاء فاعلية بوند حاسوب رياضية (طولة مطابقة رقم القاد بناء متعددة الافراد) ضمن المدينة التماهي
	0.00%	3.95%	0.00%	3.95%	0%	0%	63%	100%	2022	2010	12	تصميم والانشاء وحدة الامراض ضمن مكتب مركز حاسوب (مكتب بازل) (20) في كربلاء وواسط (20)
	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	100%	100%	2022	2011	11	تصميم والانشاء مكتب وحدة (20) التمشير في واسط
	0.00%	1.16%	0.41%	1.16%	0%	0%	88%	100%	2022	2009	13	الانشاء فاعلية رياضية بوند في سائر في بغداد والمحافظات (80)
	0.37%	0.20%	0.20%	0.20%	1.79%	0.20%	97%	100%	2022	2010	12	انشاء ملاعب مدينة شبل السدائي في بغداد والمحافظات (11)
	0.00%	5.31%	0.00%	5.31%	0%	0%	47%	100%	2022	2011	11	زالة واجهة انشاء منشآت شباب في بغداد والمحافظات (7)
	0.00%	3.07%	0.33%	3.07%	0%	0%	69%	100%	2022	2011	11	انشاء بوند شباب في بغداد والمحافظات (3) في الكركوك - ابن فخر - سامراء - صلاح الدين
	2.81%	2%	0.00%	2%	0%	2.00%	70%	100%	2022	2011	11	انشاء فاعلية رياضية (10000) مشروع (مطابقة متكاملة عدد) في بغداد
	1.10%	0.40%	0.40%	0.40%	0%	0	96%	100%	2022	2010	12	اعداد الارشادات والتعاميم والانشاء مكتب وحدة (30000) مشروع في بغداد والمحافظات (40)
	0.00%	1.08%	0.17%	1.08%	0%	0%	89%	100%	2022	2010	12	انشاء وحدة بوند رياضية (عدد 6) في بغداد والمحافظات - المستنصر
	4.58%	7.58%	0.00%	7.58%	0%	0%	25%	100%	2022	2012	10	انشاء فاعلية رياضية (2500) مشروع (عدد 13) في بغداد والمحافظات
	0.00%	1.53	0.00%	1.53%	8.25%	1.53%	77%	100%	2022	2011	11	تطوير وتطوير مكتب كركوك الاولي
	0.00%	5.00%	0.00%	5.00%	0%	0%	50%	100%	2022	2011	11	تطوير الفعالية التثقيف والارشاد للخدمات الخاصة (بمستوى الكافيتريا) في مدينة البروز مستنداً بالتكثيف والاعية التمهينية
	0.19%	2.47%	0.00%	2.47%	0.43%	2.40%	63%	100%	2022	2011	11	تصميم والانشاء ملاعب وحدة (30.000) مشروع (عدد 4) في بغداد والمحافظات
	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	100%	100%	2022	2011	11	تطوير وتطوير مكتب حيدر الاولي
	9.55%	2.93%	2.93%	2.93%	12.50%	2.93%	56%	100%	2022	2011	11	زالة وانشاء مكتب الشباب في محافظة العتبات
	0.00%											اجراء التوفيقات والتحديثات واعادة التماهي وتشريع الخطة القومية
	0.00%	1.20%	0.00%	1.20%	0	0	100%	100%	2022	2011	11	تطوير وتطوير مكتب الكوفة الاولي
	0.00%	4.10%	1.00%	4.10%	0	0	59%	100%	2022	2011	11	انشاء مقر اللجنة القومية الوطنية العراقية - المستنصر
	11.48%	2.60%	2.60%	2.60%	0	0	74%	100%	2022	2011	11	تطوير وتطوير المنشآت التماهي والارشاد في بغداد والمحافظات (17)
	0.00%	0.42	0.00%	0.42%	0.42%	0.42%	94%	100%	2022	2011	11	انشاء ملاعب ليل صناعي في الفصية ورواس بغداد والمحافظات (28)
	0.35%	1.30%	1.30%	1.30%	0	0	87%	100%	2022	2011	11	الاعداد خدمات متعددة الافراد (مطابقة للتقارير في جوانب اخرى) بغداد والمحافظات (10)
	0.00%	1.73%	1.02%	1.73%	1.73%	1.73%	74%	100%	2022	2011	11	انشاء ملاعب وحدة (30000) مشروع في بغداد والمحافظات (4)
	0.23%	2.43%	0.50%	2.43%	0%	2.43%	63%	100%	2022	2011	11	انشاء منشآت التماهي والسوية (مطابقة في الفصية ورواس بغداد والمحافظات (20) عدد

	0.00%	0.67%	0.33%	0.67%	0	0	93%	100%	2022	2011	11	الكفاءات الكوثرية واستراتيجية الشراكة في بغداد والمحافظات عدد ( 72 )
	ملجز	ملجز	منجز	منجز	ملجز	ملجز	100%	100%	2018	2011	7	تصميم وإنشاء جسر سعة (30,000) مترج في كربلاء
	0.00%	4.80%	0.00%	4.80%	2.93%	4.80%	28%	100%	2022	2011	11	تدوير النفايات وتحويلها الى طاقة سعة (200000) مترج في الموصل والفرج
	0.98%	2.67%	0.30%	2.67%	9.54%	2.67%	60%	100%	2022	2010	12	إجراء المسوحات والدراسات التربة لإنشاء مناجم عدد (2) سعة (30,000) مترج في الزمخلة ومدينة الصدر
	2.04%	2.23%	0.00%	2.23%	0	2.23%	67%	100%	2022	2011	11	تصميم والتفكير والبناء عدد (2) في البصرة
	4.76%	4.67%	1.00%	4.67%	2.81%	4.67%	30%	100%	2022	2012	10	تصميم وإنشاء ملاعب سعة (30) ألف مترج عدد (4)
	1.00%	5.80%	1.20%	5.80%	5.80%	5.80%	13%	100%	2022	2012	10	تصميم وإنشاء ملعب سعة (20) ألف مترج في الموصل
	0.00%	10%	0.00%	10%	0	0	0%	100%	2022	2013	9	تصميم وإنشاء نظام الصرف الرئيسي للمدينة سعة (100) مترج في مدينة السنية - كربلاء التدوير والتفكير المستدام
	0.00%	9.53%	0.00%	9.53%	0	0	5%	100%	---	---	---	شراء واستغلال أراضي مشاريع الشباب والترفيهية في بغداد والمحافظات

# وزارة الموارد المائية

## المحور الثالث : الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية

الملاحظات	كانون الأول - ف4		نموذج - ف3		نيسان - ف2		الواقع العال (عدد أو نسبة)	المستهدف الكل (عدد أو نسبة)	تاريخ الإجازة	تاريخ مداة التنفيذ	الفترة المعددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الرسمية للتنفيذ	فترة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
	2	3	0.5	1	0.5	1	63%	75%	2035	2011	25	الدراسة النهائية لمرحلة إنشاء السدود في الأراضي	مشروع	إعادة النظر في السياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق. ووضع بدائل ناجحة لترشيد المياه من خلال دراسته بتقديم خبراء وهموت الخبرة الوطنية والعالمية
	8.5	4	4	4	2	6	48%	100%	2022	2019	14	دراسة الجدوى الهندسية لمرحلة		
	0.95	1	0.2	0.5	0.1	0.5	97%	100%	2020	2010	11	تجديد القناة الإرادية الناقلة للمياه ضمن مشروع ربي خط العرب - دعم القطاع الزراعي (1413 كم)		
	2	4	0	3	0	0	كم 9	كم 56	2022	2004	19	دراسة ومعالجة التآكل في قناة العرب		
	3	5	0	6	3	4	50%	100%	2022	2004	19	مسح الخربة وتخطيط الأراضي		
	0.5	3	1	3	5	5	63%	100%	2022	2006	17	المراسمات والبحوث التطبيقية		
	5	6	9	9	12	12	13%	100%	2022	2011	12	القيام بمراقبة وإدارة الموارد المائية المشتركة لغرض دجلة والفرات داخل ومحارج العراق		
	4	5	0.5	4	0	2	54%	100%	2021	2004	18	التصالح الزراعي للثلاثة من مشروع نهري بغداد (11 الف دونم)		
	0.55	1.5	0	1	0	0.5	70%	100%	2021	2004	18	مشروع حربة - نفقة (194 الف دونم)		
	2	16	0	9	0	5	0%	100%	2021	2005	17	رني المثنى (11 الف دونم)		
	2	4	0	3	0	2	81%	100%	2020	2004	17	الرمادي و (1115 الف دونم)		
	10	12	0	10	0.05	5	46%	100%	2021	2004	18	مشروع شرق العراف (485 الف دونم)		
	1.9	2	0	1	0	1	53%	100%	2021	2004	18	غرب العراف (317 الف دونم)		
	6	7	2	5	0.9	4	53%	100%	2021	2005	17	مشروع الرميثة (144 الف دونم)		
	5	7	1	5	1	4	54%	100%	2021	2005	17	مشروع حلة - كفل (771 الف دونم)		
	5.5	9	1	6	1	4	26%	100%	2022	2007	16	مشروع كفل الشمالية (220 الف دونم)		
	1.5	7	0	5	0	4	33%	100%	2021	2007	15	كوت - ملوح (66 الف دونم)		
	3	4	0.5	3	0	2	62%	100%	2021	2006	16	حلة - ديوانية (271.8 الف دونم)		
	4.5	7	1	5	1	5	31%	100%	2021	2004	18	مشروع الحسنية (311 الف دونم)		

	5.5	7	0.5	3	0	3	0%	100%	2022	2010	13	استصلاح أراضي مديونية الشاهية (340 ألف دونم)
	0	10	0	3	0	2	39%	100%	2021	2004	18	زراعة مروج سد (110 ألف دونم)
	5.25	10	1	7	0	3	18%	100%	2022	2008	15	زراعة مروج سد (333 ألف دونم)
	0	5	0	1	0	1	75%	100%	2020	2004	17	إعادة إحياء منحة السويد (20 ألف دونم)
	0	12	0	3	0	2	46%	100%	2022	2009	14	مشروع القناة الرئيسية لقرى الجزيرة الشمالي (3.87 كم)
	0.3	0.3	0	0.4	0	0.3	95%	100%	2021	2004	18	الأعمال التكميلية لخطوط السدود الرئيسية للسود والحدائق
	2.5	2.5	0	1.5	0	1	18%	100%	2021	2004	18	الاستثمار المدنية للمنطقة الكروماتية لسد العديلة
	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	1%	5%	2022	2010	13	أعمال المعالجة المائية لانس سد التوسل بتضمين أعمال التشغيل
	7	6	0	4	0	1	45%	89%	2023	2012	12	تحسين مشاريع حوضي دجلة والفرات
	11	6	5	5	1.5	2	محطات 7	محطة 60	2023	2012	12	تأهيل وتطوير محطات الضخ البري دجلة والفرات
	4.5	5	0	4	0	1	58%	92%	2023	2012	12	إنشاء سدود وأهلي ومستلزمات معالجة الترعان
	4	4	0	7	0	1	150		2022	2012	11	تعزيز ونصب المضخات الحديثة
	40	55	0	40	0	5	1000 ناظم	3400 ناظم	2025	2012	14	تأهيل منشآت السيطرة للمحافظات الواقعة على نهر دجلة والفرات
	1	2	0	2	0	0	15 ناظم	غير محدد	2022	2008	15	إنشاء بوابض حديثة في المحافظات الواقعة على نهر دجلة والفرات
	3.3	4	2	4	1.5	2	46%	100%	2022	2004	19	تنفيذ أعمال ترميم العائق الأثري
	0.45	0.6	0.1	0.2	0	0.2	28%	100%	2022	2012	11	إنشاء بنية مرافقة على طول الحدود العراقية الإيرانية موزية لتسدة الآبارية العالية
	3%	4	1.8	3	1.5	2	17%	100%	2022	2012	11	حملة التوعية الوطنية للأهوار والأراضي الرطبة في العراق
	3	5	0	2	0	2	49%	85%	2024	2006	19	العمل المسح
	1	7	0	5	0	3	73%	100%	2020	2006	15	المنطقة التثلية في البصرة
	3.5	5	0	4	0	1	46%	100%	2022	2004	19	دراسات التخطيط الأثرية وإعادة التقييم
	2.5	4	0	2	0	1	61%	100%	2022	2004	19	دراسات وتجهيزات التقييم للسود الصغيرة
	0	1	0	1	0	0	65%	100%	2022	2004	19	دراسات وتجهيزات استثنائية
	70	100	0	0	0	0	0%	100%	2019	2014	5	تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام / 2014
	0	10	0	10	0	2	11%	100%	2022	2005	18	دراسة نوعية مياه الأهر الرئيسية في العراق
	0	10	0	7	0	2	25%	100%	2022	2004	19	دراسة التغيرات الهيدرولوجية
	0	5	0	5	0	4	44%	100%	2022	2005	18	إنشاء شبكة المحطات الهيدرولوجية
	0	5	0	5	0	2	51%	100%	2022	2005	18	إعداد قاعدة بيانات مكانية GIS
	0	10	0	10	0	1	18%	100%	2022	2004	19	التحكم بمنشآت الضبط وإدارة تشغيلها
	798	320	0	320	376	320	م3/تا 290	م3/تا 393	2022	2019	4	زيادة حصص العراق السنوية من نهر الفرات
	138	370	0	370	1172	370	م3/تا 310	100%	2019	2019	1	الاتفاق على الاتفاقيات المائية لهر دجلة عند الحدود العراقية - التركية
	30	20	0	20	0	0	0%	100%	2023	2019	5	تعديل وتفعيل مذكرة التفاهم لعام / 2012 مع إيران
	20	25	0	25	0	0	0%	100%	2020	2019	2	تمويل فترة المياه من معاصر اجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية لعام / 2018
	3	5	0	5	10	10	50%	100%	2022	2017	6	تنفيذ قرارات اللجنة الوصلية العليا للمياه
	0	15	0	4	0	1	0%	100%	2022	2019	4	البحث والتعليم والتطوير لاستدامة الموارد الطبيعية لمجرى ساوة



	12	45	0	25	0	10	20%	100%	2019	2014	6	مشروع تقنية ماء السماية الكبير (50 كم)		
	0	0	8	8	16	16	76%	100%	2019	2016	4	تجهيز وصيانة أعمال التغطية وإعادة تأهيل المنافذ المطر عند الوصل		
	2	10	0	5	0	5	0%	100%	2028	2018	10	التغلب قطاع الري / القرص المائي		
	12	20	0	5	5	5	0%	100%	2021	2019	3	متابع القرص المطور البنك الدولي للمناطق الجرداء / وزارة الموارد المائية		
	14.4	60	0.7	30	1	10	15 كم	5 الاف كم	2065	2015	50	تطوير حياض الري ضمن حوضي حطة والمزارع / مرحلة ثانية	لم تحدد	
	20	14	6	10	6	7	152	جمعية حسب طلب مستخدمي الماء	2022	2010	10	بشرجهوات مستخدمي الماء في محافظات بغداد		
	0.5	0.6	0	0.3	0	0.1	100%	100%	2019	2012	8	مشروع توسيع الريات الكبرى المفقود / دعم القطاع الزراعي / المشروع وسعروا المنقري (تصالح النياز الكهربائية تحطت التصح)	سريع	
	0	0	0	0	0	0	88%	100%	2020	2008	13	اكتمال القنوات العطفة والمنشآت العطفة لمساحة 215 الف دونم في كربوكا / دعم القطاع الزراعي (215 الف دونم)		
	396	215	232	215	461	470	11012	بتر سنويا 900	2022	2009	مستمر	حدر لمر الدعم العام	لم تحدد	
	3	3	3	3	4	4	71%	100%	2020	2011	10	التصالح العام او سعرو		
	2.1	1.2	0.335	1.2	0.966	1.1	153 م	35.7 مليون	2022	2007	16	إزالة الترسبات عمود المساند الرئيسية	لم تحدد	
	10810	8000	9565	10000	7500	8000	مير محمد	الف كم سنويا 26	2022	2016	7	تقنيات التداخل والتغلب / اعادة التربة		
	10.602	5.5	4.19	8	1.764	3	76 م	16.5 مليون سنويا	2022	2007	16	كثي الانهر وتطبيقاتها		
	11	23	0	5	0	1	15%	100%	2025	2007	19	توسيع شط العلة وتغلب التدويرية والمزارع		
	6.7	7.2	6	7	6.3	7.8	59%	100%	2022	2010	13	تاهيل حياض حط العبرة		
	1.7	2	1.25	1.5	2.5	2.5	85%	100%	2022	2008	15	اكتمال تنفيذ الاعمال دعم حيد التصاميم اعداد بحود الدرع والامداد القهقهه بها		
	2	2	0.5	1.2	0.6	1.8	80%	100%	2021	2008	14	مخريبات واكتمال العمود الرئيسي للتصالح العام		
	0	1200	0	600	0	200	الف دونم 13	الف دونم 48	2037	2012	25	البناء وتأهيل التوال الهائلة للمشروع	سريع	
	0.75	1	0.3	1	0.001	0.7	95%	100%	2020	2008	13	العمل المرحلة الاولى من حيز القرب الشمالي / دعم القطاع الزراعي		
	0.09	0.1	0	0.05	0	0.05	99.80%	100%	2019	2008	12	العمل المرحلة الاولى من حيز شرق القراف / دعم القطاع الزراعي		
	0.04	0.05	0	0.03	0	0.02	99.90%	100%	2019	2008	12	اكتمال تنفيذ حياض حيد القراف / دعم القطاع الزراعي		
	22	55	5	40	2	5	0%	100%	2019	2018	2	دراسة معالجة الملوحة ومنع صعود المد الفلح في شط القرب		
													البدء بمشروع تبطين القنوات المائية الفرعية باستخدام المعدات والمكانن المعطلة حالها في مخازن وشركات وزارة الموارد المائية وذلك لتقليل الهدر وتوسيد اسهلاك المياه او الاستعاضة عنها بالانابيب	
													وضع خطة بالأرقام لشمول الأراضي الزراعية بمعدات الري الحديثة لضمان انتاج زراعي ولحمروا القراض المزارعين لهذا الغرض وبالكامل مع وزارة الزراعة وبطريق مشترك واحد	
													السي زيادة التخزين المائي للبلاد وتوثير مصادر اضافية من المياه من مصادر اخرى كالمياه الجوفية ورطوبة الهواء واعادة تدوير المياه واستخدام المياه المالحه في زراعات واحثياجات تتناسب مع هذه المياه	
													كثي الانهر من قبل القطاع العام وفق خطط مدروسة والسماح للشركات بالاستثمار في هذا المجال كما كان عليه الامر قبل عقود طويلة في العراق. ومنع المزيد من التجاوزات للقطاع الاهلي لكثي الانهر والقنوات مقابل استثمار الحلي و"الزيمج" الذي توفره هذه العملية	
													العمل الجاد والسريع بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والبلديات لانهاء رمي النفايات في الانهار والترخ واختلاط المياه الثقيلة والمالحة والملوثة بالمياه الجوفية او الصالحة للشرب والاستخدام السليم والتقليل من امتداد اللسان الملحي في شط العرب وفق الدراسات التي اعدتها وزارة الموارد المائية وتعديتها لتلبية التحديات المتزايدة وصولاً لحل حاسم وواضح لهذه المشكلة كأولوية خاصة	

# وزارة الثقافة والسياحة والآثار

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	كانون الأول - 04		نومر - 03		نيسان - 02		الواقع الحالي (عدد او نسبة)	المستهدف (عدد او نسبة)	تاريخ الاجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فترة البرنامج الحكومي		
	التحقق	الهدف	التحقق	الهدف	التحقق	الهدف										
	0	0	25%	25%	75%	75%	صفر	100%	2019	2019	3 اشهر	ساحة الاحتفالات	سريع	تحويل الاصول الجامدة كالمسارح والبنى التحتية الى اصول متحركة وايضا مساهمة في التنمية الثقافية للملاد من خلال استثمارها من قبل القطاع الخاص العراقي او الاجبي		
	0	12,5	0	12,5	25%	25%	صفر	100%	2020	2019	18 شهر	مسرح الرشيد				
	0	0	0	0	1	1	صفر	1	2022	2018	4 سنوات	المسرح الوطني				
	0	0	0	0	9	10	صفر	40	2022	2015	مستمرة	جائزة الابداع العراقي	سريع	تشجيع حركة الترجمة ووضع جائزة لأفضل كتاب مترجم، وافصل عمل فني او مسرحي او ثقافي بشكل سنوي في كافة الابداعات الثقافية والترفية تفرس الرغبة عن الشعب وتفتح ملاقاته والتلاقح الثقافي مع بقية شعوب العالم		
	0	1	0	0	0	0	صفر	1	2019	2019	11شهر	مؤتمر السياسات الثقافية للمرحلة القادمة				
	0	1	0	1	0	2	صفر	16	2022	2019	4	القاعة وبنادق للاسبوع الثقافية داخل وخارج العراق				
	0	1	0	0	0	0	صفر	4	2022	2019	4 سنوات	اقامة مسابقات الابداع الشبابي المعاصر	سريع	تشجيع حركة السياحة وتسهيل دخول السياح الى العراق بالتكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية		
	0	2	0	1	0	0	صفر	6	2022	2019	4	برنامج تدريبي في الجانب السياحي مع البلدان الاخرى				
	1	4	0	0	0	0	صفر	11	2022	2019	4	انجاز مذكرات تفاهم في المجال السياحي مع البلدان الاخرى				
	0	0	0	0	4	2	صفر	18	2022	2019	4	القاعة عروض ازياء للفرجين من مركز التدريب	سريع	انشاء سوق الكتروني للاعمال الفنية تفرس تسويقها		
	0	0	0	0	10%	100%	صفر	100%	2019	2019	3 اشهر	انشاء سوق الكتروني للاعمال الفنية تفرس تسويقها				
	0	1%	0	1%	صفر%	صفر%	98%	100%	2019	2010	1	البيع السياحي والآثار والتراث في العراق والعالم				
	0	0	0	0	صفر	صفر	98%	100%	2019	2011	1	سياسة حقوق وبعادها				
	0	0	0	0	صفر	صفر	96%	100%	2019	2014	1	تأهيل المدينة المتسورة				
	0	0	0	0	صفر	صفر	90%	100%	2019	2012	1	سياسة وتأهيل مرقد بوشع حسب المستطفي ببول				
	0	0	0	0	80%	100%	0%	100%	2019	2019	3 اشهر	تأهيل وصيانة متحف الزعيم عبد الكريم قاسم				
	10%	5%	0	5%	10%	10%	فندق الرشيد جزيرة بغداد	100%	2022	2019	4 سنوات	استثمار المرافق السياحية التابعة لهيئة السياحة (فندق المرقد، دار اسراحة شعوان، مجمع ساحة السياحي، أرض فندق الترفيه، أرض فندق السلام، فندق بابل السياحي (الحلة) أرض التوكاد، موقع سد العظيم، أرض فندق الأومر، فندق نينوى السياحي، مجمع عين نهر السياحي، دار اسراحة الترفيه.			سريع	الاستثمار في المرافق السياحية المختلفة كالأثار والاموار وحمل كردستان العراق
	0	0	0	0	0	1	صفر	اتفاقية 1	2019	2019	6 اشهر	دعم الشباب للفرجور السويديين وذلك من خلال تمويل المشاريع مع الترافع المالية لكشاح السويدي				
	0	1	0	0	1	1	صفر	قاعة 10	2022	2019	4	الحق وتنشيط التراث والسياح والمصنعي الفنية والفنون الحرفي				
	0	0	0	0	5	5	صفر	20	2019	2019	6 اشهر	مخ اجازات فرقة علية في المحافظات وبعداد				
	3	1	3	2	2	3	صفر	36	2022	2019	4	القاعة توراتا لتربية ضمن مركز تدريب الآراء				
	0	0	0	0	0	25%	75%	100%	2019	2009	1	تحويل هيئة وشركة العمود لصناعة الآلات الموسيقية	سريع	الاهتمام بالفنانين في قطاع السينما والمسرح والاصناف الفنية الاخرى من خلال تشجيعهم على تأسيس شركة للإنتاج الفني والاعلامي مساهمة في كل محافظة ودعمهم بالافراض بمبادرة خاصة		

	1	1	0	1	3	2	مستمرة	مسرحة 16	2022	2019	4	انتاج مسرحيات	مسرحة	الاهتمام بمسرح الطفل ونتاج مسرحيات وفعاليات مختلفة كزيارة مناطق العراق المتنوعة والمناخف والمسهرات المدرسية والانشطة الكشفية والرياضية وتنمية القابليات لتبني شعورهم في حب الوطن والتعرف على طبيعة المجتمع والحياة والتطلع نحو المستقبل المشرق وان يتكامل هذا العمل مع مديريات التربية في المحافظات المختلفة التي تضع جدول للمساعدة والتشاورات القيادية
	0	25%	0	25%	20%	50%	صفر	100%	2019	2019	1	جربة مسرح الطفل		
	0	0	0	0	0	0	صفر	100%	2020	2020	1	مهرجان مسرح الطفل المدرسي الدول		
	10	16	15	16	19	22	صفر	نشاط 216	2022	2019	4	القيام بالزيارات والخطبة كالتحسيس ببرنامج مع القيام بالمشاهدات والزيارات التوعوية		
	3	2	1	1	2	3	6	اغنية 24	2022	2019	4	الغناء للأطفال		
	1	0	0	0	3	2	2	فلم 8	2022	2019	4	انتاج افلام وثائقية قصيرة		
	9	2	2	2	4	4	صفر	دورة 40	مستمر	2019	4	دورات تطويرية خاصة للأطفال		
	18	8	8	8	20	16	صفر	ورش 128	2022	2019	4	ورش ومحاضرات رسوم الأطفال		
	5	4	4	4	18	8	صفر	معرض 64	2022	2019	4	معارض مطبوعات الدار		
	57	40	18	40	78	48	صفر	512	2022	2019	4	احتفالات ومهرجانات ثقافية		
	3	1	0	0	1	1	2	8	2022	2019	4 سنوات	مسابقات رسوم الأطفال		
	20	9	0	9	18	18	صفر	مجلة 144	مستمر	2019	4 سنوات	اصدارات مجلات		
	1	1	1	1	0	0	صفر	بحث 8	مستمر	2019	4 سنوات	بحوث أطفال		
	0	150	0	0	0	0	-	منتج 150	2019	2019	1	مشروع انتاج ازياء للأطفال الرديحة وفلكورية تستخدم في المسارح المدرسية ومراكز الطفل والمجموع محافظات العراق		
	0	10%	0	5%	0	15%	صفر	100%	2021	2019	3	القائمة حقوق المنتجات الفنية واتوات العمل الفني (مازاري)	مسرحة	تهيئة الظروف المناسبة والدعمية الجيدة للأعمال الفنية لبيع سوق محلي ودولي لبيعها بهرض يحمي مستوى دخل الفنانين والمساهمة في زيادة الدخل القومي للبلاد ويتم هذا بالتكامل مع الصهارات العراقية في الخارج
	0	25%	0	25%	0	50%	صفر	معارض 4	2022	2019	4	الترويج للأعمال الفنية والتواصل مع السفارات لتنظيم معارض خارج العراق وتوسيع الأعمال الفنية		
	75	10	140	10	42	25	صفر	240	2022	2019	4	الانتاج على الانترنت		
	6	0	17	0	11	4	صفر	28	2022	2019	4	اقامة عروض ازياء خارج العراق ودخله ومعارض لبيع نتاجات الدار		
	10%	5%	0	10%	10%	10%	-	100%	2022	2019	4 سنوات	مفراح الفشار 7 مدن سياحية بمواصفات عالية الدميرة (ساحة الضحك) (الناسورة) (المايل) (السدقوة) (عين الصيدا) واسط السبوابه (نور السيل) (البحر) (عور ام نعا) (اصحاح النين) (التنكر) (ممس السحالي) (جبال لبعبة) خمسين (جبال) (سد العظيم) (الاسار) (سد حبيبة)	مسرحة	استثمار البحيرات والصحاري والجبال والمغارات والترويج لها سياحياً

# وزارة الهجرة والمهجرين

## المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	كانون الأول - 4		نوفمبر - 3		سبتمبر - 2		الواقع الحال (عدد أو نسبة)	المستهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الاتجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المتعددة للتقييم	المشروع	الفترة الزمنية للتقييم	فقرة البرنامج الحكومي	
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف									
		45%	90%	45%	10%	10%	صفر	100%		2019	6 اشهر	منح تجريبي بالعينة لـ 600 شخص القسم على اربع دول	متوسط - طويل	دراسة إنجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد لأسباب مختلفة تتضمن سيرهم الذاتية التفصيلية لمتابعة شؤونهم ومساعدتهم أو الاستفادة من خبراتهم داخل وخارج البلاد	
			75%	75%	25%	25%	صفر	100%		2019	3 اشهر	تصميم قاعدة بيانات وفق نتائج المنح التجريبي			
					100%	100%	صفر	100%		2018	4 اشهر	اعداد استمارة للسجل العراقيين (ورقية وتطويرها الى الكترونية)			
	5	6	4	3	2	3	صفر	مؤتمر 24		2019	2	حلقات نقاشية وترويجية وعدد مؤتمرات			
	50%	50%	50%	50%	0%	0%	صفر	100%		2019	2	نشر الاستمارة من خلال المواقع الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن تطبيقات الأجهزة الذكية			
	0%	15%	10%	10%	0	0	لا يوجد	100%		2020	2019	2			توثيق وزارة الهجرة والمهجرين مع وزارات الدول ذات الحياز المماثلة لاحتضان الاجئين (كندا واستراليا امريكا السويد والفروج)
	0%	20%	10%	15%	10%	15%	لا يوجد	ملبون عمالي 2		2020	2019	2	انشاء المركز العراقي للهجرة	متوسط	العمل مع المنظمات الدولية والمحلية والمنتمية الدولي لعودة النازحين الى مناهم وفرصهم بجدول زمني محدد على ان ينتهي ذلك في مدة سنتين
	200	400	0	400	0	200	صفر	عائلة 4000		2022	2019	4	مشروع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل للعاملين		
	0	0	0	0	0%	0%	75%	شقة 300		2020	2010	5	تشييد مجمع الخدمة السكني		
			50%	50%	0	0	50%	100%				2	مشروع حراسات مجمع السكنية		
	25%	25%	25%	25%	50%	50%	صفر	100%		2019	2019	1	مشروع تطوير مؤتمرات احصائية من ذوي الاعاقات العالمة الترخيم من الفروج الطاق		
			50%	50%	50%	50%	صفر	سنوياً 100%		2022	2019	4	مشروع التقييم اوضاع النازح الخدمات (تكرار سنوياً) ادمج وعلق الخدمات		
	1287566	50000	970253	50000	100000	100000	صفر	الف عائلة 200		2020	2019	2	المكاتب النازحين بسعة غذائية وسلة صحية وعلاجية وعلوية وفرش		
	11	2000	10	2000	0	1000	لا يوجد	وحدة 20000 سكنية		2022	2019	4	توفير وحدات سكنية لذات العالمة (الموالات الهشة)		
	0%	400	صفر	400	0	200	صفر	عائلة 2000		2020	2019	2	توزيع منح مالية لفرش ترقيم الدور المتضررة في المناطق المتضررة لتسهيل العودة الطوعية		
	17727	50000	12000	50000	9	33000	لا يوجد	عائلة 733000		2022	2019	4	تسهيل العودة الطوعية من خلال توزيع المنح المالية		
					2	9	2 مكاتب	9 مكاتب		2019	2019	6 اشهر	فتح مكاتب الوزارة في الدول التي تضم كثافة كبيرة للاجئين العراقيين في الخارج (يونان - سويد - استراليا - امريكا - بريطانيا - تشيكا - النمسا)	سريع	متابعة شؤون العراقيين المهاجرين خارج العراق بالتعاون والتكامل مع سفاراتنا في الخارج
					9	9	لا يوجد	مجالس 9		2019	2019	6 اشهر	انشاء مجالس جلالت من المهاجرين العراقيين للتواصل		
					100%	100%	لا يوجد	100%		2019	2019	6 اشهر	تفعيل العالمة الالكتروني للتواصل مع العراقيين في دول الخارج		
					50	50	لا يوجد	سفير 50		2019	2019	6 اشهر	تشكيل لجنة رامية المستوى لاختيار السفراء بالتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات ذات العلاقة وعدد مؤتمرو في بغداد بحضور السفراء المرشحين	سريع	اعتماد المهاجرين العراقيين للتدريسي سفراء محبة وسلام من شعب العراق الى شعوب العالم المختلفة لتعزيز صورة العراق على المستوى الدولي
					100%	100%	لا يوجد	100%		2019	2019	16 اشهر	القرار السياسة الوطنية للاستفادة من العراقيين في دول المهجر	سريع	مساعدة هيئة الامتداد الوطنية والوزارات الاخرى في البحث وجلب رؤوس الاموال العراقية المهاجرة للعودة للعراق

## امانة بغداد

الملاحظات	كانون الاول - 4هـ		نومور - 3هـ		بيسان - 2هـ		الواقع العالي (عدد او نسبة)	المستهدف الكلي (عدد او نسبة)	تاريخ الانجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المعددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المتهدف	المتحقق	المتهدف	المتحقق	المتهدف								
وردت ضمن المحور الخامس وزارة الاعمار والإسكان والبلديات														
	4%						85%	100%	2020	2009	11	مسألة وإقامة وتشغيل مشاريع مياه المجاري	لم تحدد	اكتمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب أخرى
	4.50%	5%	5.50%	7%	1%	5%	83%	100%	2021	2009	12	تنفيذ الخط الرئيسي المائل في جانب الكرخ / الخط الغربي التماسك مع لشدة محطة ضخ دورة رقم 2 مع خطوط الضخ التابعة لها		
	1.50%	0.50%	1%	1.5%	5%	6%	92%	100%	2019	2009	10	تمديد الخطوط الرئيسية التي ساهمت في الخط الشمال الشرقي مع محطة ضخ رئيسية عدد 1		
	18%	41.15%	30 15%	29%	18.85%	19%	11%	100%	2020	2018	2	تخطيط واكساء المجلات والتشاور الرئيسية في مدينة بغداد / الأفراس الهندية	سريع	انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسابها على ان تقدم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول للكميات وتقديم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات

## البنك المركزي العراقي

الملاحظات	كانون الأول - 2014		نومبر - 2013		سبتمبر - 2012		الواقع الحال (عدد أو نسبة)	المستهدف (عدد أو نسبة)	تاريخ الأنتهاء	فترة بداية التقييم	الفترة المحددة للتقييم	المشروع	الفترة الرمنية للتقييم	فترة البرنامج الحكومي
	التحقق	المستهدف	التحقق	المستهدف	التحقق	المستهدف								

(وردت ضمن المحور الرابع / وزارة المالية)

	20%	20%	0%	5%	0%	5%	80%	100%	2019	2018	2	زيادة سقف الأئتماني للائتمادات الحكومية من المصارف الخاصة الـ 50 مليون دولار	متوسط	تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به، وتحويل المصارف الى وظيفتها الأساسية وهي الاقراض من اجل التنمية بفوائد أو أرباح معقولة عن الفائدة المعتمدة من البنك المركزي العراقي وحسب طبيعة المخاطر المتعلقة بكل عملية اقراض، واعتماد ان المصرف الذي لا يساهم في الاقراض بنسبة محددة من رأس ماله الاسمي او لا يقدم تسهيلات مصرفية تساعد في التنمية البشرية والاقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب موقفاً محدداً ازاءه من البنك المركزي
	7%	7%	6%	6%	49	50	35%	100%	2019	2018	2	برنامج التمويل الإسلامي المجمع		
	2%	2%	8%	8%	59	59	28%	100%	2019	2018	2	مشروع تأمين التكاليف		
	10%	10%	5%	5%	0	10	60%	100%	2019	2017	3	قانون صكوك الاستثمار الإسلامية		
	7%	7%	3%	3%	10	16	71%	100%	2020	2016	5	تطوير مبادرة ائتمانيون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة	لم تحدد	المصارف عتلة التنمية والواسطة الأساسية لتحند رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية ليتسنى تمويل مشاريع في شتى المجالات، وان عملاً اساسياً يبقى مطلوباً للبهوض بالقطاع المصرفي بجناحه العام والخاص واهمية وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في دعم المصارف والرقى ومستوياتها لتستطيع القيام بدورها في التنمية وعدم الاعتماد في وجودها على عمليات مزااد العملة وصرفيها، وما لم تنجز هذه المهمة فان الاختناق سيستمر كسمة اساسية للاقتصاد الوطني
	أنجزت	أنجزت	أنجزت	أنجزت	30	30	70%	100%	2020	2016	5	مراجعة وتطوير اجراءات الاقراض المعول بها في المصارف والمؤسسات المشاركة في توفير خدمات التمويل الأصغر		
	10%	10%	1%	1%	5	5	0%	100%	2020	2019	2	الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي	لم تحدد	السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورائية ال اقتصاد العملة الرمزية والالكترونية، والسعي لسحب الاموال المجمدة حالياً خارج الدورة المصرفية وادخالها الى الدورة بتقديم الحوافز والضمانات لتحقيق هذا الغرض والسعي لتحريك الاموال المجمدة في المصارف الحكومية والاهلية لغرض تنشيط شتى النشاطات الاقتصادية والاجتماعية
	25%	45%	30%	30%	25	25	0%	100%	2019	2019	1	توفير بظاافات السعر لدفع المصارف في الخارج ضمن سعر صرف نافذة العملة دون الحاجة ال مخاطر حمل واستعمال النقد في الخارج		
